

第25回中川村リニア中央新幹線対策協議会 次第

令和3年6月10日（木） 午後7時00分
中川村役場 基幹集落センター 集会室

1 開 会

2 あいさつ

3 委員委嘱

4 報告事項

(1) JR東海・・・資料1

- ・渡場交差点付近における環境測定について
- ・大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ・工事用車両台数について

(2) 長野県・・・資料2

- ・(主)松川インター大鹿線改良事業について

(3) 中川村

- ・リニア中央新幹線発生土運搬安全対策連絡協議会について

5 協議事項

(1) 半の沢道路改築に関する工事について・・・資料3

(2) (主)松川インター大鹿線を利用した発生土の運搬について

- ・喬木村、飯田市

- ・高森町・・・資料4

6 その他

- ・委員任期及び公募について

7 閉 会

第25回 中川村リニア対策協議会 資料

令和3年(2021年)6月10日

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)
中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体
中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体

1

本日のご説明内容

- ① 環境測定について
- ② 大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ③ 工事用車両台数について
- ④ その他

2

- ① 環境測定について
- ② 大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ③ 工事用車両台数について
- ④ その他

渡場地区における環境測定について

今後の工事用車両の本格的な通行に先立つ現況把握を目的として渡場地区において環境測定を実施しています。

○測定項目

- ・ 大気質(窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の濃度)
- ・ 騒音
- ・ 振動

○測定期間

2018年11月から通年測定



騒音・振動
測定機器

大気質測定ハウス

測定箇所




騒音・振動
測定機器




大気質測定
ハウス

渡場交差点における環境測定結果(3～5月)

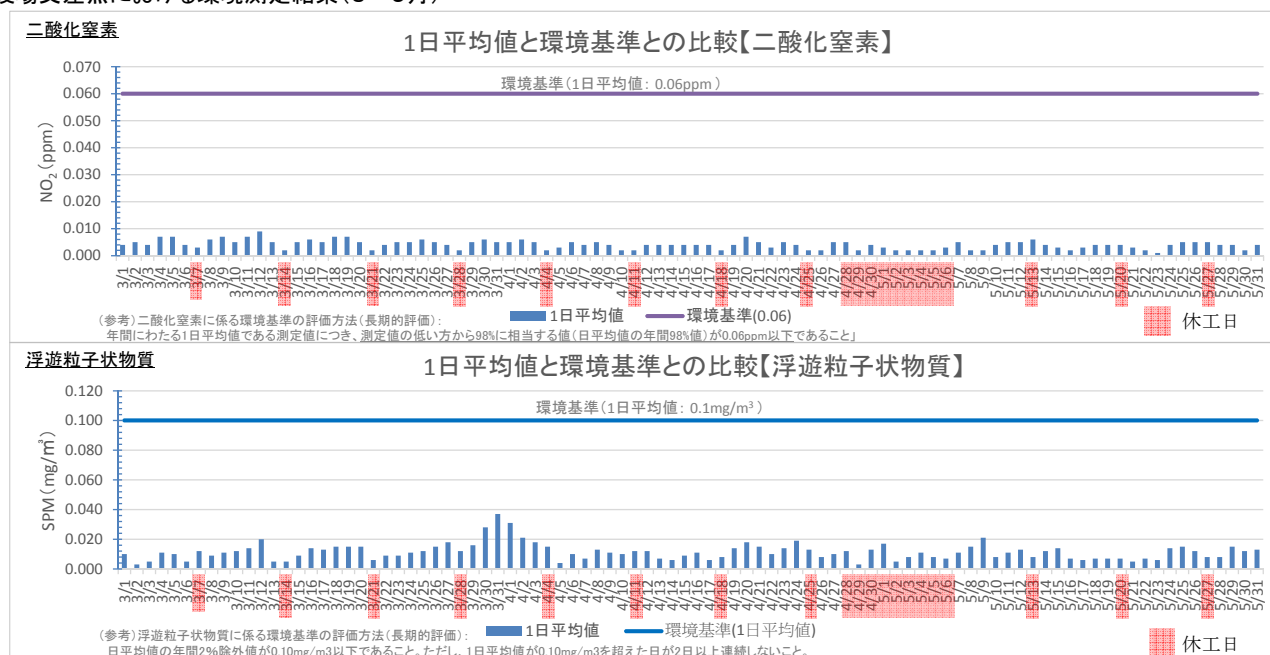

5

渡場交差点における環境測定結果(3～5月)

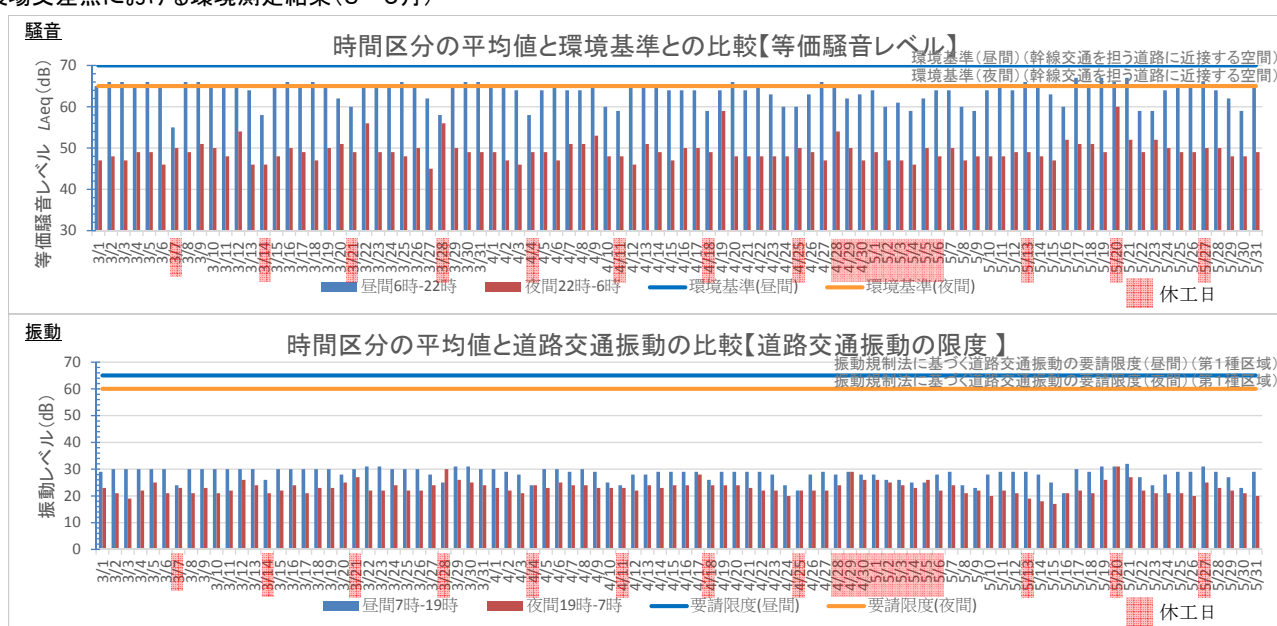


6

- ① 環境測定について
- ② 大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ③ 工事用車両台数について
- ④ その他

大鹿村の工事進捗状況

20210610 中川村
第25回対策協議会資料

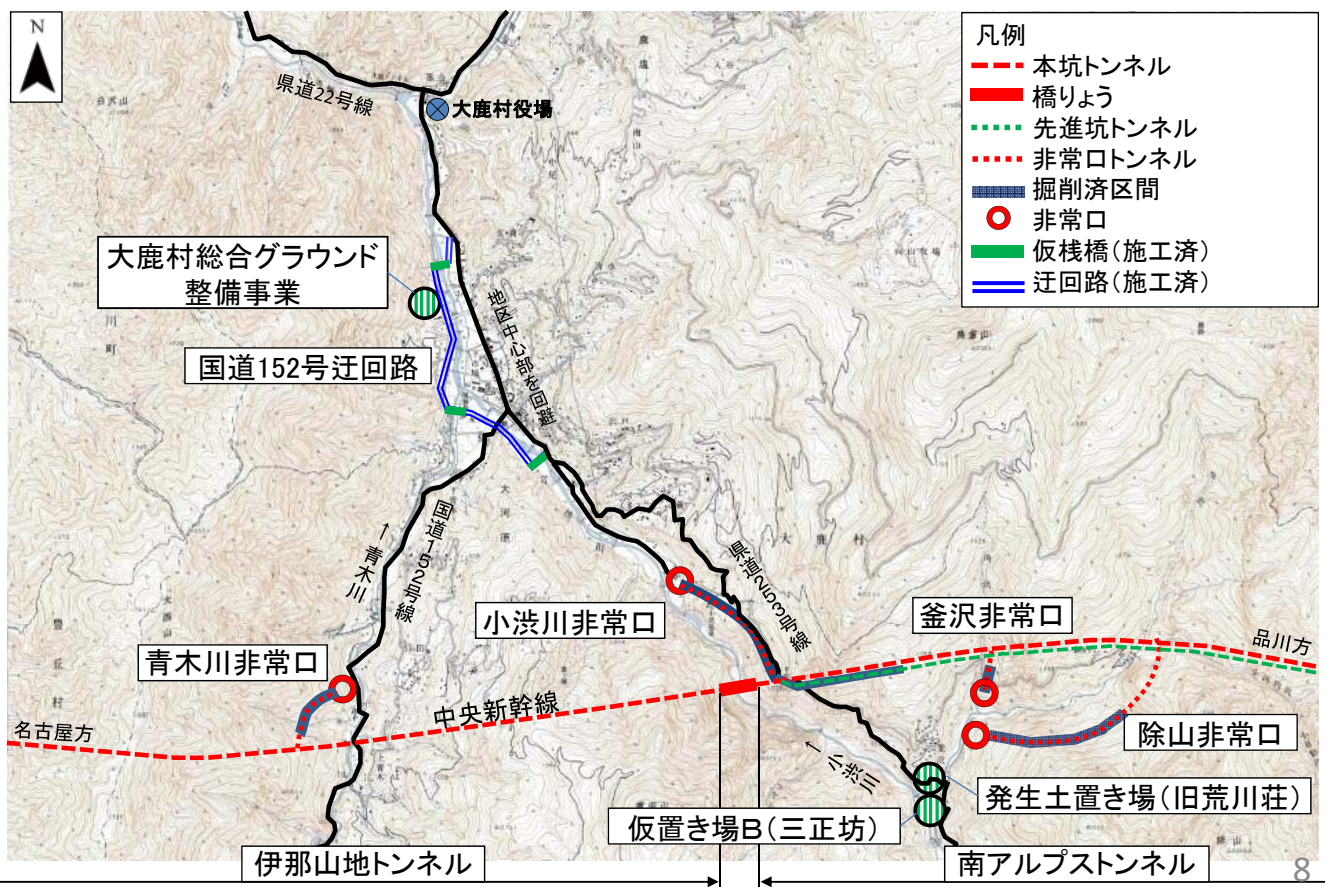

小渋川非常口方面の状況

20210610 中川村
第25回対策協議会資料

- 小渋川非常口は、先進坑(小渋川斜坑―釜沢斜坑間)の延長約1,600mのうち、約5割の掘削が完了しております。
- 先進坑を掘削した発生土のうち、自然由来重金属等の溶出試験の基準値を下回った発生土については、飯田市事業に活用していただいています。

小渋川先進坑 施工状況(5月28日時点)



小渋川先進坑 坑内状況(5月28日時点)



9

小渋川非常口方面の状況

20210610 中川村
第25回対策協議会資料

- 基準値を上回った発生土については、環境保全計画に基づき、仮置き場E(小渋川変電所予定地)の要対策土仮置き場に仮置きをしています(前回3月協議会で説明した以降、基準値を上回った発生土は1日分のみです)。要対策土の搬出計画については、改めてご説明します。

発生土仮置き場E(5月15日時点)



10

除山・釜沢非常口方面の状況

20210610 中川村
第25回対策協議会資料

- ・ 除山非常口は、斜坑延長(約1,870m)の約7割の掘削が完了しています。
- ・ 釜沢非常口は、斜坑延長(約350m)の約7割の掘削が完了しています。

除山非常口 施工状況(5月28日時点)



釜沢非常口 施工状況(5月28日時点)



11

除山・釜沢非常口方面の状況


20210610 中川村
第25回対策協議会資料

- ・ 発生土仮置き場B(三正坊)は造成工事を行っています。
- ・ 発生土仮置き場A(除山横)の東側への拡幅工事について、行政手続きが完了次第、拡幅部の工事に着手します。

発生土仮置き場A(6月1日時点)



仮置き場B 施工状況(5月28日時点)

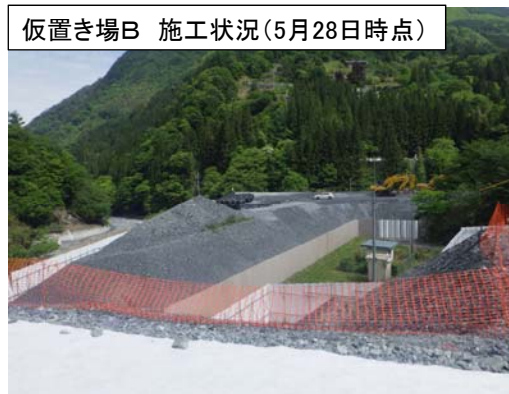

12

- 青木川非常口は、斜坑延長(約600m)の約8割の掘削が完了しています。
- 現在は昼間作業のみの発破掘削を行っています。今後、工事の進捗に応じて夜間作業を開始させていただきます。夜間作業開始時は改めて関係する地区の方にお知らせさせていただきます。
- 深々沢地籍の発生土置き場(青木川)では造成工及び水路設置工を行っています。

青木川斜坑 施工状況(5月24日時点)



発生土置き場(青木川) 施工状況(5月26日時点)



13

本日のご説明内容


- ① 環境測定について
- ② 大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ③ 工事用車両台数について
- ④ その他

14

渡場交差点		
	JR工事に伴う車両	飯田市・喬木村事業への運搬に伴う車両
R2.3実績	22.2	294.2
R3.4実績	24.3	135.5
R3.5実績	23.0	77.8

(台/日)

- : 松川インター大鹿線
- : トンネル新設箇所
- : 河川内道路
- : 道路拡幅施工箇所
- ⊗ : 台数確認地点

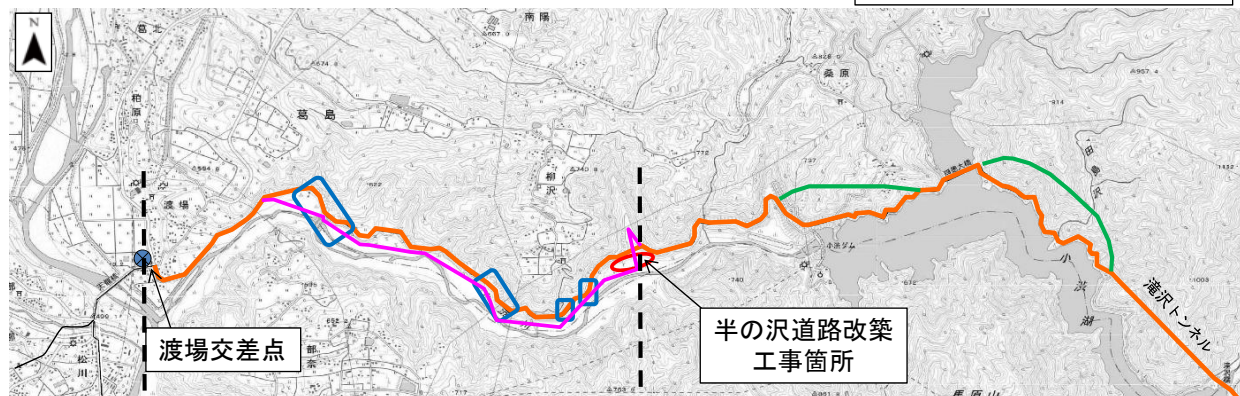

R3.7 ～ R3.9 予定	資機材等	39.1	
	半の沢道路改築	10.0	200.0(各月4回程度)
	高森町運搬(予定)	300.0	

※ 表記の工事用車両台数は、「月別日平均の値」です。往復の台数です。

(台/日)

※ 「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です。

15

本日のご説明内容

- ① 環境測定について
- ② 大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ③ 工事用車両台数について
- ④ その他

工事カレンダー・お問い合わせ先

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」を参照
- トンネル坑内での地質調査、ヤードでのベルトコンベア設置等の作業は、日曜日にも実施することがあります。

【お問い合わせ先】

JR東海	東海旅客鉄道(株) 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室) (住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2645-5 (電話)0265-39-2975
南ア(長野工区) 鹿島建設・飛島建設・フジタJV	中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2656-3 (電話)0265-39-1071
伊那山地(青木川工区) 飛島建設・奥村組土木興業JV	中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡大鹿村大河原1355-5 (電話)0265-39-1851

※ 受付：土・日・祝日・年末年始を除く平日 9時～17時

工事カレンダー（伊那山地トンネル(青木川)、南アルプストンネル、中部電力）

2021年																																																											
1月	曜日	青木	南ア	中電	2月	曜日	青木	南ア	中電	3月	曜日	青木	南ア	中電	4月	曜日	青木	南ア	中電	5月	曜日	青木	南ア	中電	6月	曜日	青木	南ア	中電	7月	曜日	青木	南ア	中電	8月	曜日	青木	南ア	中電	9月	曜日	青木	南ア	中電	10月	曜日	青木	南ア	中電	11月	曜日	青木	南ア	中電	12月	曜日	青木	南ア	中電
1/1	金				2/1	月				3/1	月				4/1	木				5/1	土				6/1	火				7/1	木				8/1	日				9/1	水				10/1	金				11/1	月				12/1	水			
1/2	土				2/2	火				3/2	火				4/2	金				5/2	日				6/2	水				7/2	金				8/2	月				9/2	木				10/2	土				11/2	火				12/2	木			
1/3	日				2/3	水				3/3	水				4/3	土				5/3	月				6/3	木				7/3	土				8/3	火				9/3	金				10/3	日				11/3	水				12/3	金			
1/4	月				2/4	木				3/4	木				4/4	日				5/4	火				6/4	金				7/4	日				8/4	水				9/4	土				10/4	月				11/4	木				12/4	土			
1/5	火				2/5	金				3/5	金				4/5	月				5/5	水				6/5	土				7/5	月				8/5	木				9/5	日				10/5	火				11/5	金				12/5	日			
1/6	水				2/6	土				3/6	土				4/6	火				5/6	木				6/6	日				7/6	火				8/6	金				9/6	月				10/6	水				11/6	土				12/6	月			
1/7	木				2/7	日				3/7	日				4/7	水				5/7	金				6/7	月				7/7	水				8/7	土				9/7	火				10/7	木				11/7	日				12/7	火			
1/8	金				2/8	月				3/8	月				4/8	木				5/8	土				6/8	火				7/8	木				8/8	日				9/8	水				10/8	金				11/8	月				12/8	水			
1/9	土				2/9	火				3/9	火				4/9	金				5/9	日				6/9	水				7/9	金				8/9	月				9/9	木				10/9	土				11/9	火				12/9	木			
1/10	日				2/10	水				3/10	水				4/10	土				5/10	月				6/10	木				7/10	土				8/10	火				9/10	金				10/10	日				11/10	水				12/10	金			
1/11	月				2/11	木				3/11	木				4/11	日				5/11	火				6/11	金				7/11	日				8/11	水				9/11	土				10/11	月				11/11	木				12/11	土			
1/12	火				2/12	金				3/12	金				4/12	月				5/12	水				6/12	土				7/12	月				8/12	木				9/12	日				10/12	火				11/12	金				12/12	日			
1/13	水				2/13	土				3/13	土				4/13	火				5/13	木				6/13	日				7/13	火				8/13	金				9/13	月				10/13	水				11/13	土				12/13	月			
1/14	木				2/14	日				3/14	日				4/14	水				5/14	金				6/14	月				7/14	水				8/14	土				9/14	火				10/14	木				11/14	日				12/14	火			
1/15	金				2/15	月				3/15	月				4/15	木				5/15	土				6/15	火				7/15	木				8/15	日				9/15	水				10/15	金				11/15	月				12/15	水			
1/16	土				2/16	火				3/16	火				4/16	金				5/16	日				6/16	水				7/16	金				8/16	月				9/16	木				10/16	土				11/16	火				12/16	木			
1/17	日				2/17	水				3/17	水				4/17	土				5/17	月				6/17	木				7/17	土				8/17	火				9/17	金				10/17	日				11/17	水				12/17	金			
1/18	月				2/18	木				3/18	木				4/18	日				5/18	火				6/18	金				7/18	日				8/18	水				9/18	土				10/18	月				11/18	木				12/18	土			
1/19	火				2/19	金				3/19	金				4/19	月				5/19	水				6/19	土				7/19	月				8/19	木				9/19	日				10/19	火				11/19	金				12/19	日			
1/20	水				2/20	土				3/20	土				4/20	火				5/20	木				6/20	日				7/20	火				8/20	金				9/20	月				10/20	水				11/20	土				12/20	月			
1/21	木				2/21	日				3/21	日				4/21	水				5/21	金				6/21	月				7/21	水				8/21	土				9/21	火				10/21	木				11/21	日				12/21	火			
1/22	金				2/22	月				3/22	月				4/22	木				5/22	土				6/22	火				7/22	木				8/22	日				9/22	水				10/22	金				11/22	月				12/22	水			
1/23	土				2/23	火				3/23	火				4/23	金				5/23	日				6/23	水				7/23	金				8/23	月				9/23	木				10/23	土				11/23	火				12/23	木			
1/24	日				2/24	水				3/24	水				4/24	土				5/24	月				6/24	木				7/24	土				8/24	火				9/24	金				10/24	日				11/24	水				12/24	金			
1/25	月				2/25	木				3/25	木				4/25	日				5/25	火				6/25	金				7/25	日				8/25	水				9/25	土				10/25	月				11/25	木				12/25	土			
1/26	火				2/26	金				3/26	金				4/26	月				5/26	水				6/26	土				7/26	月				8/26	木				9/26	日				10/26	火				11/26	金				12/26	日			
1/27	水				2/27	土				3/27	土				4/27	火				5/27	木				6/27	日				7/27	火				8/27	金				9/27	月				10/27	水				11/27	土				12/27	月			
1/28	木				2/28	日				3/28	日				4/28	水				5/28	金				6/28	月				7/28	水				8/28	土				9/28	火				10/28	木				11/28	日				12/28	火			
1/29	金									3/29	月				4/29	木				5/29	土				6/29	火				7/29	木				8/29	日				9/29	水				10/29	金				11/29	月				12/29	水			
1/30	土									3/30	火				4/30	金				5/30	日				6/30	水				7/30	金				8/30	月				9/30	木				10/30	土				11/30	火				12/30	木			
1/31	日									3/31	水									5/31	月									7/31	土				8/31	火								10/31	日								12/31	金					

- ・・・ 休日
- ・・・ 場内作業のみ(大型工事用車両の通行なし)
※場内作業とは、トンネル坑内での地質調査、ヤードでのベルコン設置等の作業
- ・・・ 通常作業+大型資材搬入車両通行:10台/日(往復)
- ・・・ 前回からの変更箇所

※通勤通学等の時間帯は、通行台数を調整するよう努めます。

※上記工事予定以外の日時(休日を含む)に作業を行う場合には、関係する住民の方々へお知らせします。


※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～5時の時間帯に運搬することを考えています。

高森町 下市田産業用地整備事業について


中川村リニア中央新幹線対策協議会
令和3年6月10日

高森町役場 産業課

全体位置図

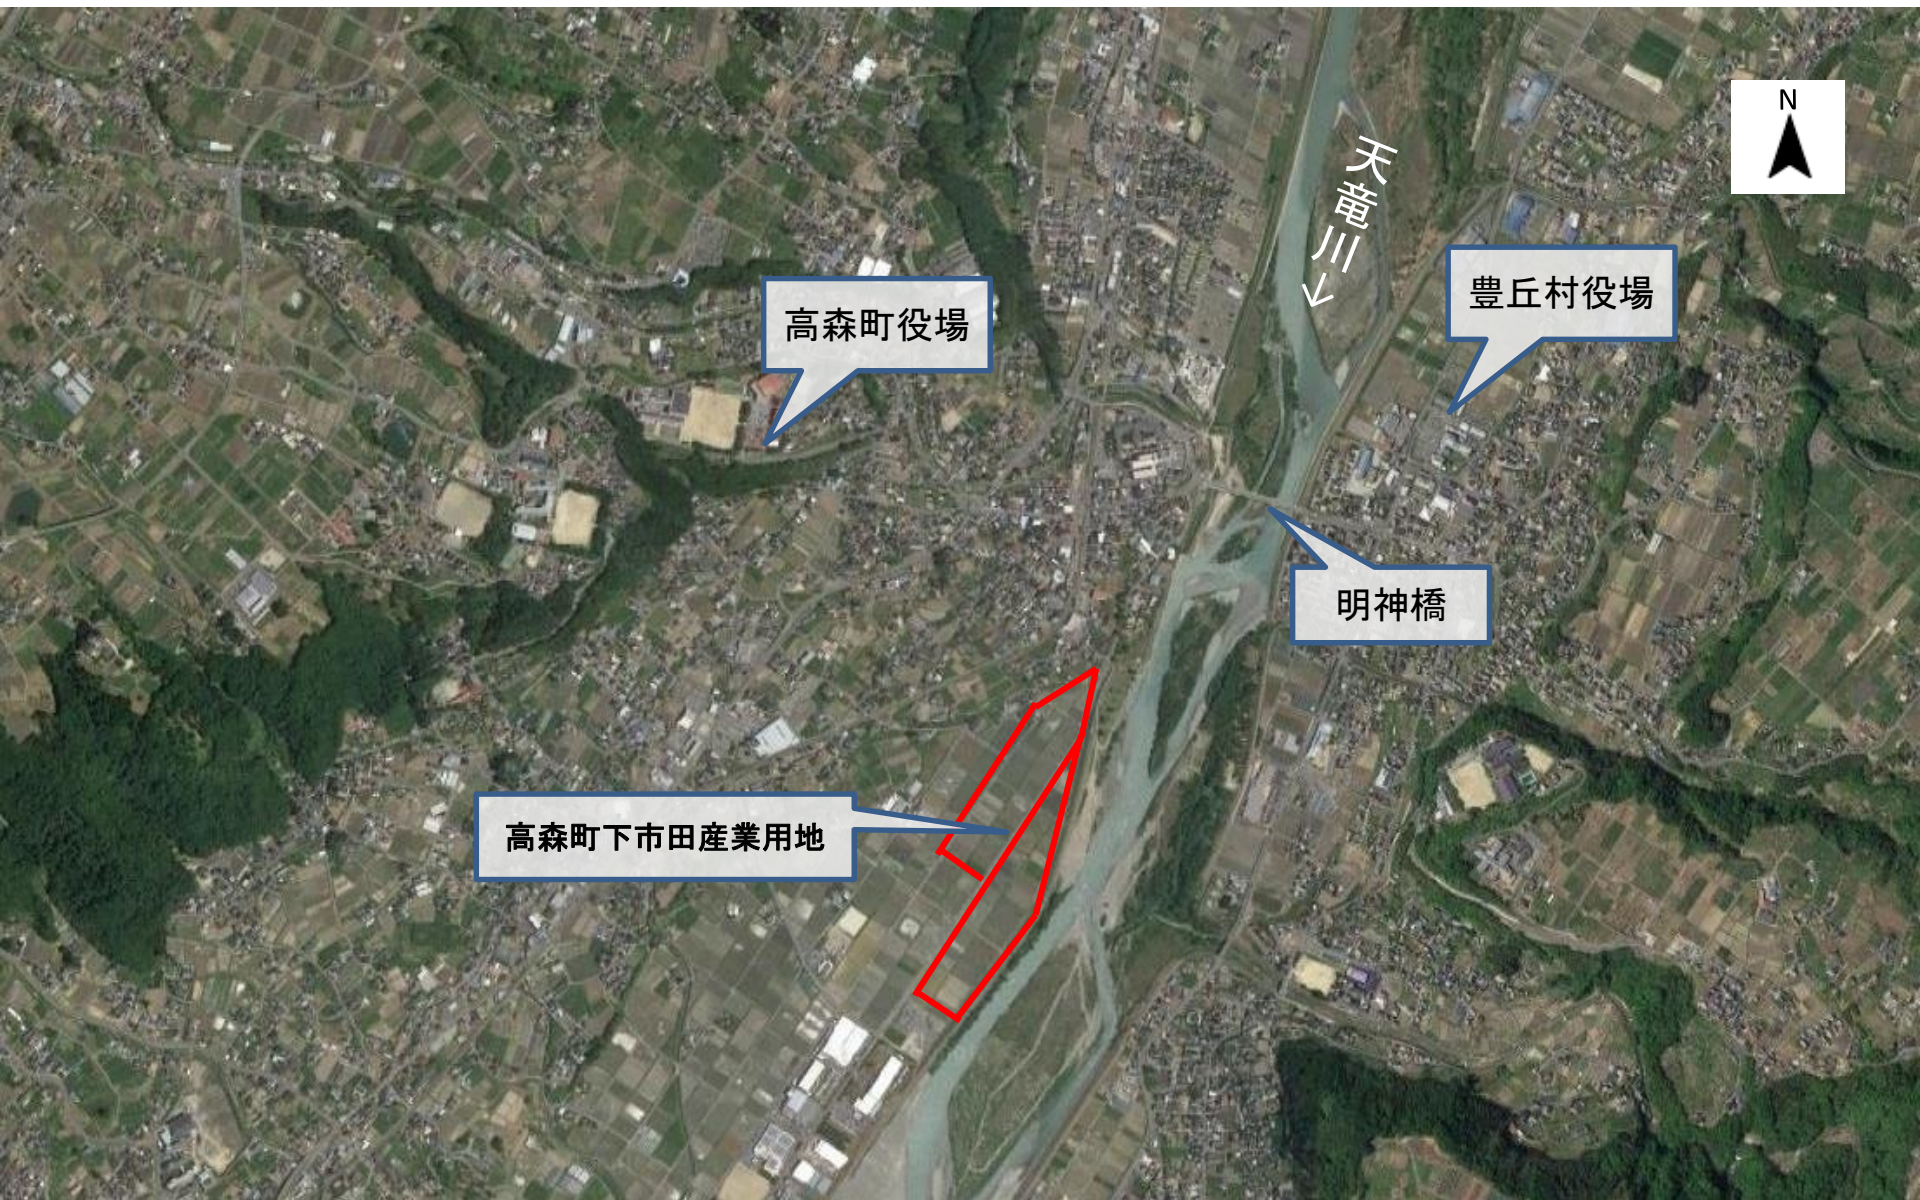

高森町下市田産業用地造成工事

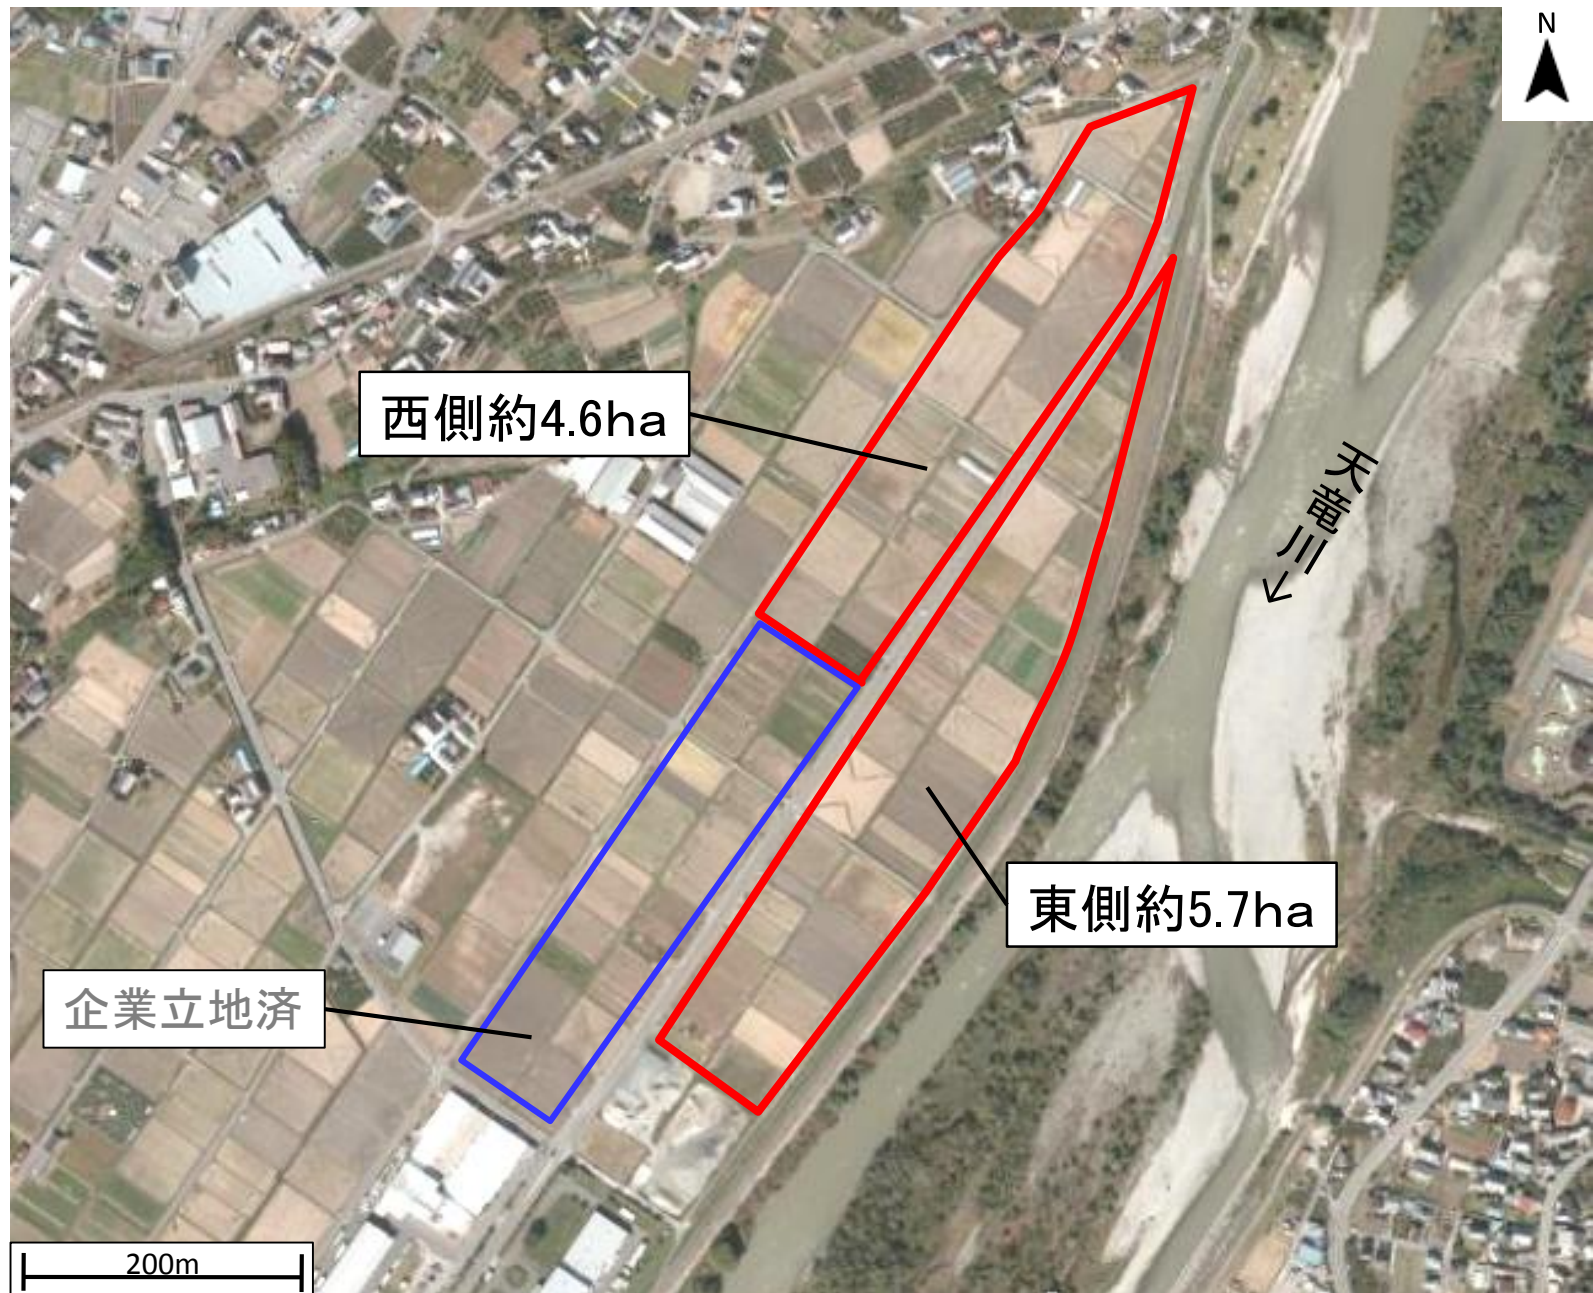

高森町下市田産業用地整備工程

		令和3年度				令和4年度				令和5年度				
		1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4	
東側用地	盛土造成													
	GWヤード使用													
西側用地	準備工事 (耕土すきとり等)													
	盛土造成													
	GWヤード使用													

※現時点での計画であり、今後の協議等により変更の可能性があります。

高森町下市田産業用地整備

■盛土搬入スケジュール

◆運搬時期：令和3年7月～令和4年9月（月曜日～土曜日・祝日）

※日曜日、お盆・年末年始等の長期休暇は運搬を休止します。

また、地元行事が開催される場合等は運搬時間について調整させていただきます。【飯田市と同条件とします】

◆運搬時間帯：8時00分～18時00分まで

※中川村渡場交差点付近通過時間 8時30分～17時00分

【飯田市と同条件とします】

◆運搬土量：約150,000m³（東西用地合計）

◆運搬台数：最大150台/日（片道）

お問い合わせ先について

運搬車両の運転席と荷台にこの様な表示を行い運搬します。
安全運転には十分注意いたしますが、ご迷惑をお掛けした場合等には、番号をご連絡いただければ早急に対応いたします。

高森町産業用地整備



お問い合わせ・連絡先
高森町 産業課 商工観光係
課長:野沢 担当:秋田
電話:0265-35-9405(直通)

半の沢道路改築に関する 工事説明について

令和3年6月10日（木） 19：00～ 役場集落センター集会室

長野県飯田建設事務所

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所（大鹿分室）


1. 半の沢道路改築の計画概要
2. 半の沢道路改築の工事計画
3. 工事中の安全管理
4. 工事用車両の運行
5. 今後の予定

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

- ・老朽化した半の沢橋を盛土活用して道路改良
- ・道路改良により、道路幅員拡幅、平面線形を改善し、自動車交通の安全性向上、円滑化


凡例

 : 盛土部
 : 開水路
 : 管理道路
 : えん堤
 : 沈砂池

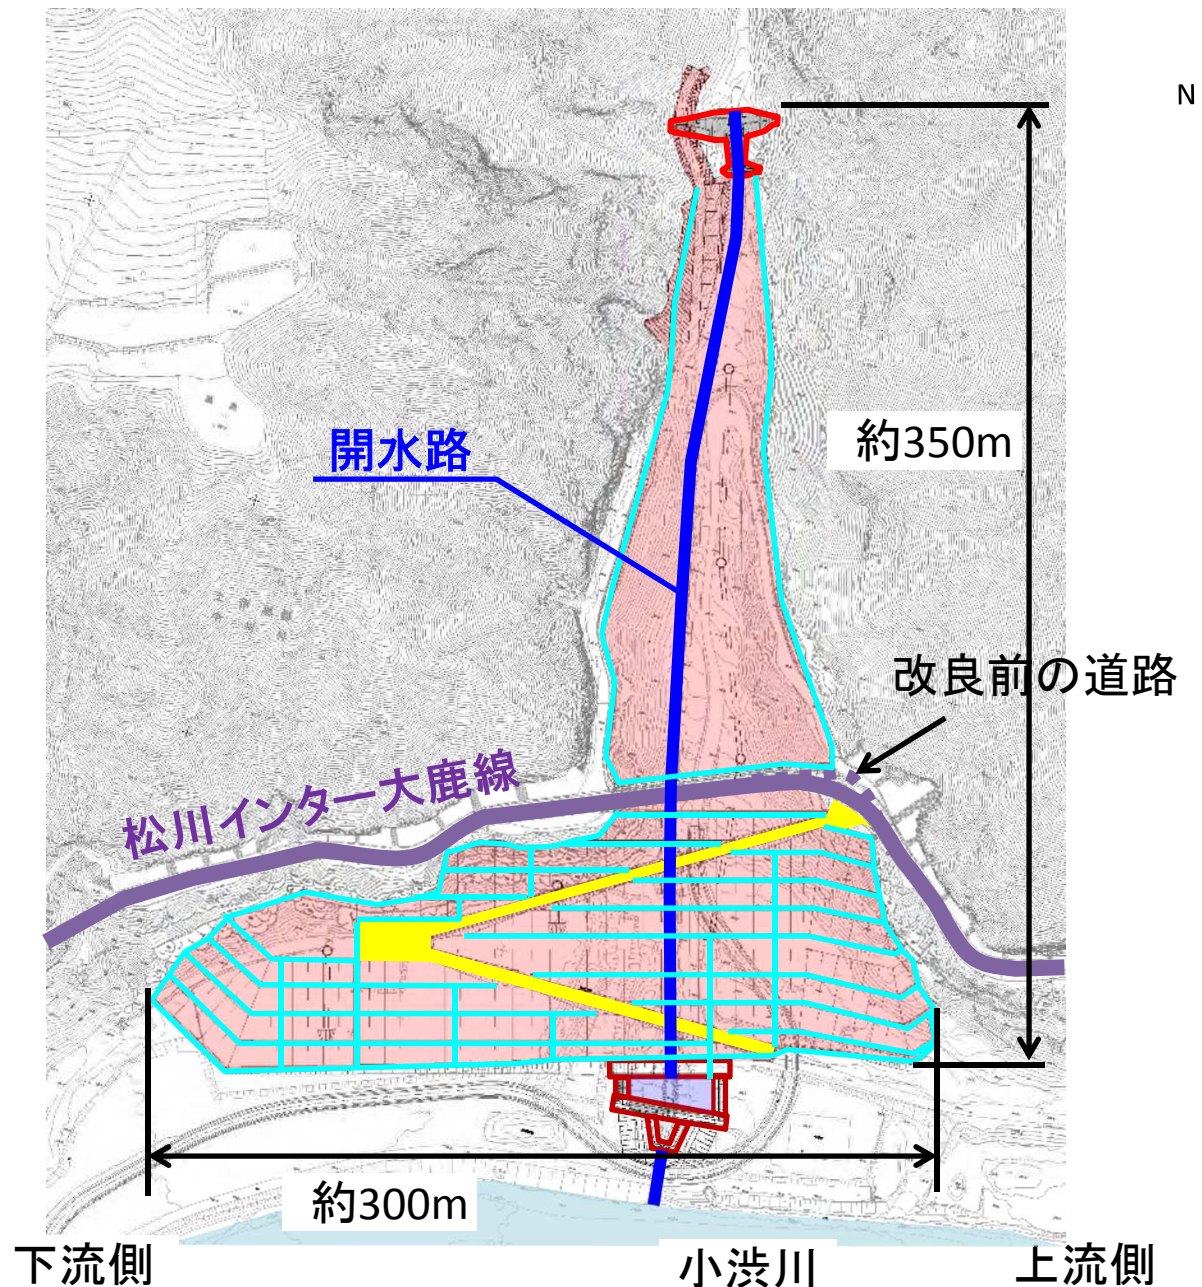

1. 半の沢道路改築工事の計画概要

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

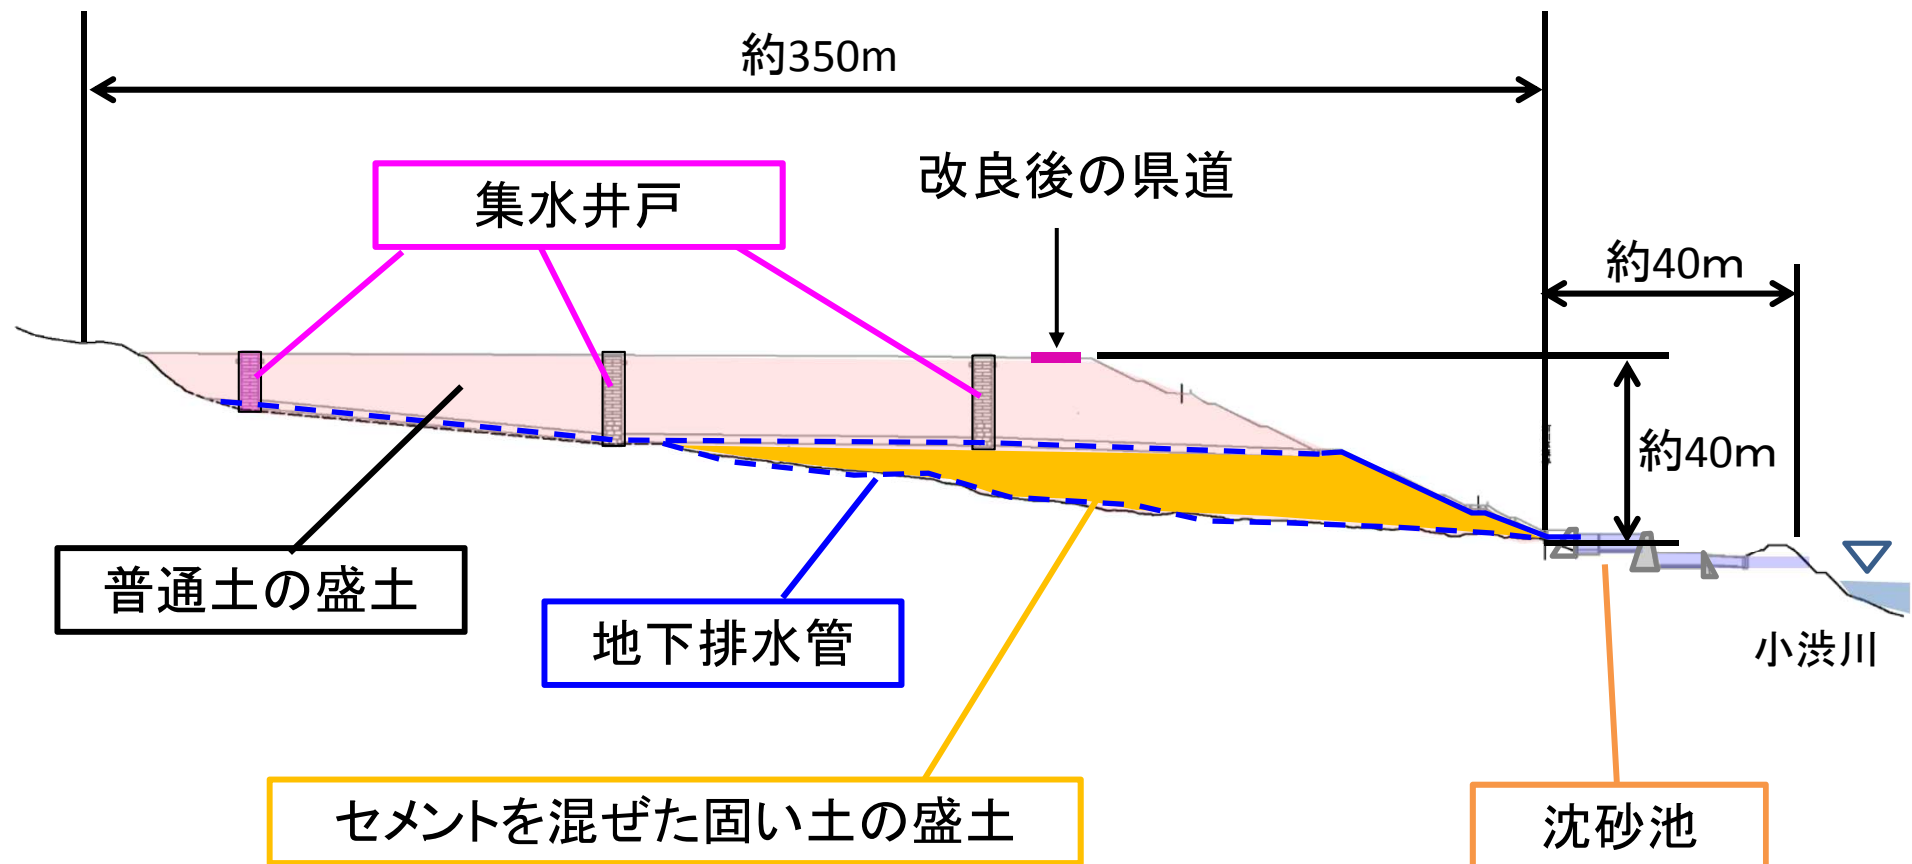

1. 半の沢道路改築工事の計画概要

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

現況写真




完成イメージ



1. 半の沢道路改築の計画概要
2. 半の沢道路改築の工事計画
3. 工事中の安全管理
4. 工事用車両の運行
5. 今後の予定


2. 半の沢道路改築の工事計画

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

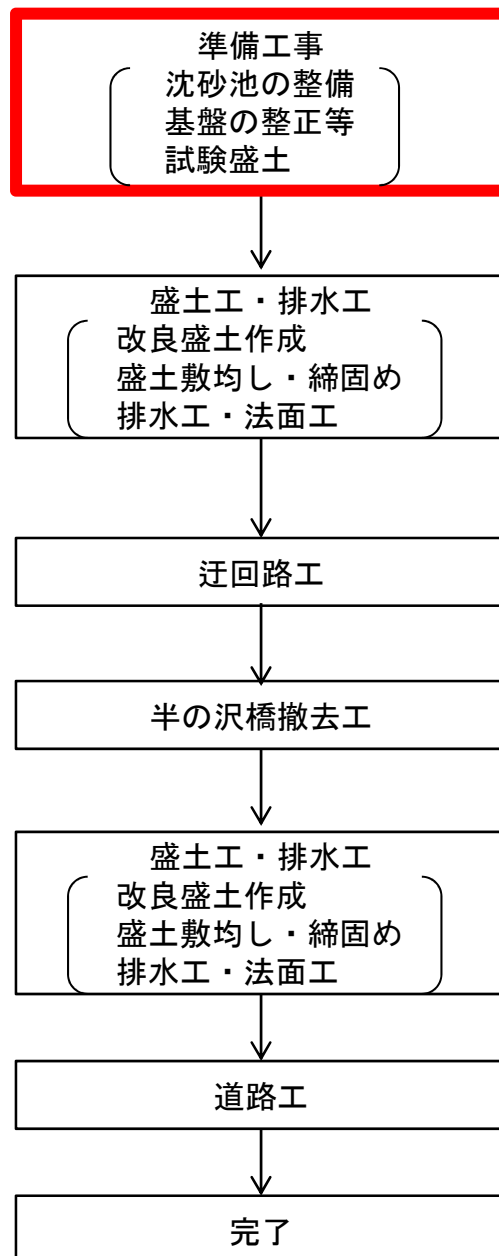

沈砂池の整備


工事中、降雨等で土砂が下流に流出しないよう、排水を一時的に貯め、土砂等を沈下、堆積させる沈砂池を整備します。

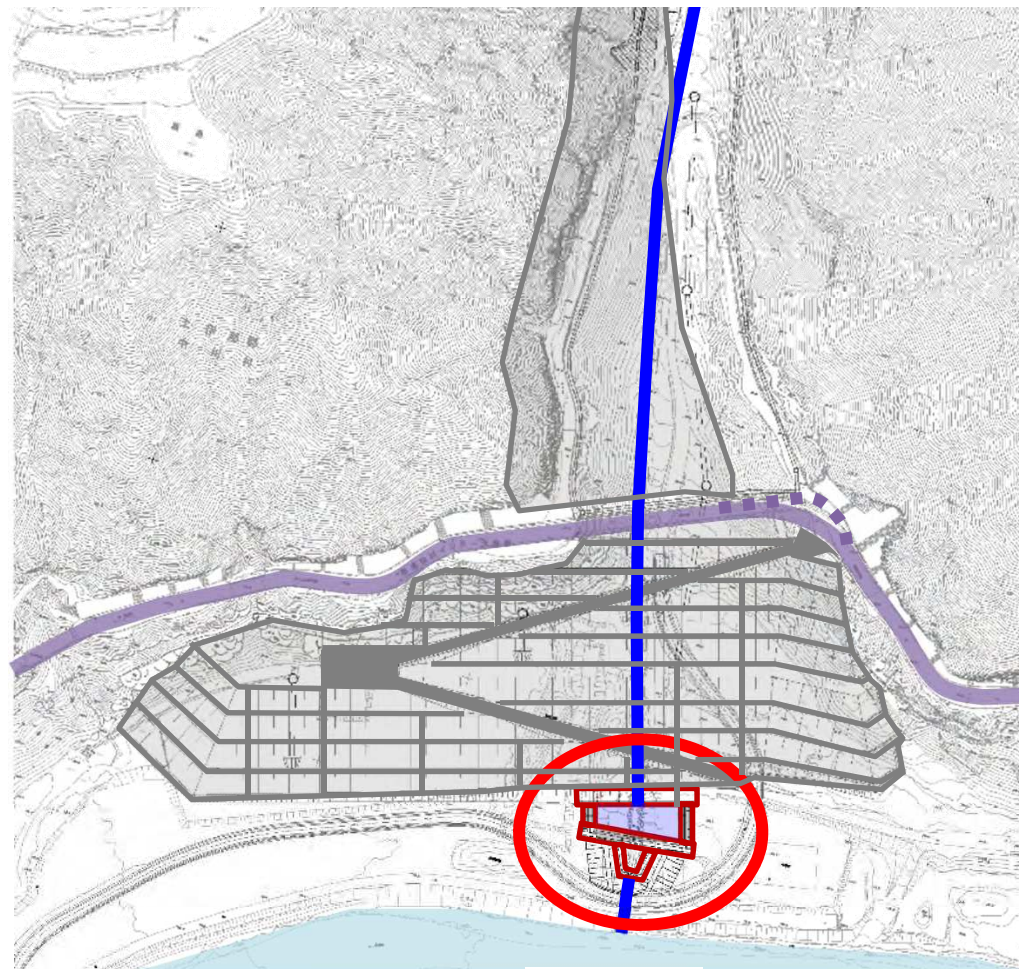

小沢川


2. 半の沢道路改築の工事計画

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

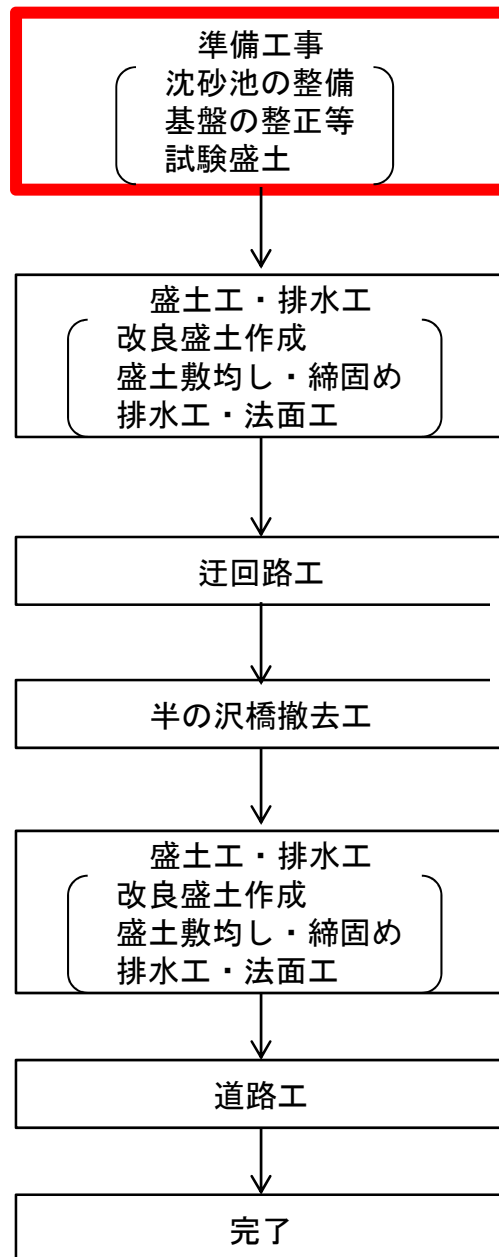


試験盛土

- 盛土の下部は、セメントを混ぜた固い土の盛土とします。
- 設計で想定する盛土の強度を確保するため、盛土工の工事開始前に、セメントの混ぜ方を変えた数パターンの盛土を造成し、強度等の確認を行います。
- 必要な強度の確認ができた試験盛土は、本体盛土の一部として活用します。

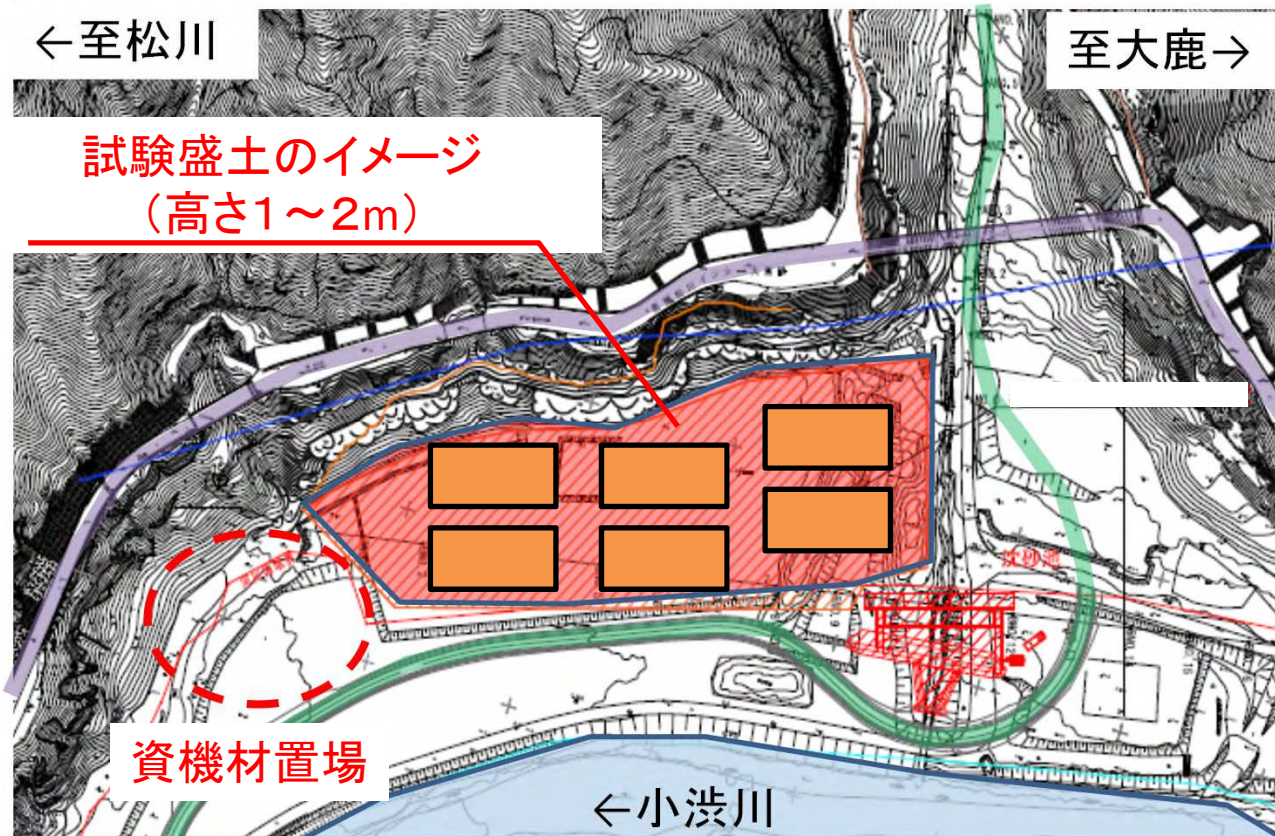

2. 半の沢道路改築の工事計画

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

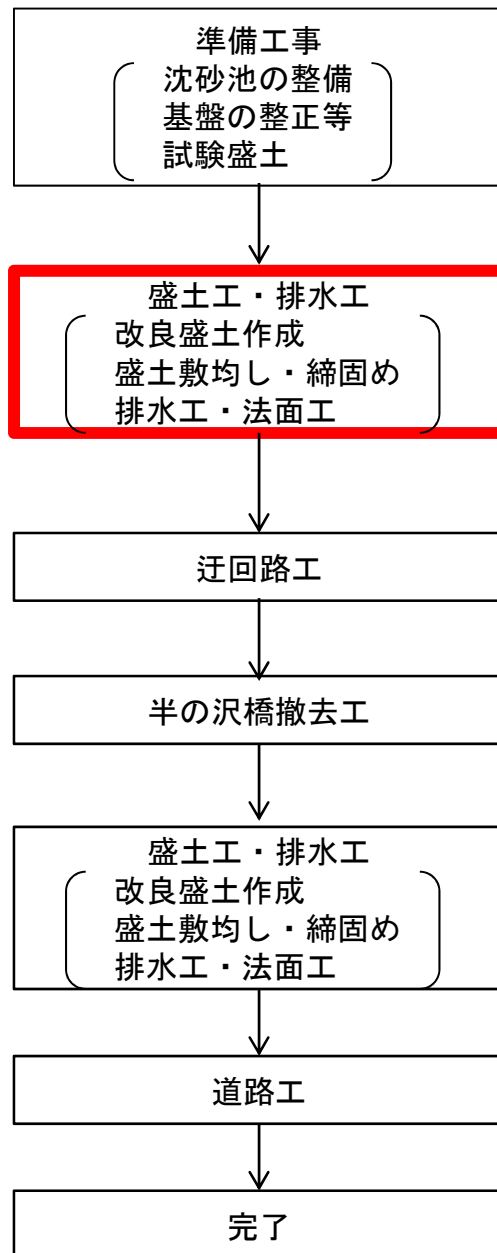

盛土敷均し



盛土締固め



排水工(地下排水管)




法面排水工

※写真は、他の工事での施工イメージです。


2. 半の沢道路改築の工事計画

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

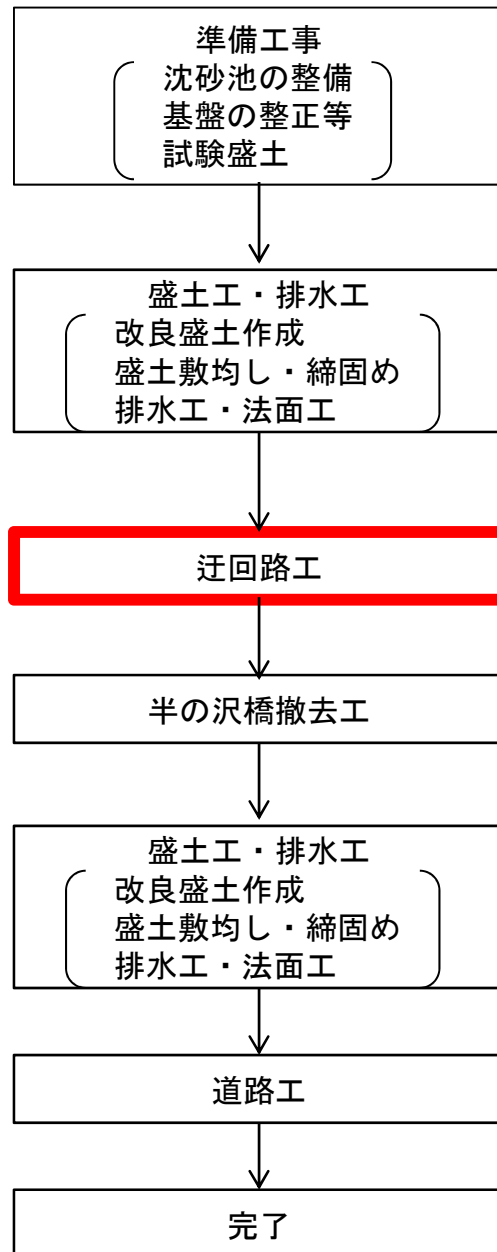


迂回路工

- ・ 半の沢橋を撤去するため、小渋川側に迂回路を整備します。
- ・ 将来の地下排水管等の排水設備を活用して、工事中も適切に排水して工事を行います。

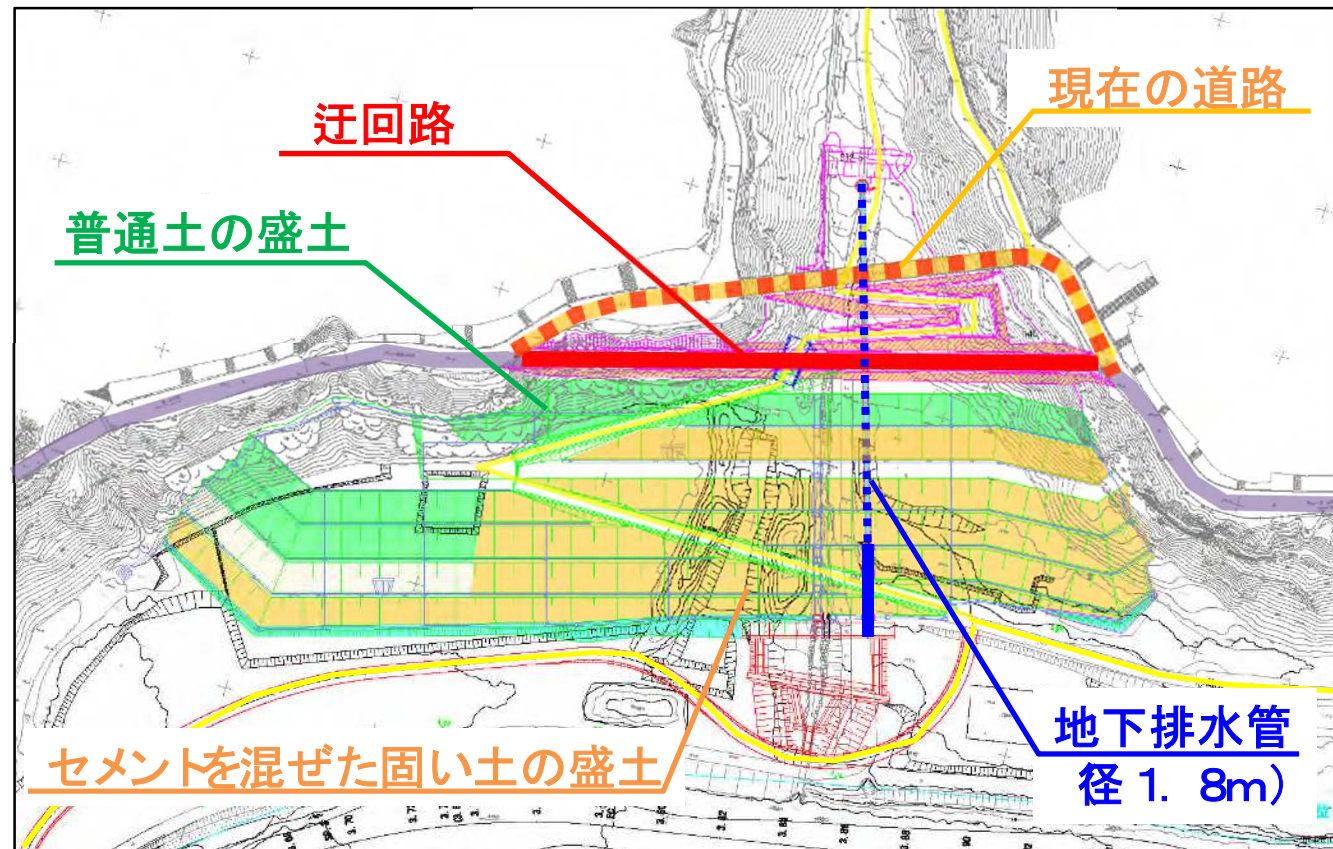


2. 半の沢道路改築の工事計画

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

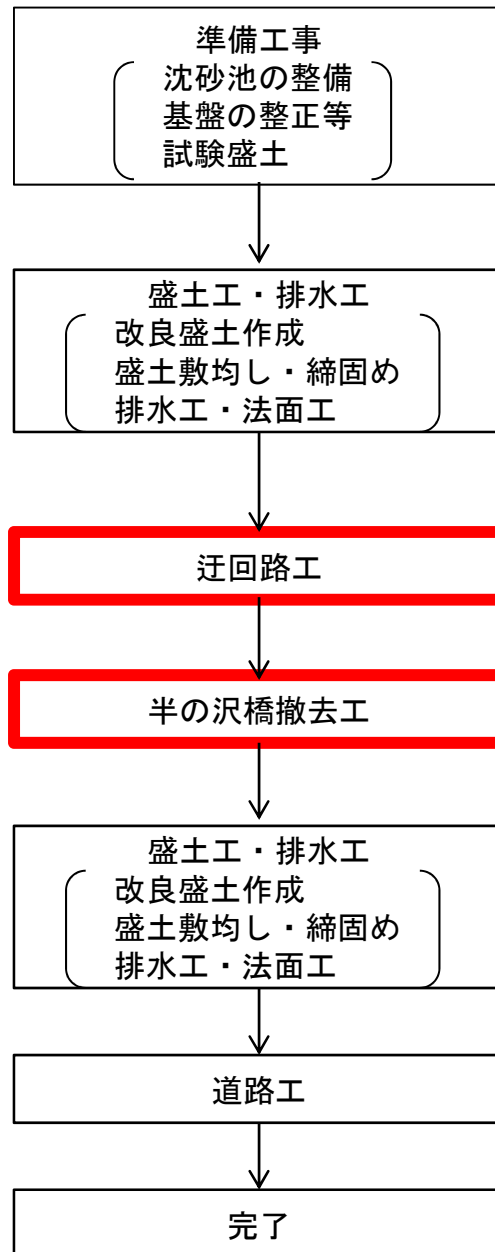


迂回路工 半の沢橋梁撤去工

- ・ 迂回路は、すれ違いができる幅を確保して整備します。
- ・ 道路を迂回路に切替後、半の沢橋の撤去工事を行います。
- ・ 橋梁の撤去は、仮受けする構台を構築した上で、段階的に行います。

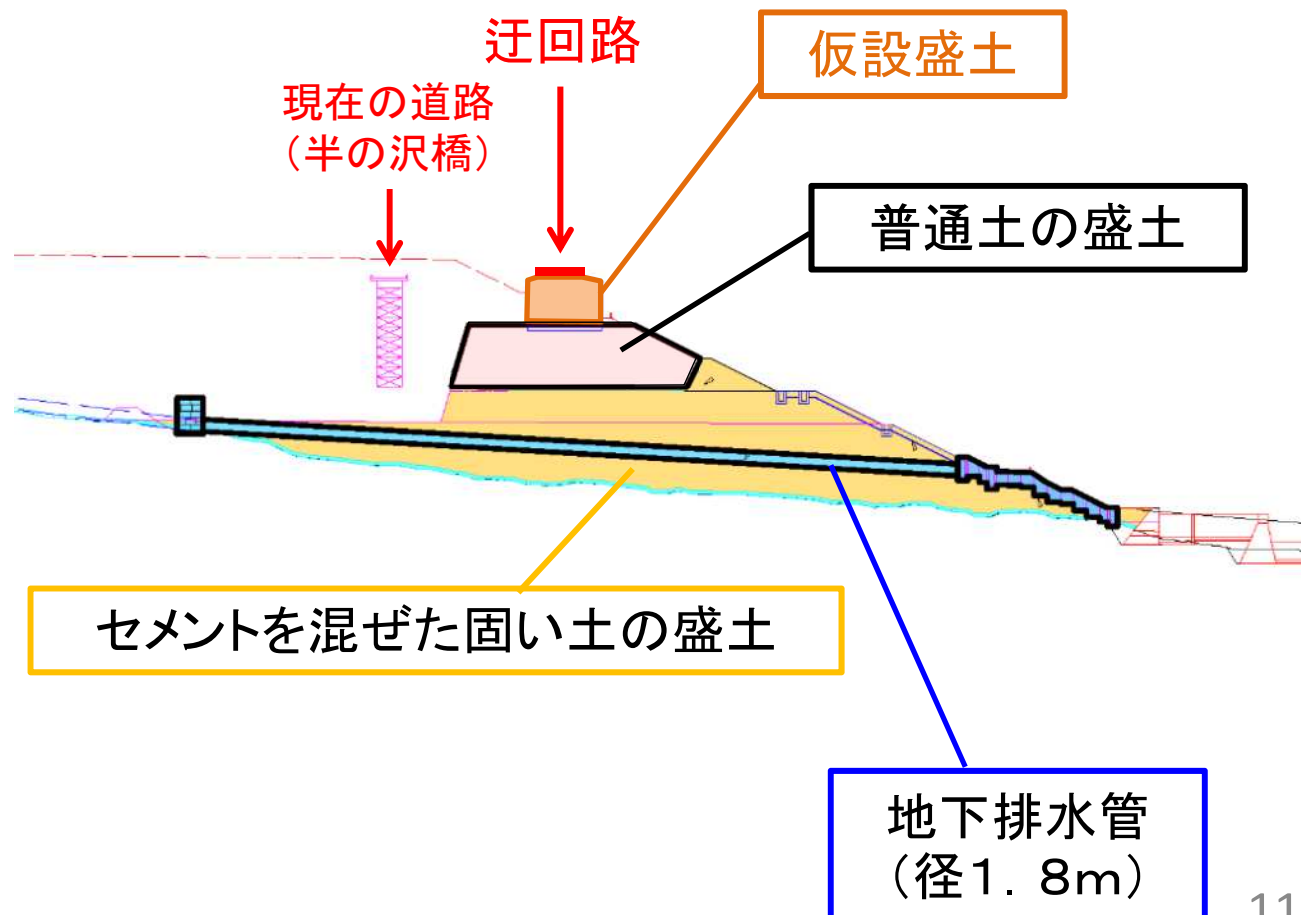

2. 半の沢道路改築の工事計画

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

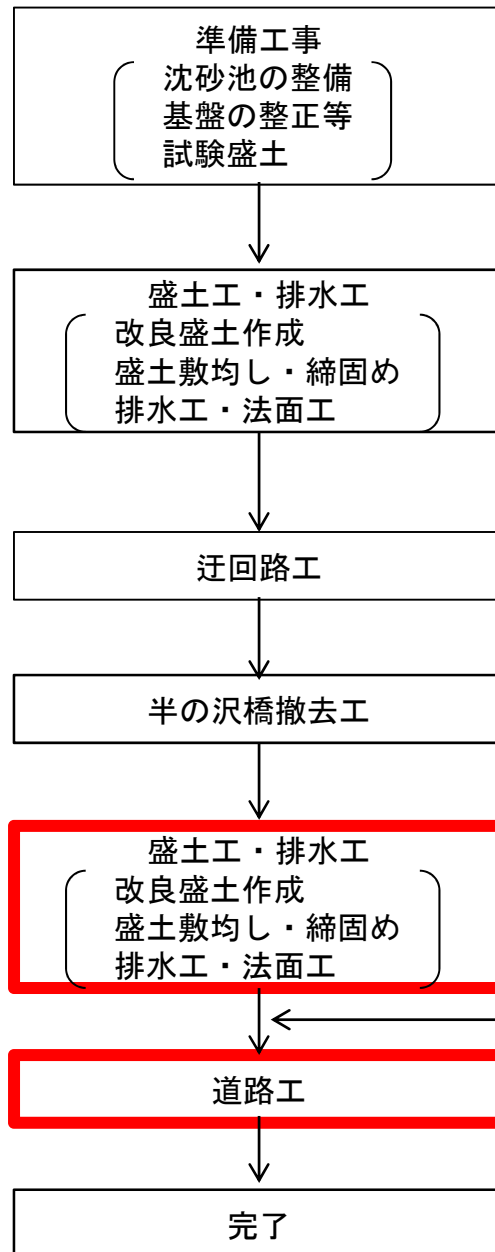

盛土工 排水工 道路工

- ・ 半の沢橋の撤去をした後、引き続き、残りの盛土工・排水工等を実施します。
- ・ 盛土造成が完了したら、県により道路舗装等を行います。

堰堤工

- ・ 将来の土石流対策のために整備する堰堤は、盛土工等に並行して工事を実施します。

堰堤工




堰堤工の整備イメージ

1. 半の沢道路改築の計画概要
2. 半の沢道路改築の工事計画
3. 工事中の安全管理
4. 工事用車両の運行
5. 今後の予定

3. 工事中の安全管理


2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

- ・ 日常点検に加えて、盛土状態を計測管理することで、安全管理を実施します。
- ・ 日常点検や計測管理等について、
中川村・長野県・JR等が確認・共有できるような連絡体制を構築します。

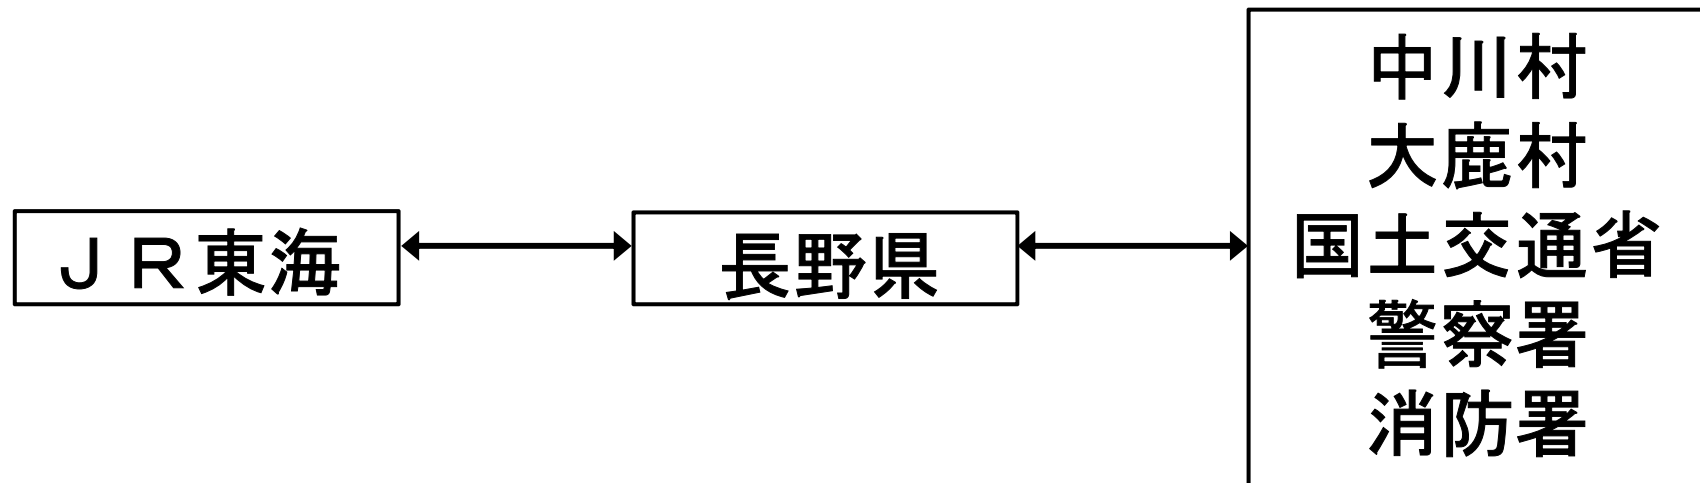

3. 工事中の安全管理

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

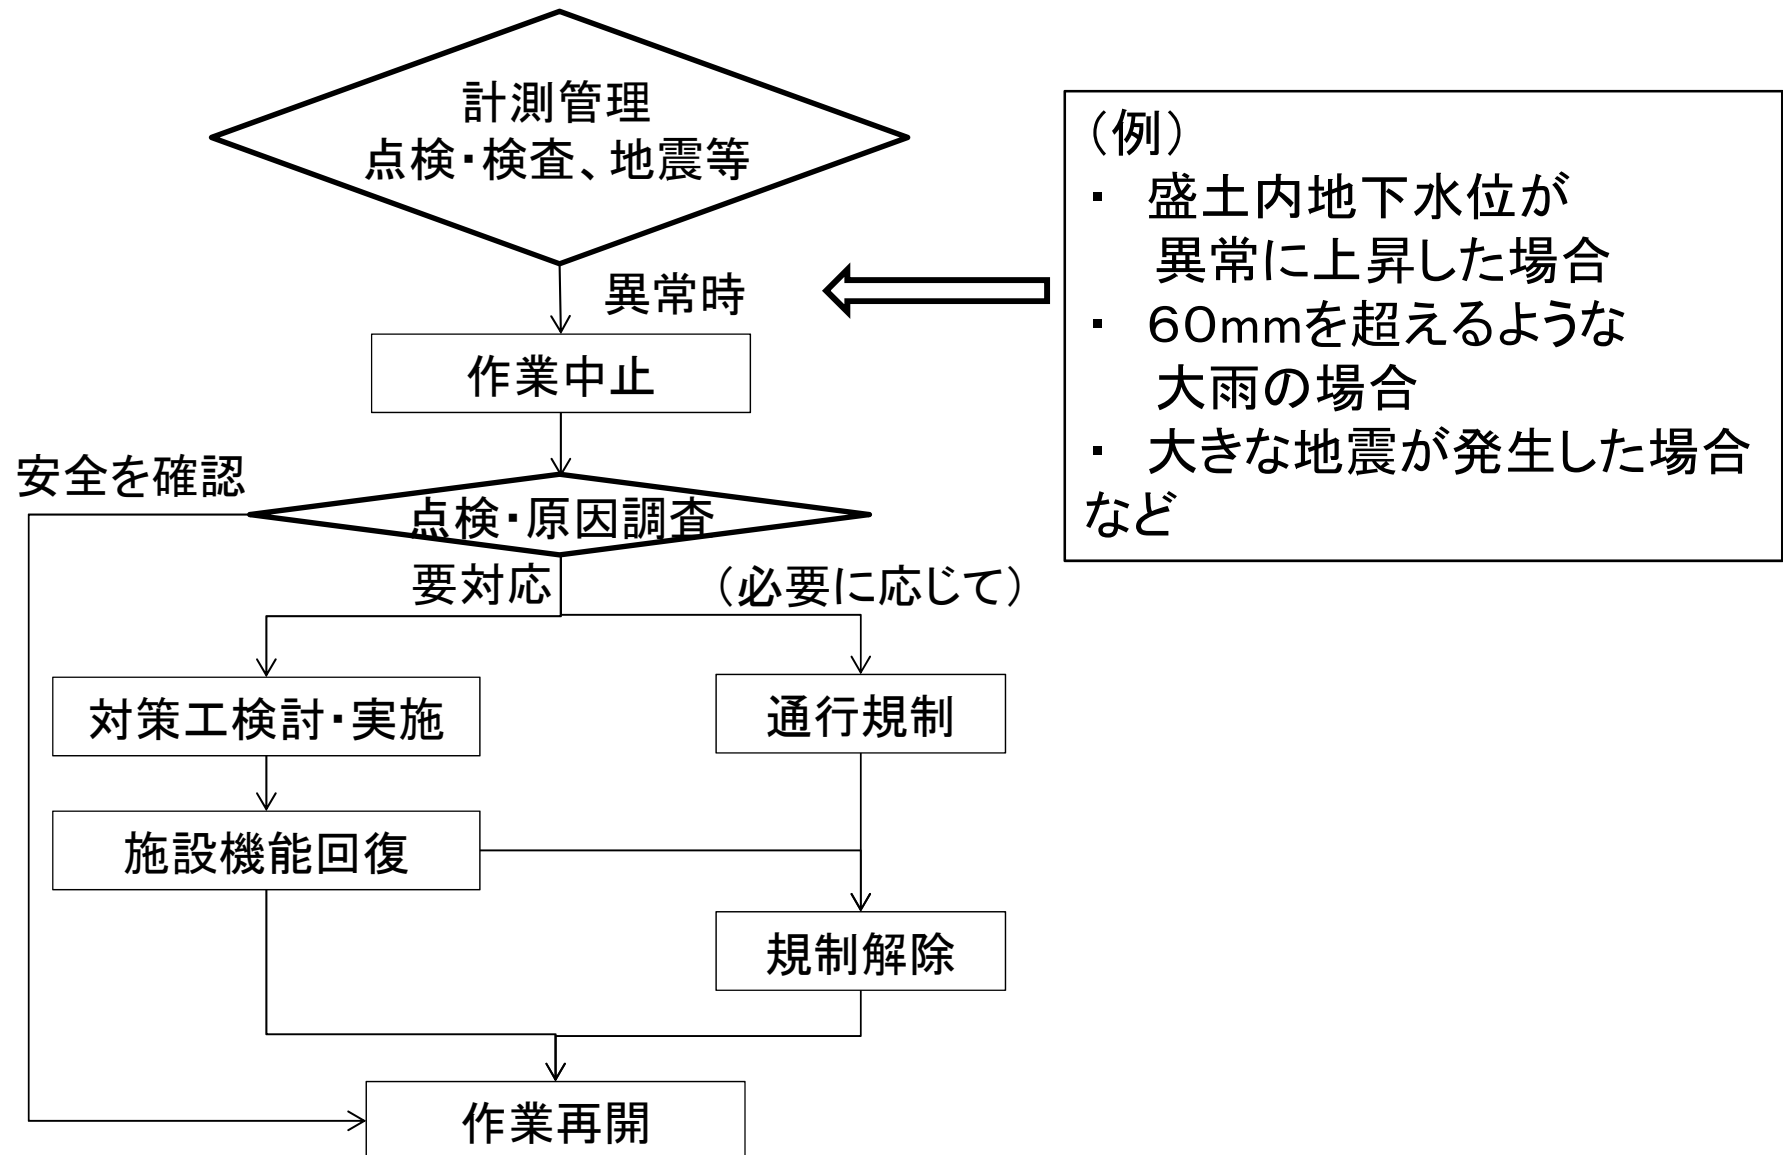

1. 半の沢道路改築の計画概要
2. 半の沢道路改築の工事計画
3. 工事中の安全管理
4. 工事用車両の運行
5. 今後の予定

4. 工事用車両の運行

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

工事用車両の通行に関する確認書に基づき、通行します。

運行時間帯：8時00分～18時00分 （発生土の運搬）

7時30分～19時00分 （資機材の運搬）

休 工 日：日曜日、その他長期休暇（年末年始等）

○上記の時間帯以外や休工日に作業や運搬を行うことがあります。

○その場合は事前に地元の皆様にお知らせします。

○地域のイベント等が開催される場合は、運行時間などについて、事前に調整させていただきます。



半の沢への発生土の運搬については、リニア工事関連車両（大型ダンプ）として黄色のステッカーで明示します。

4. 工事用車両の運行

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

《発生土の運搬について》

- 盛土に活用する発生土は、半の沢対岸に仮置きしている県道トンネルの発生土と大鹿村での中央新幹線建設に伴う発生土を活用します。
- 半の沢対岸に仮置きしている県道トンネルの発生土の運搬は、非出水期に小渋川を渡河して運搬します。
- 工事の進捗や他の発生土置き場への運搬状況等を踏まえながら、運搬計画を調整し、協議会等を通じて、随時予定運行台数をご説明します。

《インター線道路改良完了までの当面の運搬について》

種別	最大台数（往復）
発生土の運搬	200台／日 ※月4日程度
資機材の運搬	10台／日

※資機材の運搬は、大鹿村・中川村それぞれより運搬があります。

※その後の計画については、工事の進捗等を踏まえて、事前にお示しします。

（参考）発生土の運搬は盛土工事期間全体で、平均300台／日程度です。

※実際には、工事の進捗等で増減します。

1. 半の沢道路改築の計画概要
2. 半の沢道路改築の工事計画
3. 工事中の安全管理
4. 工事用車両の運行
5. 今後の予定

5. 今後の予定

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

	令和3年度 (2021年度)				令和4年度 (2022年度)				令和5年度 (2023年度)				令和6年度 (2024年度)			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
準備工		■	■													
盛土工 排水工			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
迂回路工						■	■									
橋梁撤去工								■	■							
堰堤工						■	■	■	■	■	■					
道路工															■	

▽ 現道から迂回路へ切替

5. 今後の予定

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

現在、必要な法令申請の手続き等を進めています。
必要な準備が整い次第、順次、工事を進めてまいります。

工事の状況や工事用車両の運行予定等については、
協議会等を通じて適宜ご説明させていただきます。

お問合せ先

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

事業者：長野県飯田建設事務所

住 所：長野県飯田市追手町 2－6 7 8

電話 0265-53-0496

(受付日時/土・日・祝日・年末年始を除く 平日 9時～17時)

施工者：東海旅客鉄道(株)

中央新幹線長野工事事務所（大鹿分室）

住 所：長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2645-5

電話 0265-39-2975

(受付日時/土・日・祝日・年末年始を除く 平日 9時～17時)

施工業者：中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)

工事共同企業体（構成員 鹿島建設・飛島建設・フジタJV）


住 所：長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2656-3

電話 0265-39-1071

以降、手持ち

計測機器配置図(工事中)について

凡例	機器	計測目的	数量
●	GNSS	盛土地表の変位	5
●	沈下計	盛土圧密沈下	3
●	孔内傾斜計	盛土地中の変形等	3
—●—	伸縮計	盛土の変位の変化	15
○	水質検査	水質の変化	3
	水量確認	流量の変化	3
●	観測井	盛土内の水位	8
■	雨量計	降雨状況	1
●	WEBカメラ	現場状況	2

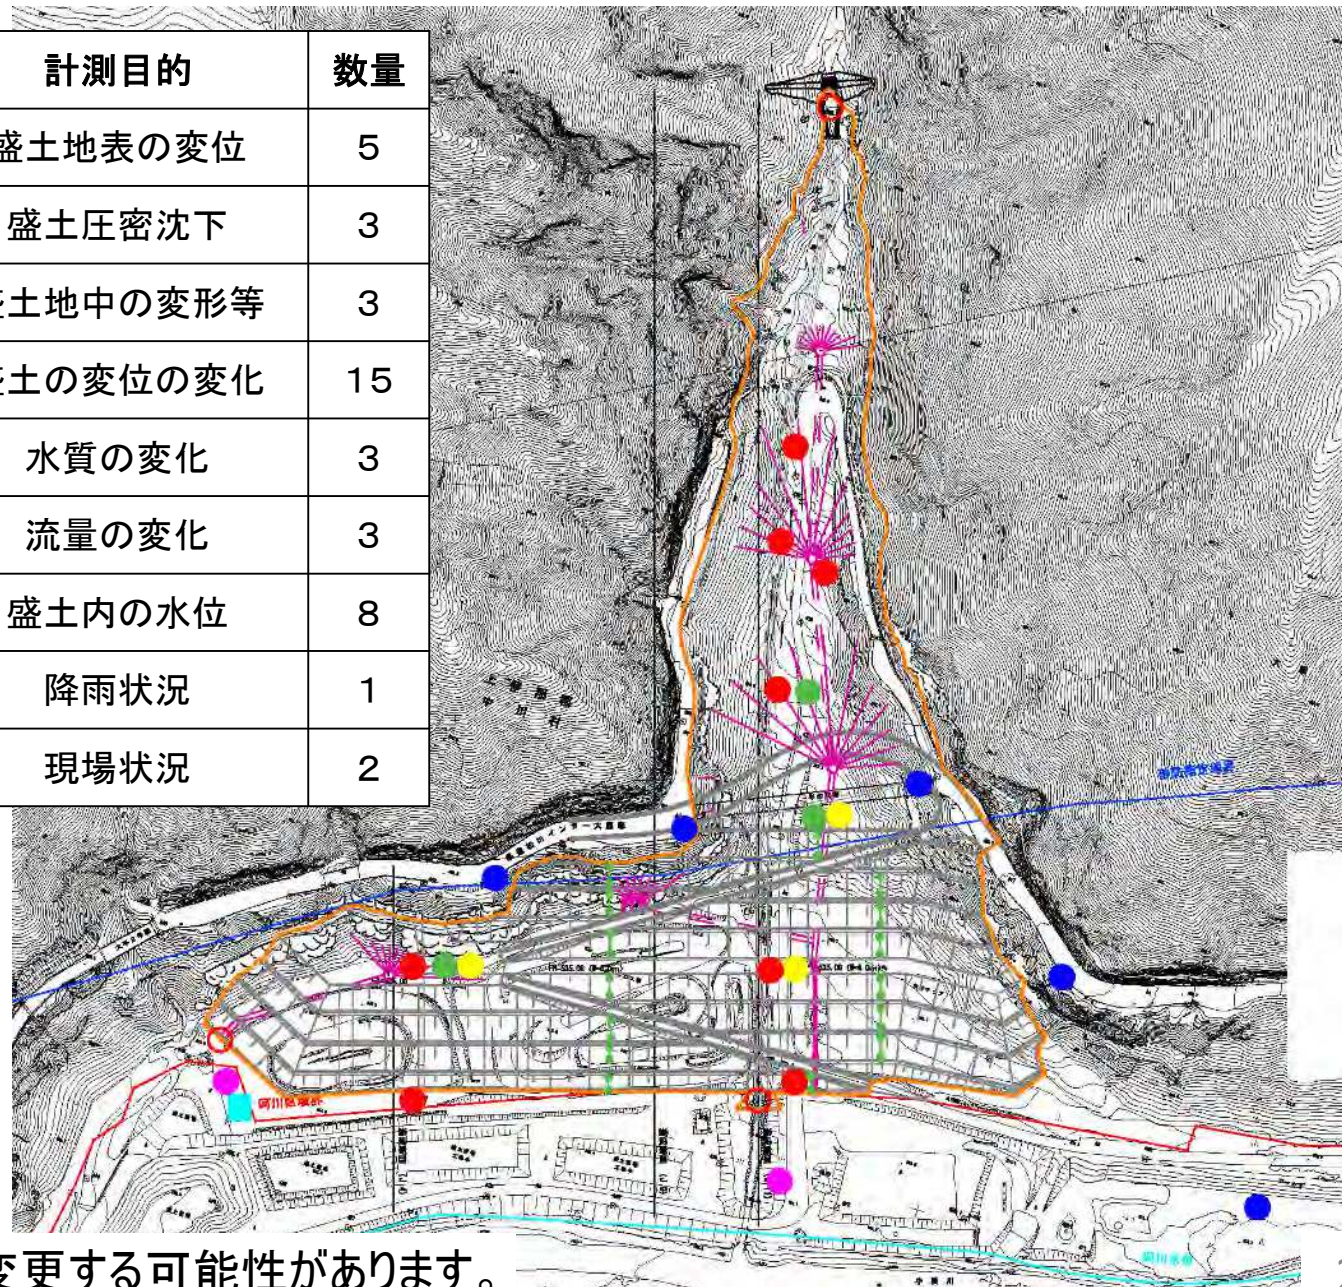

※今後、協議等のより、変更する可能性があります。

計測管理における管理基準値

計測管理における管理基準値は、**注意**・**警戒**の2段階で設定し、対応

「注意」：WEBカメラや計測値による盛土の状態監視を強化するため、監視体制を確保

「警戒」：作業を中止のうえ、関係機関への報告、点検・原因調査を開始


		注意 監視体制確保)	警戒 作業中止、点検・原因調査開始)
GNSS※1		5mm/10日	10mm/日
孔内傾斜計※1		1mm/10日	5mm/5日
伸縮計※1		5mm/10日	10mm/日
水量確認		降水量との連動を踏まえ 計測データより定める	同左
観測井		定常水位より上昇	盛土高1/4水位に達し、 さらに水位上昇が見込まれる 時
雨量計※2	(工事中)	10mm/h(時雨量) 60mm(連続雨量)	20mm/h(時雨量) 80mm(連続雨量)
	(供用後)	20mm/h(時雨量) 80mm(連続雨量)	25mm/h(時雨量) 100mm(連続雨量)

※1 地すべり観測便覧より(財)高速道路調査会の管理基準値を参考に設定


※2 他の県道に関する事前規制を参考に設定

異常時の連絡体制

○工事中

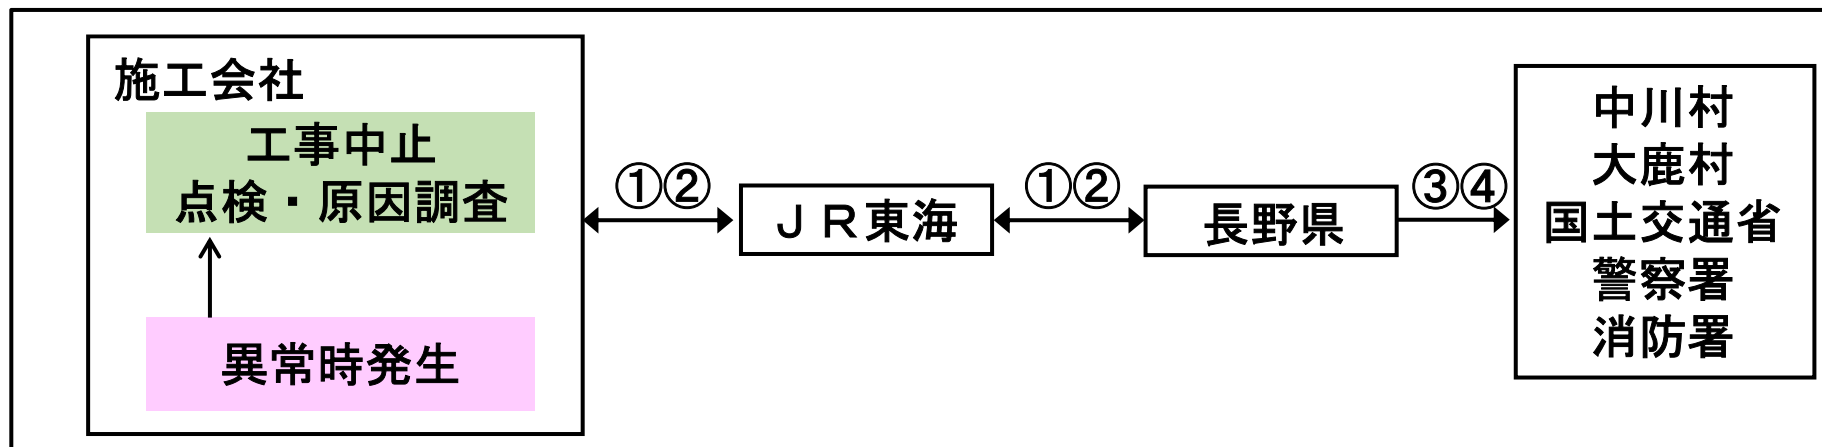

○供用後

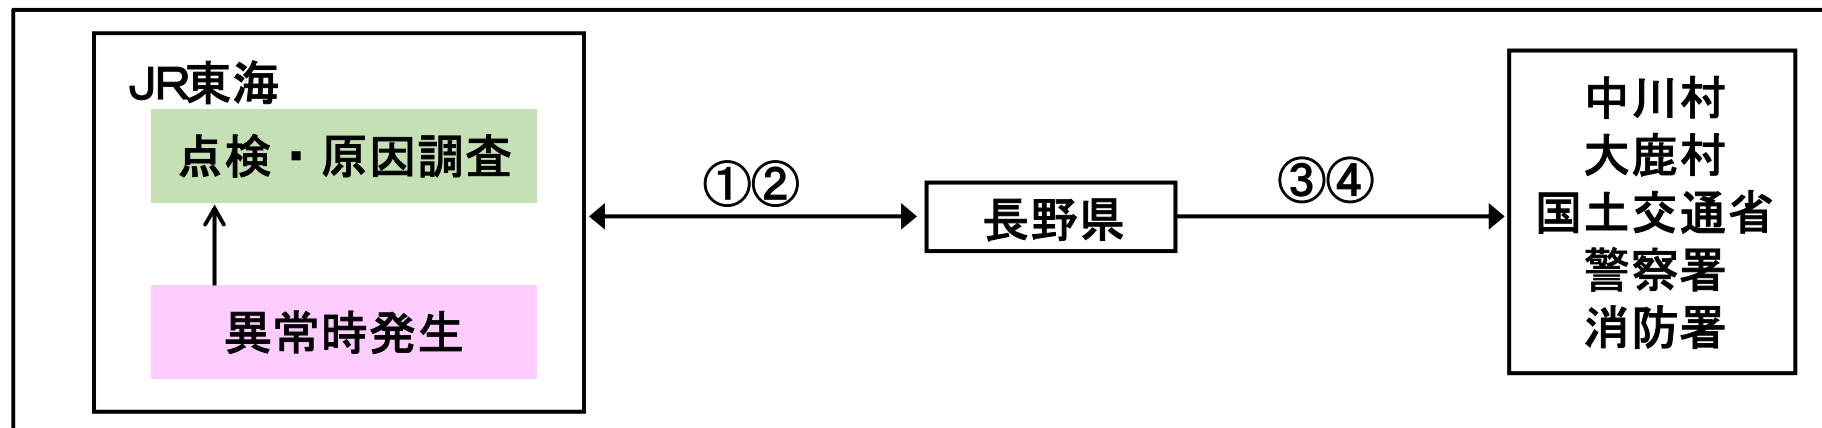


※①～④は、以下の通り。

①：異常時発生報告 ②：点検・調査結果報告 ③:交通規制 ④：交通規制解除


1. 半の沢道路改築工事の計画概要

2021年6月10日
中川村リニア対策協議会

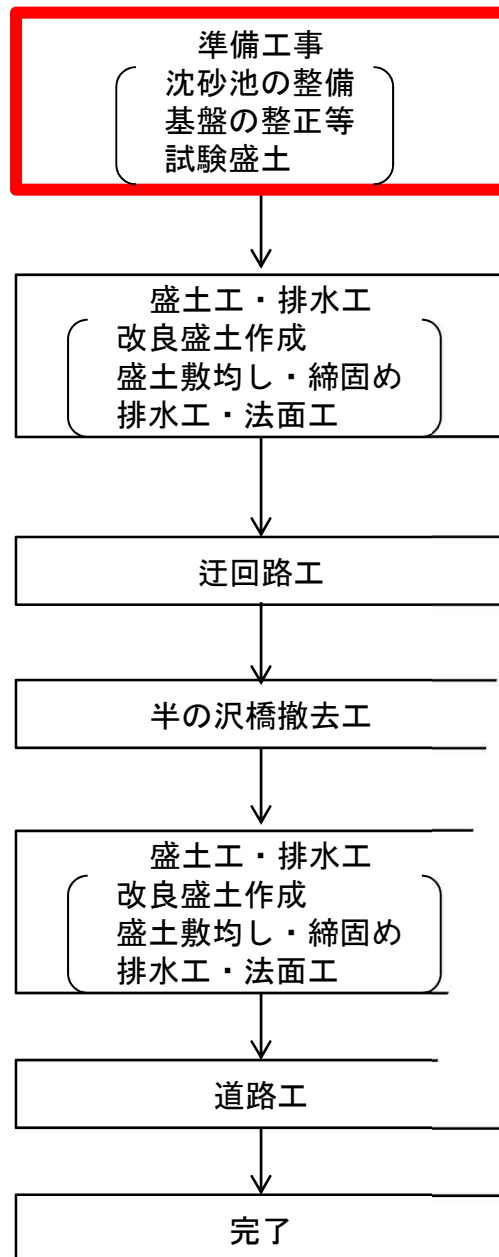

沈砂池の整備

工事中、降雨等で土砂が下流に流出しないよう、排水を一時的に貯め、土砂等を沈下、堆積させる沈砂池を整備します。

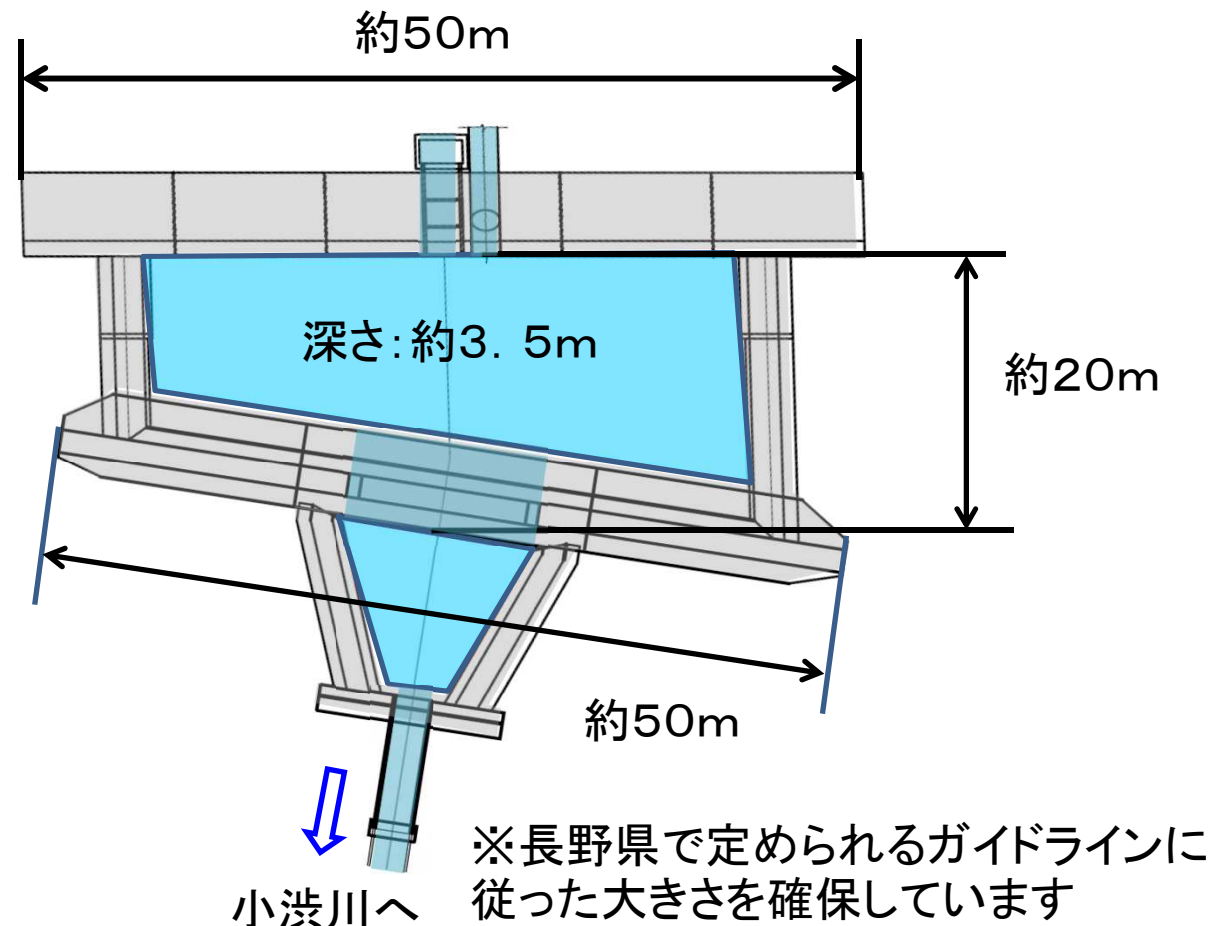

主要地方道松川インター大鹿線道路改良工事 位置図

令和3年6月10日資料
長野県飯田建設事務所

資料2

事業概要

○主要地方道松川インター大鹿線道路拡幅工事に関する基本協定書(H28.6.22～R3.12.15)

- ・区間1 : 道路拡幅工 L=295.3m 令和2年2月20日契約 吉川建設株式会社
- ・区間2 : 道路拡幅工 L=118.8m 令和2年2月20日契約 神稲建設株式会社
- ・区間3 : 道路拡幅工 L=168.7m 令和元年11月28日契約 吉川建設株式会社
- ・区間4 : 道路拡幅工 L=230.7m 令和元年11月26日契約 株式会社岡谷組
- ・区間5 : 道路拡幅工 L=244.0m 平成31年3月28日供用(東山トンネル供用に合わせ供用)
- ・河川内道路 L=3.3km 令和2年5月11日供用(7月豪雨により通行止め 7/1～11/30)

令和2年12月1日 供用再開

○主要地方道松川インター大鹿線道路トンネル工事の施行に関する協定書(H28.3.14～R1.7.31)

- ・西下トンネル : トンネルL=878m 平成30年12月15日供用
- ・東山トンネル : トンネルL=1,201m 平成31年3月28日供用

○県単交通安全対策(一種)工事

- ・中川村 渡場 : 歩道設置 L=86m 令和元年9月 工事完了

○その他工事

- 1) 防災工事 : 渡場～西下トンネル区間 2箇所施工中、復旧工事 1箇所完了(R3.4)
- 2) 道路情報提供設備 : 西下トンネル・東山トンネル カメラ設置、四徳大橋; 対向車センサー設置(R2工事完了)



区間2(R3.6.1)



道路拡幅 標準横断面図

