

第41回中川村リニア中央新幹線対策協議会 次第

令和7年7月10日(木) 午後7時00分

中川村文化センター 2階 小ホール

1 開 会

2 あいさつ

3 協議事項

(1) JR東海工事関係・・・資料1

- ・大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ・工事用車両台数について
- ・渡場交差点付近における環境測定について
- ・その他

(2) 県道工事関係

- ・(主)松川インター大鹿線改良事業等について・・・資料2-1、2-2、2-3

- ・(一)県道北林飯島線・(主)伊那生田飯田線について・・・資料3

4 その他

5 閉 会

第41回 中川村リニア対策協議会 資料

令和7年(2025年)7月10日

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)
中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体
中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体


- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

南アルプストンネル長野工区の工事状況

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

- 除山非常口から先進坑及び本坑を掘削しています。
- 小渋川非常口からは、本坑又は小渋川橋りょうを施工するために必要な工事用トンネルを掘削しています。

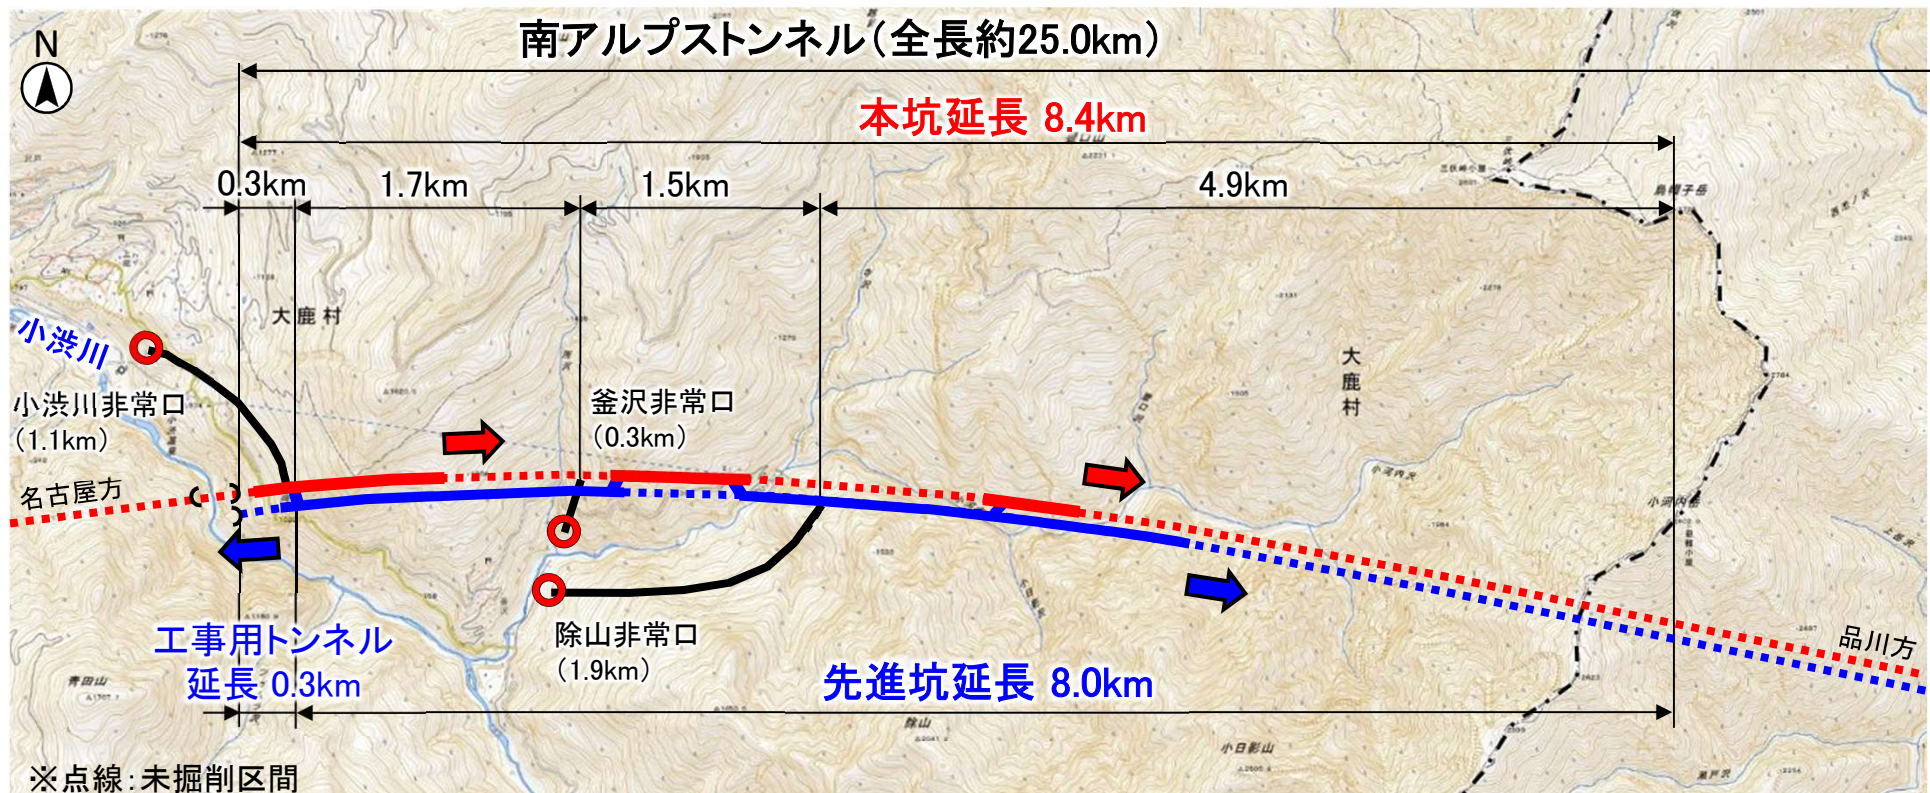

【凡例】

- 非常口
- 先進坑・工事用トンネル
- 本坑


工事進捗(掘削済延長)

非常口 : 約3.3km 完了
先進坑等: 約4.4km / 8.3km
本坑 : 約2.5km / 8.4km

伊那山地トンネル青木川工区の工事状況

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

- 青木川非常口から本坑を掘削しています。

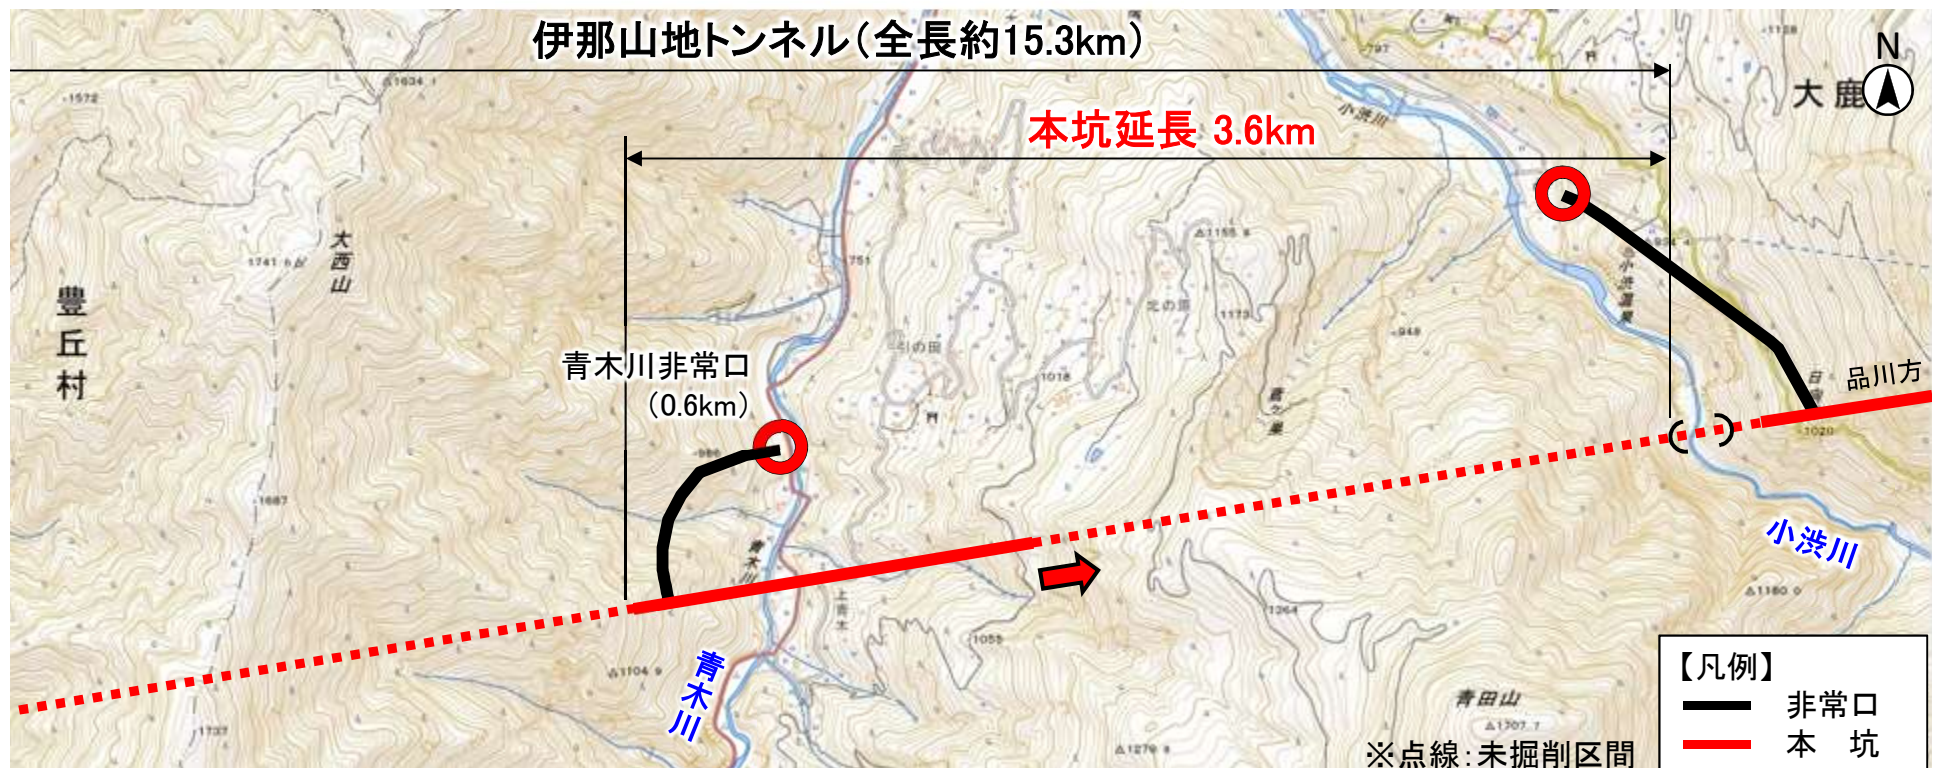

工事進捗(掘削済延長)

非常口: 約0.6km 完了
本坑: 約1.4km / 3.6km

トンネル工事進捗状況

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

先進坑掘削状況(除山)



本坑掘削状況(除山)



本坑掘削状況(小渋川)



本坑掘削状況(青木川)



発生土仮置き場の状況

20250710 中川村
第41回対策協議会資料


- 発生土仮置き場B(三正坊)は、土砂の搬出を適宜行っています。
- 発生土仮置き場E(小渋川変電所予定地)は、土砂の搬入・搬出を行っています。
また、6月初旬から要対策土を飯田市内(土曾川橋りょう)に搬出しています。



- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

通行台数実績(資機材運搬車両)

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

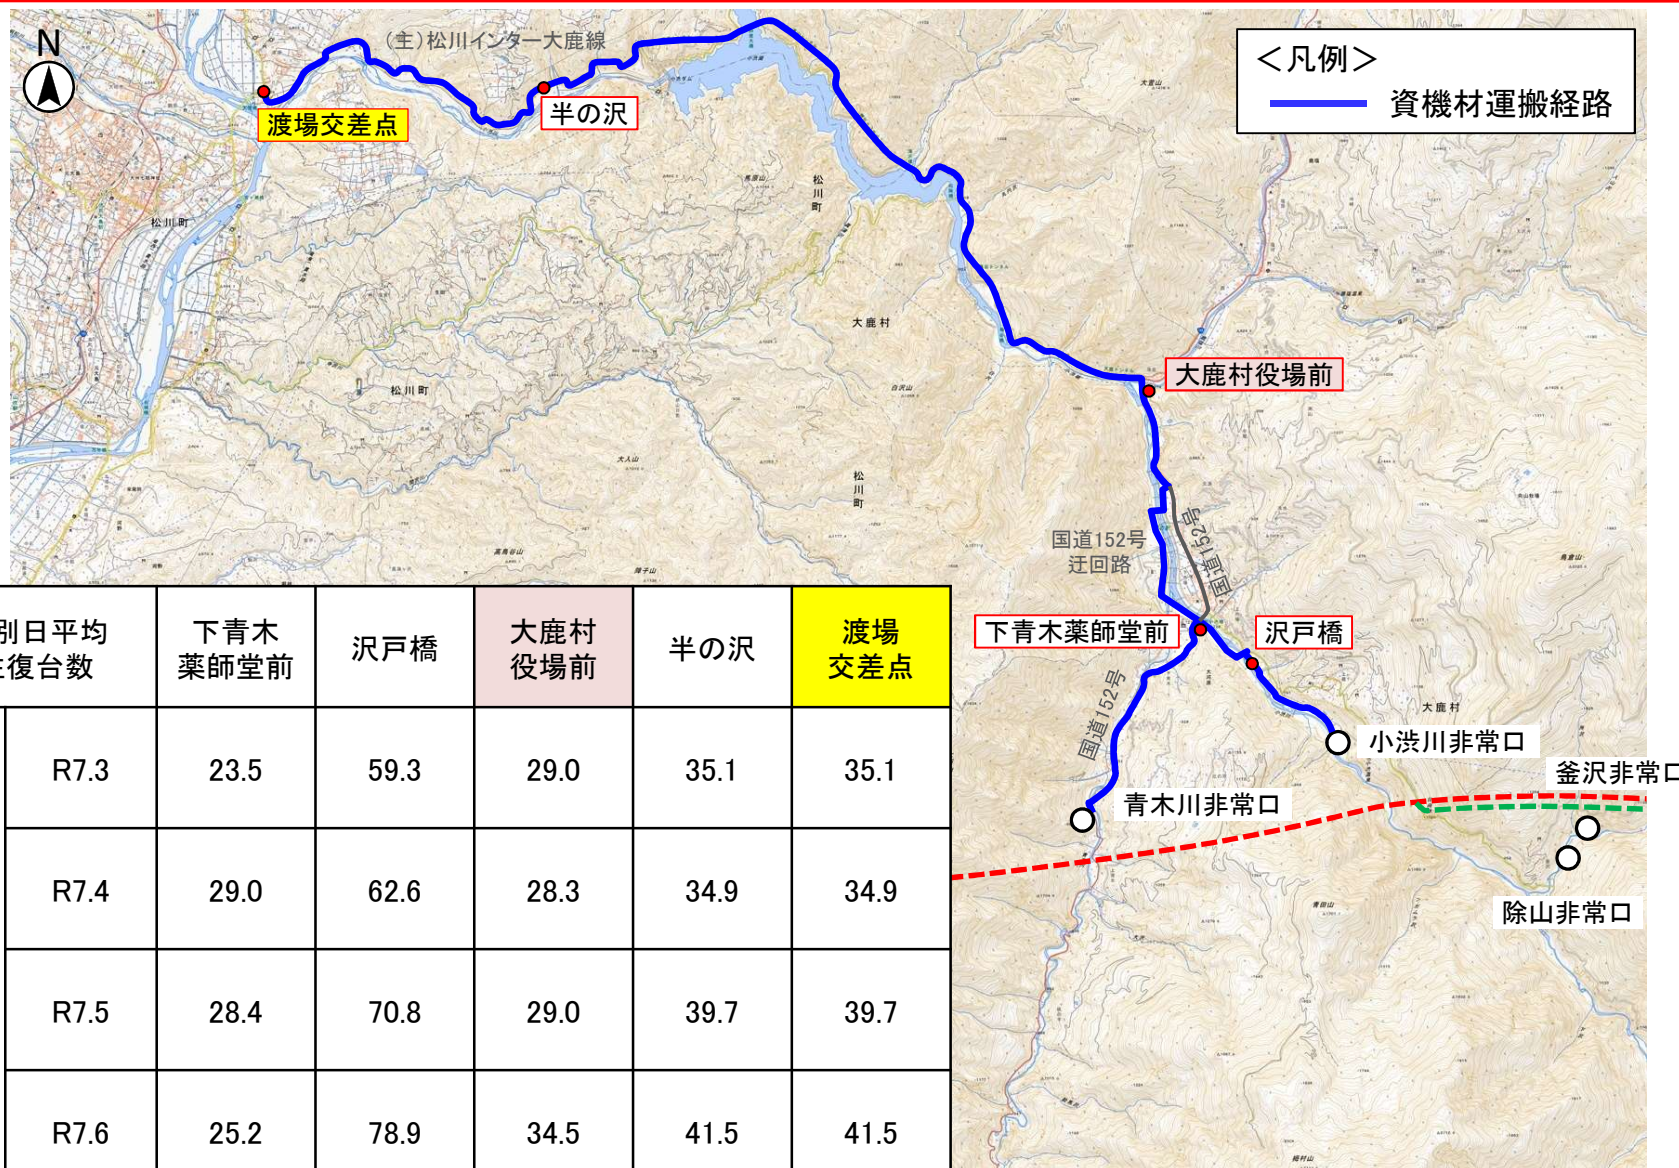


※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

※ R7.6の台数は、6/15までの実績台数です。

通行台数実績(発生土運搬車両)

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

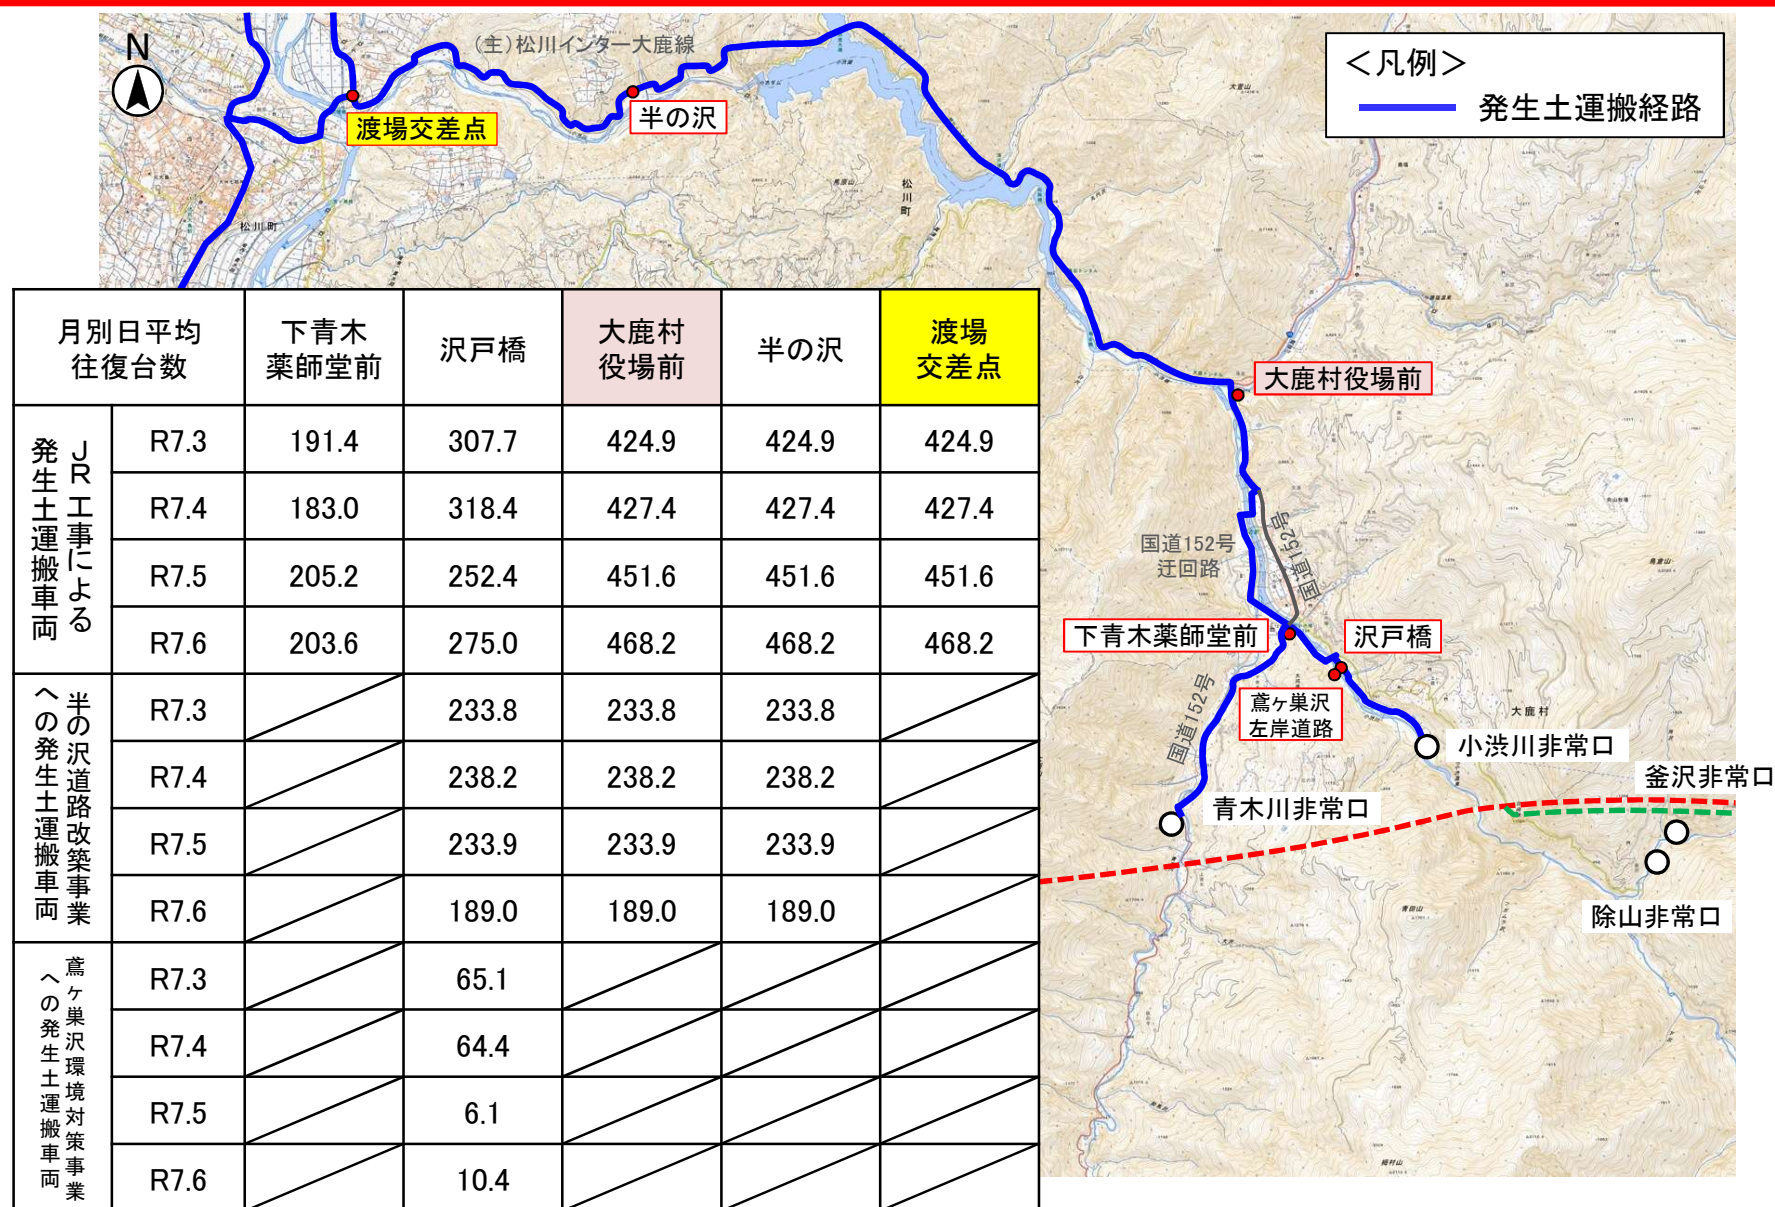

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

※ R7.6の台数は、6/15までの実績台数です。

工事用車両通行台数の予定(渡場交差点)

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

【往復台数】

		令和7年7月		令和7年8月		令和7年9月	
		月別 日平均	日最大	月別 日平均	日最大	月別 日平均	日最大
資機材運搬		50	60	50	60	50	60
発生土運搬	新宮川岸地区土地改良事業 (駒ヶ根市中沢)	220	280	260	300	260	300
	小和田地区基盤整備事業 (中川村小和田)	260	300	220	320	220	320
	前河原道路新設事業 (松川町古町)	10	40	20	40	20	40
	中央新幹線長野県駅新設工事 (飯田市上郷飯沼・座光寺)	10	30	—	—	—	—
合計		550	720	550	720	550	720

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です。

飯田市内から小和田への発生土運搬について

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

- 飯田市内の中央新幹線トンネル工事現場から小和田への発生土運搬を予定しています。
- 中川村内においては、国道153号の往復通行を予定しています。
- 期間・台数等の詳細が決定次第、関係地区に回覧文書でお知らせいたします。

- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

環境測定(渡場交差点)について

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

○測定項目

- ・ 大気質(窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の濃度)
- ・ 騒音
- ・ 振動

○測定期間

2018年11月から通年測定



測定箇所



騒音・振動
測定機器




大気質測定
ハウス


渡場交差点における環境測定結果(3~5月)

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

二酸化窒素


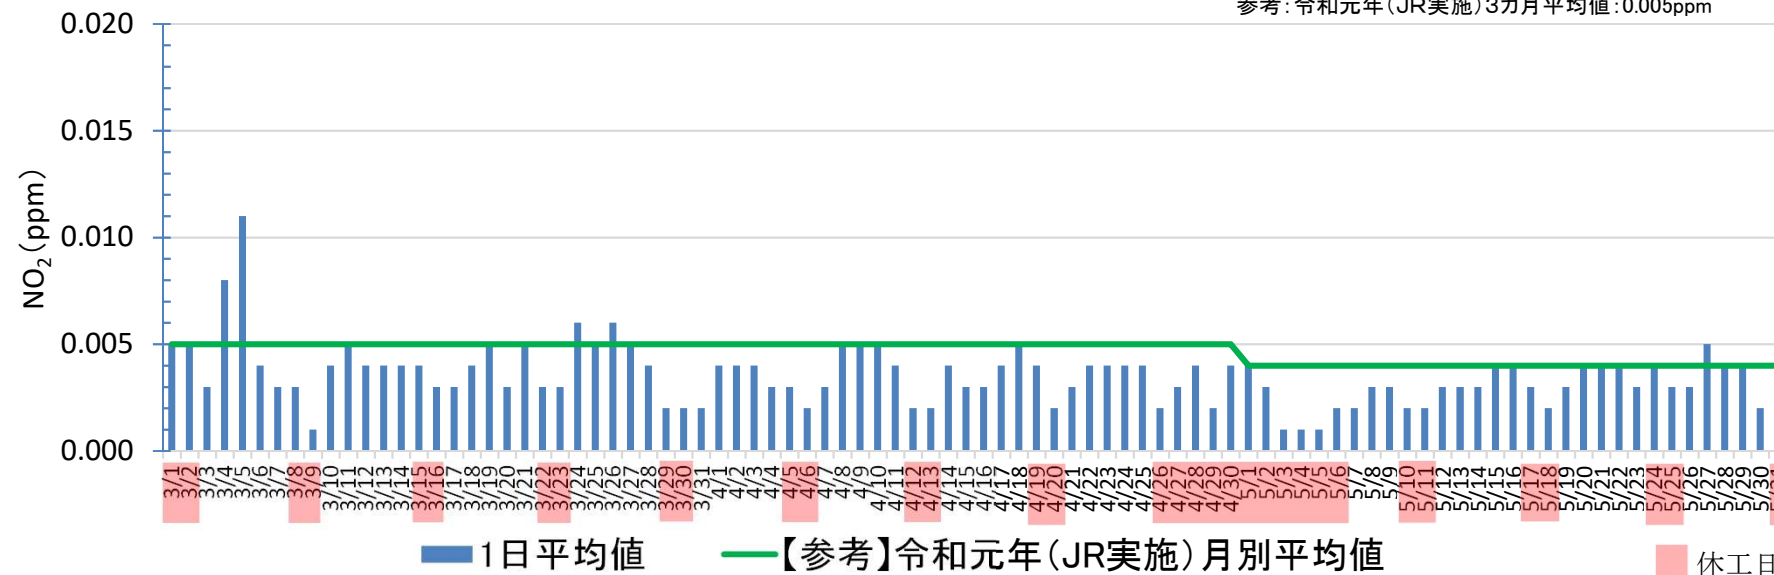


浮遊粒子状物質

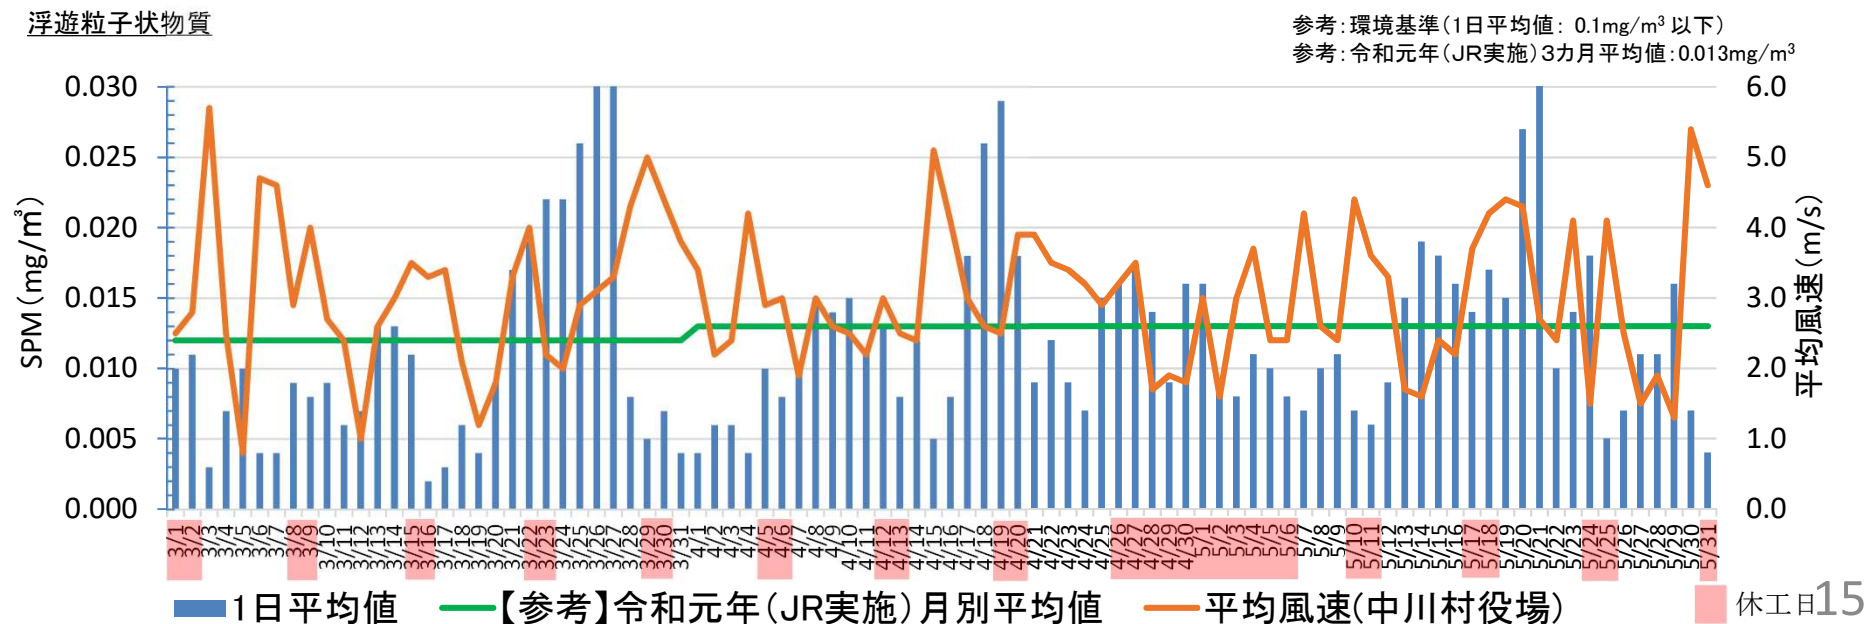

渡場交差点における環境測定結果(3~5月)

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

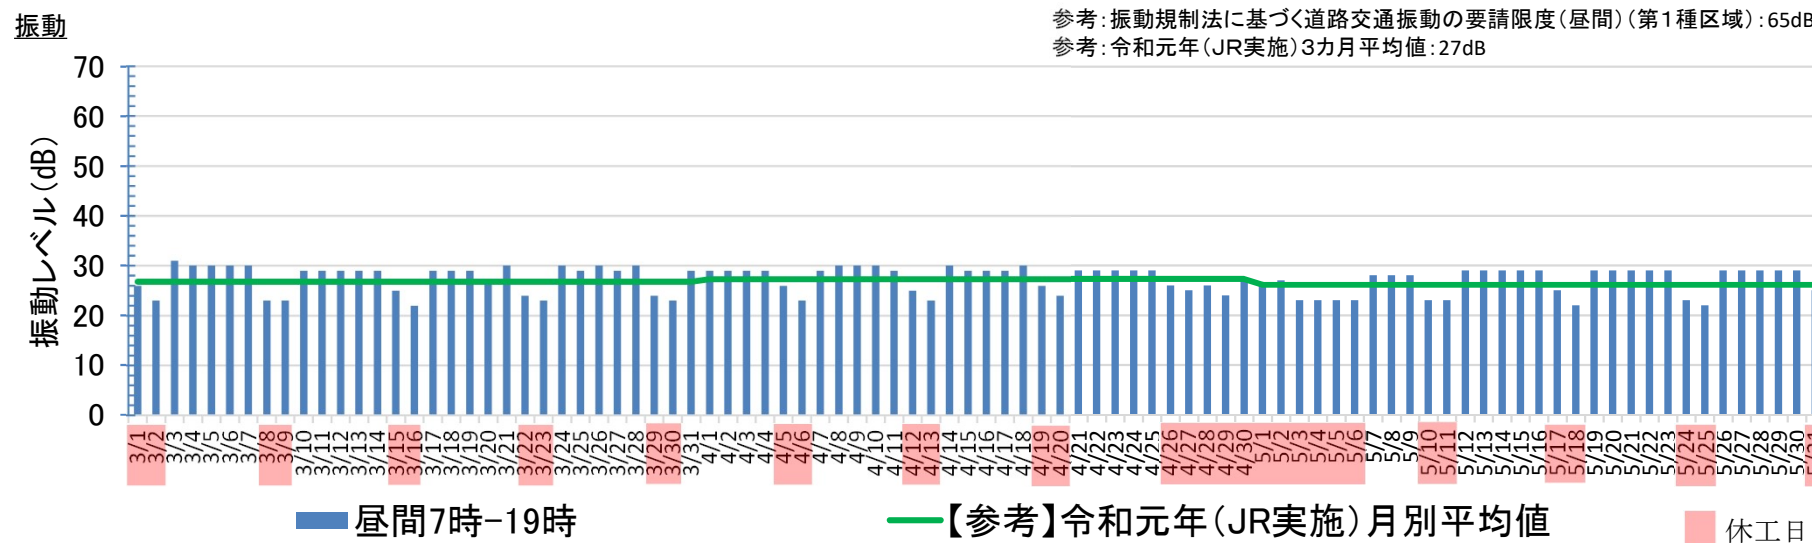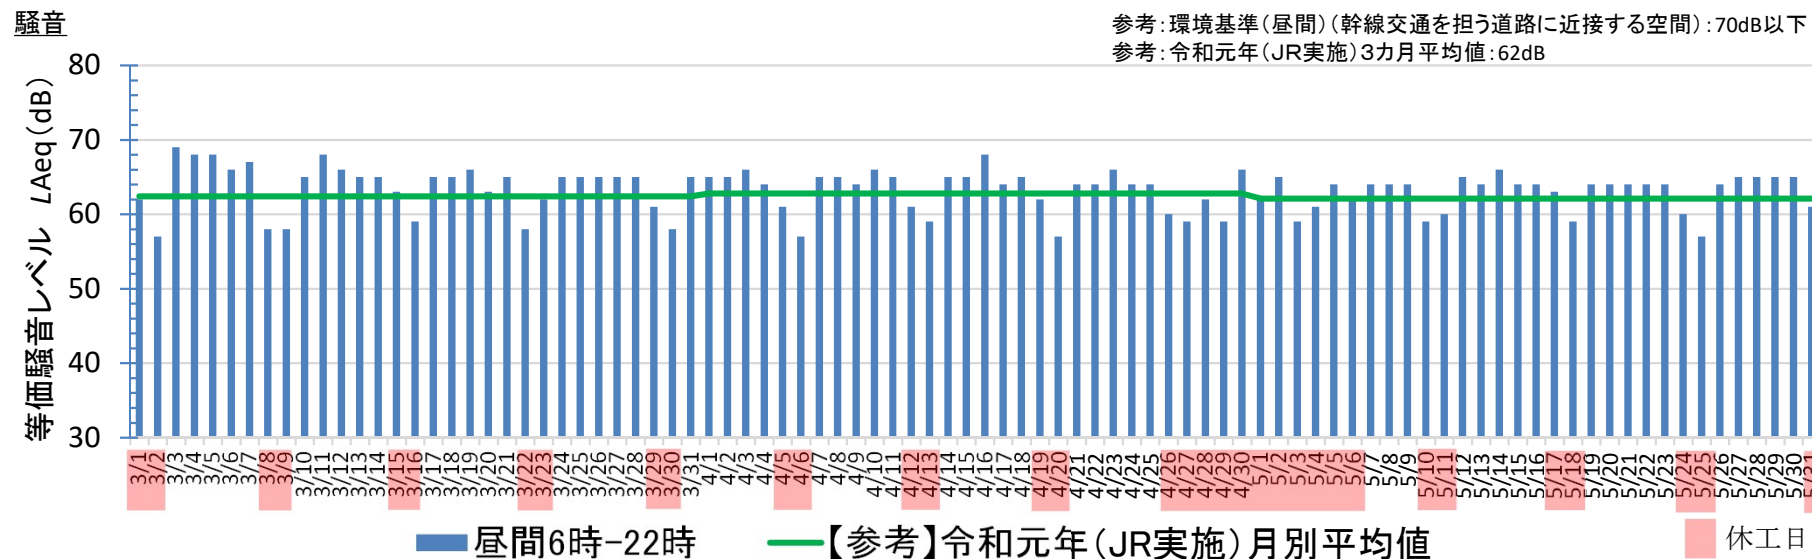


渡場交差点における環境測定結果(3~5月)

20250710 中川村
第41回対策協議会資料


騒音

参考: 環境基準(夜間)(幹線交通を担う道路に近接する空間): 65dB以下
参考: 令和元年度(JR実施)3カ月平均値: 50dB

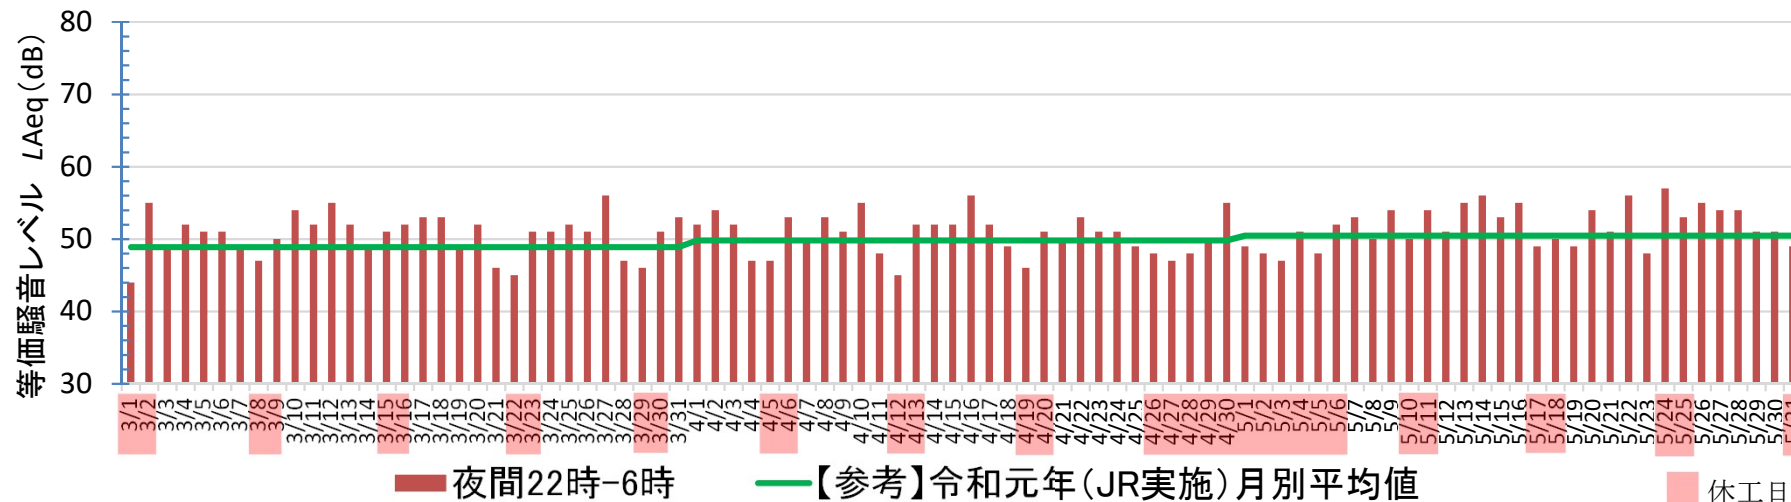

振動

参考: 振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度(夜間)(第1種区域): 60dB
参考: 令和元年度(JR実施)3カ月平均値: 21dB

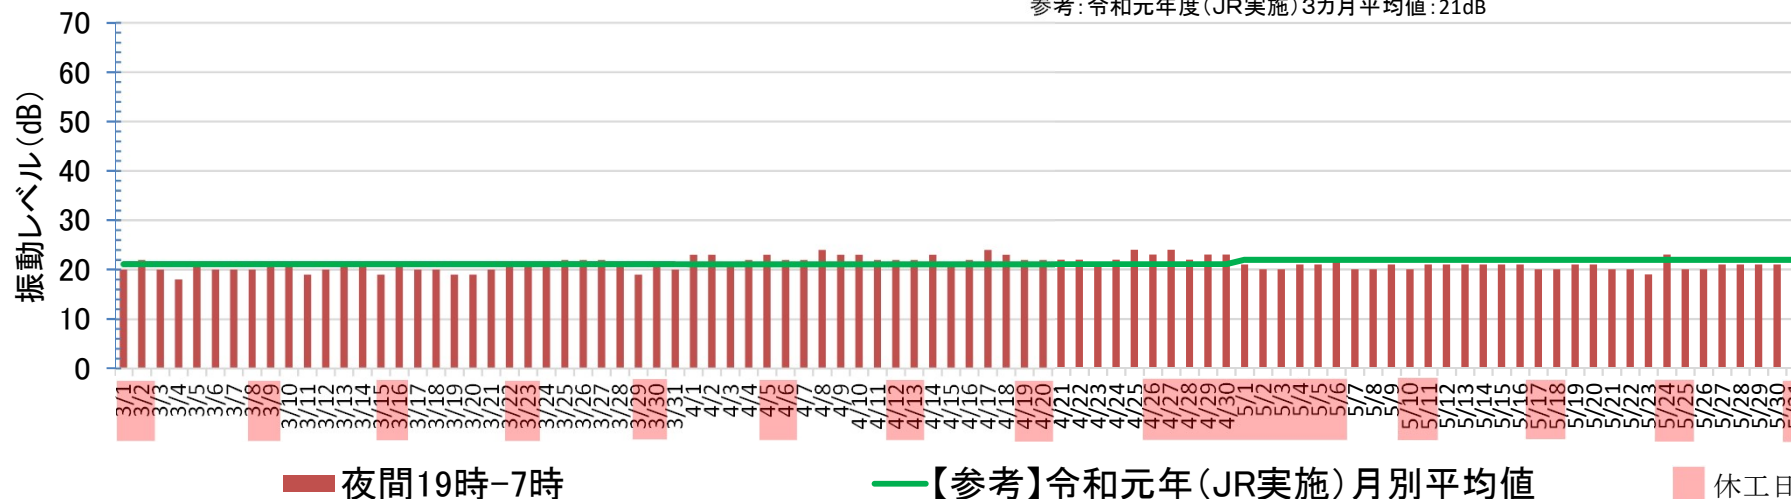

- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

地域連携に関する取組み

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

➤ 引続き、環境保全・地域連携に関する取組みを継続してまいります。



中川西小学校での交通安全教室開催(4/16)



渡場交差点周辺での清掃(4月, 7月)

工事カレンダー・お問い合わせ先

20250710 中川村
第41回対策協議会資料

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」を参照
- トンネル坑内での地質調査、ヤードでのベルトコンベア設置等の作業は、日曜日にも実施することがあります。

【お問い合わせ先】

JR東海	東海旅客鉄道(株) 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室) (住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原381-1 (電話)0265-39-2975
南ア(長野工区) 鹿島建設・飛島建設・フジタJV	中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2656-3 (電話)0265-39-1071
伊那山地(青木川工区) 飛島建設・奥村組土木興業JV	中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡大鹿村大河原1355-5 (電話)0265-39-1851

※ 受付日時：土・日・祝日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く平日の9時～17時

工事カレンダー（伊那山地トンネル(青木川工区)、南アルプストンネル(長野工区)）

2025年																																																											
1月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	2月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	3月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	4月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	5月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	6月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	7月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	8月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	9月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	10月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	11月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	12月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬
1/1 元旦	水				2/1	土				3/1	土				4/1	火				5/1	木				6/1	日				7/1	火				8/1	金				9/1	月				10/1	水				11/1	土				12/1	月			
1/2	木				2/2	日				3/2	日				4/2	水				5/2	金				6/2	月				7/2	水				8/2	土				9/2	火				10/2	木				11/2	日				12/2	火			
1/3	金				2/3	月				3/3	月				4/3	木				5/3 憲法記念日	土				6/3	火				7/3	木				8/3	日				9/3	水				10/3	金				11/3 文化の日	月				12/3	水			
1/4	土				2/4	火				3/4	火				4/4	金				5/4 みどりの日	日				6/4	水				7/4	金				8/4	月				9/4	木				10/4	土				11/4	火				12/4	木			
1/5	日				2/5	水				3/5	水				4/5	土				5/5 こどもの日	月				6/5	木				7/5	土				8/5	火				9/5	金				10/5	日				11/5	水				12/5	金			
1/6	月				2/6	木				3/6	木				4/6	日				5/6 振替休日	火				6/6	金				7/6	日				8/6	水				9/6	土				10/6	月				11/6	木				12/6	土			
1/7	火				2/7	金				3/7	金				4/7	月				5/7	水				6/7	土				7/7	月				8/7	木				9/7	日				10/7	火				11/7	金				12/7	日			
1/8	水				2/8	土				3/8	土				4/8	火				5/8	木				6/8	日				7/8	火				8/8	金				9/8	月				10/8	水				11/8	土				12/8	月			
1/9	木				2/9	日				3/9	日				4/9	水				5/9	金				6/9	月				7/9	水				8/9	土				9/9	火				10/9	木				11/9	日				12/9	火			
1/10	金				2/10	月				3/10	月				4/10	木				5/10	土				6/10	火				7/10	木				8/10	日				9/10	水				10/10	金				11/10	月				12/10	水			
1/11	土				2/11 建国記念の日	火				3/11	火				4/11	金				5/11	日				6/11	水				7/11	金				8/11 山の日	月				9/11	木				10/11	土				11/11	火				12/11	木			
1/12	日				2/12	水				3/12	水				4/12	土				5/12	月				6/12	木				7/12	土				8/12	火				9/12	金				10/12	日				11/12	水				12/12	金			
1/13 成人の日	月				2/13	木				3/13	木				4/13	日				5/13	火				6/13	金				7/13	日				8/13	水				9/13	土				10/13 スポーツの日	月				11/13	木				12/13	土			
1/14	火				2/14	金				3/14	金				4/14	月				5/14	水				6/14	土				7/14	月				8/14	木				9/14	日				10/14	火				11/14	金				12/14	日			
1/15	水				2/15	土				3/15	土				4/15	火				5/15	木				6/15	日				7/15	火				8/15	金				9/15 敬老の日	月				10/15	水				11/15	土				12/15	月			
1/16	木				2/16	日				3/16	日				4/16	水				5/16	金				6/16	月				7/16	水				8/16	土				9/16	火				10/16	木				11/16	日				12/16	火			
1/17	金				2/17	月				3/17	月				4/17	木				5/17	土				6/17	火				7/17	木				8/17	日				9/17	水				10/17	金				11/17	月				12/17	水			
1/18	土				2/18	火				3/18	火				4/18	金				5/18	日				6/18	水				7/18	金				8/18	月				9/18	木				10/18	土				11/18	火				12/18	木			
1/19	日				2/19	水				3/19	水				4/19	土				5/19	月				6/19	木				7/19	土				8/19	火				9/19	金				10/19	日				11/19	水				12/19	金			
1/20	月				2/20	木				3/20 春分の日	木				4/20	日				5/20	火				6/20	金				7/20	日				8/20	水				9/20	土				10/20	月				11/20	木				12/20	土			
1/21	火				2/21	金				3/21	金				4/21	月				5/21	水				6/21	土				7/21 海の日	月				8/21	木				9/21	日				10/21	火				11/21	金				12/21	日			
1/22	水				2/22	土				3/22	土				4/22	火				5/22	木				6/22	日				7/22	火				8/22	金				9/22	月				10/22	水				11/22	土				12/22	月			
1/23	木				2/23 天皇誕生日	日				3/23	日				4/23	水				5/23	金				6/23	月				7/23	水				8/23	土				9/23 秋分の日	火				10/23	木				11/23 勤労感謝の日	月				12/23	火			
1/24	金				2/24 振替休日	月				3/24	月				4/24	木				5/24	土				6/24	火				7/24	木				8/24	日				9/24	水				10/24	金				11/24 振替休日	月				12/24	水			
1/25	土				2/25	火				3/25	火				4/25	金				5/25	日				6/25	水				7/25	金				8/25	月				9/25	木				10/25	土				11/25	火				12/25	木			
1/26	日				2/26	水				3/26	水				4/26	土				5/26	月				6/26	木				7/26	土				8/26	火				9/26	金				10/26	日				11/26	水				12/26	金			
1/27	月				2/27	木				3/27	木				4/27	日				5/27	火				6/27	金				7/27	日				8/27	水				9/27	土				10/27	月				11/27	木				12/27	土			
1/28	火				2/28	金				3/28	金				4/28	月				5/28	水				6/28	土				7/28	月				8/28	木				9/28	日				10/28	火				11/28	金				12/28	日			
1/29	水									3/29	土				4/29 昭和の日	火				5/29	木				6/29	日				7/29	火				8/29	金				9/29	月				10/29	水				11/29	土				12/29	月			
1/30	木									3/30	日				4/30	水				5/30	金				6/30	月				7/30	水				8/30	土				9/30	火				10/30														

<凡例>

… トンネル掘削および関連工事、明かり工事、発生土運搬

… 場内作業のみ(大型工事用車両の通行:10台/日・往復以下程度) ※場内作業とは、トンネル坑内やヤード内での調査、機械設備の設置・撤去・保守点検作業等

… 休工日(発生土運搬については、県道59号線の通行が無いことを表しています)
※1月～3月、12月の土曜日については、平日の天候次第で運搬する可能性があります

… 調整中

… 前回協議会資料からの変更箇所

※通勤通学等の時間帯は、通行台数を調整するよう努めます。
※上記工事予定以外の日時(休工日含む)に作業を行う場合には、関係する住民の方々へお知らせします。
※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～5時の時間帯に運搬することを考えています。

主要地方道松川インター大鹿線道路改良工事 位置図

令和7年7月10日資料
長野県飯田建設事務所

資料2-1

事業概要

●実施中の事業

- ①道路改良事業: 葛島 測量設計、関係機関協議
- ②道路改良事業: 二軒屋 関係機関協議、道路拡幅工事(松川町側)
- ③道路改良事業: 半の沢 盛土造成工事
- ④防災対策事業: 四徳大橋西 設計、関係機関協議
- ⑤トンネル事業: 落合トンネル トンネル工事

○その他工事

- ・修繕工事(橋梁補修): こいけどう橋(予定)
- ・修繕工事(舗装修繕): 大梨1号橋、大梨2号橋、柳沢1号橋、四徳大橋西(完了)

○主要地方道松川インター大鹿線道路拡幅工事に関する基本協定書(H28.6.2)に基づく工事

- ・区間1: 道路拡幅工 L=295.3m 令和3年9月27日供用開始
- ・区間2: 道路拡幅工 L=118.8m 令和3年6月21日供用開始
- ・区間3: 道路拡幅工 L=183.0m 令和3年8月31日供用開始
- ・区間4: 道路拡幅工 L=230.7m 令和3年9月27日供用開始
- ・区間5: 道路拡幅工 L=244.0m 平成31年3月28日供用開始

○主要地方道松川インター大鹿線道路トンネル工事の施行に関する協定書(H28.3.14)に基づく工事

- ・西下トンネル: トンネルL=878m 平成30年12月15日供用開始
- ・東山トンネル: トンネルL=1,201m 平成31年3月28日供用開始



(主) 松川インター大鹿線 道路改良工事

◆工事概要

工事場所 : 長野県上伊那郡中川村葛島地先
工事内容 : 道路改良工 L=20.0m W=6.0(7.5)m
大型ブロック積工 L=18m A=110m²
排水工 一式
工事期間 : 令和7年1月～

◆位置図




◆工事に伴う交通規制について

現在は準備工を行っており、今後は一部工種で「片側交互通行」で工事を実施する予定です。

通行されるみなさまには、大変ご不便をおかけしますが、早期完成に向け、安全第一で取り組みますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

◆工事範囲

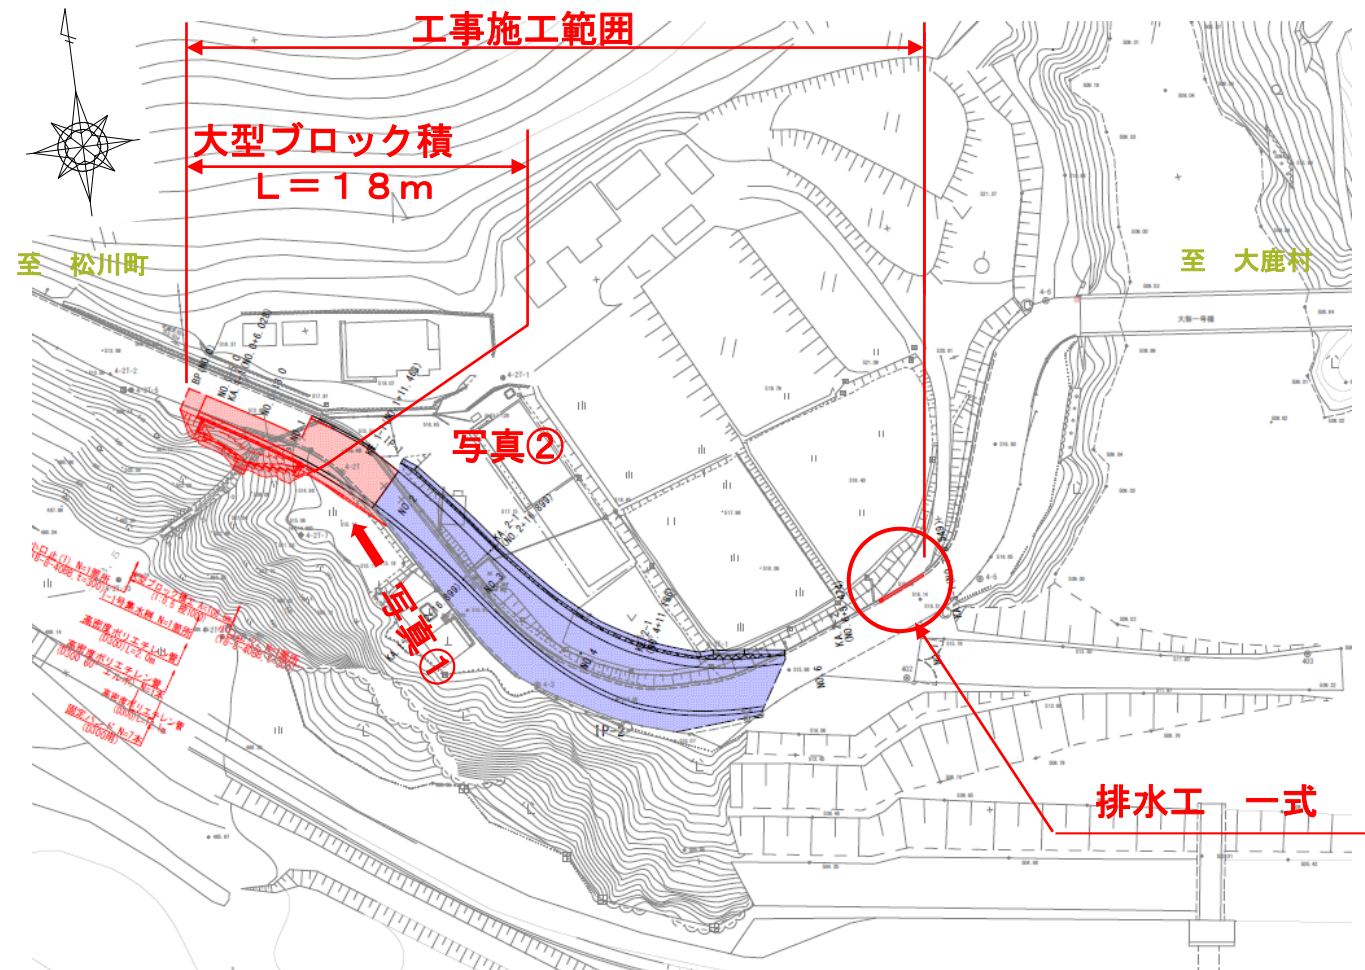

現地写真




(主) 松川インター大鹿線半の沢道路改築工事の進捗状況

資料 2 - 3



迂回路の設置について

- 半の沢橋を撤去するために、迂回路を設置します。
- 迂回路は、大型車同士がすれ違いできる幅を確保します。

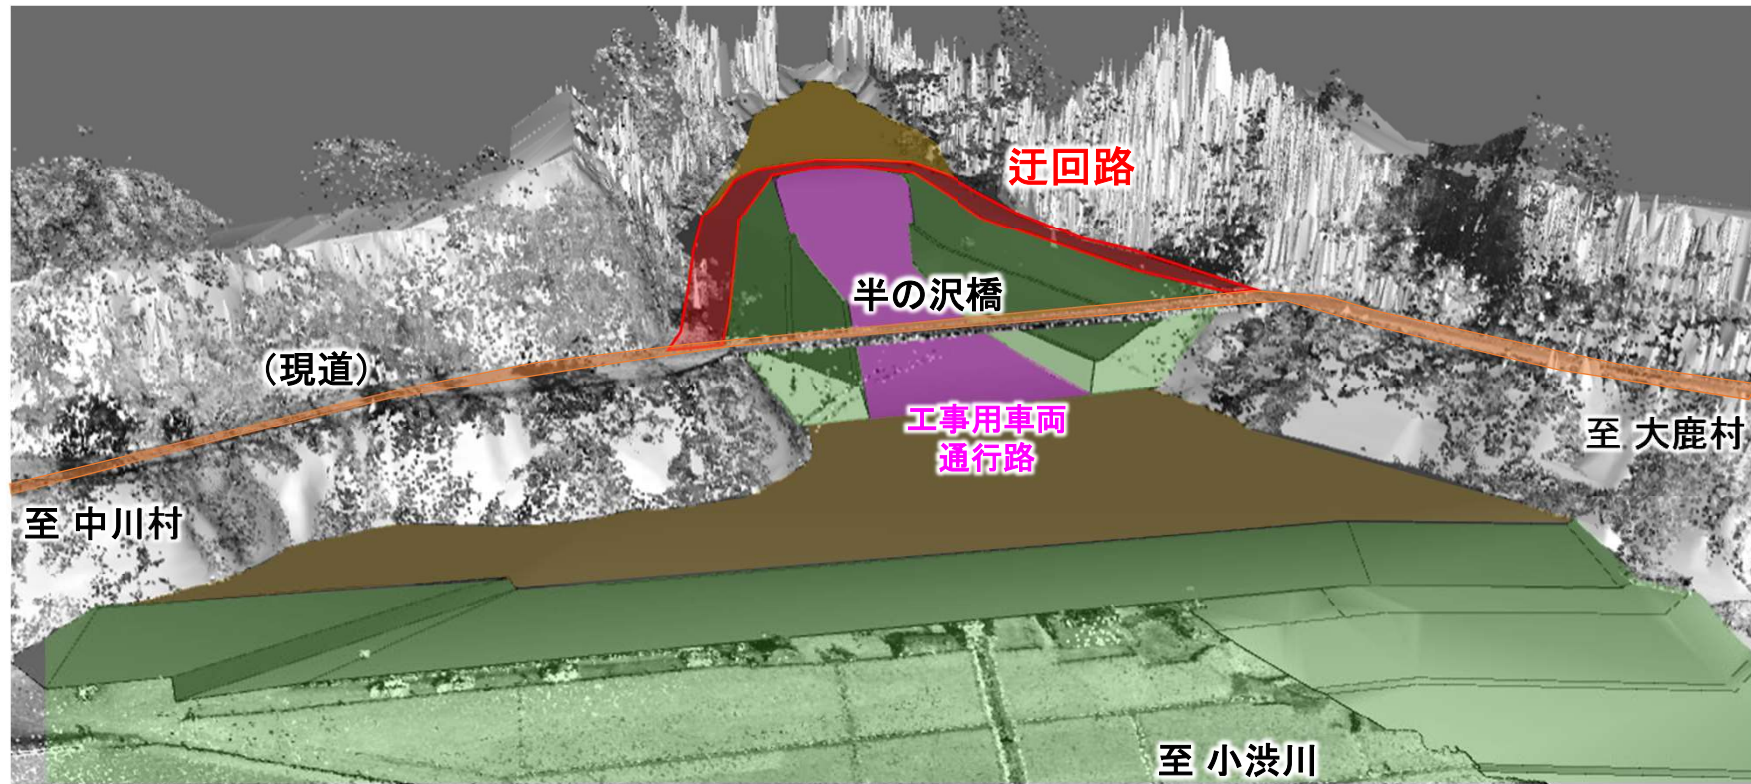


迂回路の使用期間: 令和8年度夏頃～令和9年度冬頃(予定)

(工事期間: 令和7年度秋頃～令和8年度夏頃)

(一) 北林飯島線 ・ (主) 伊那生田飯田線について

(第41回中川村リニア中央新幹線対策協議会)

資料 3
伊那建設事務所

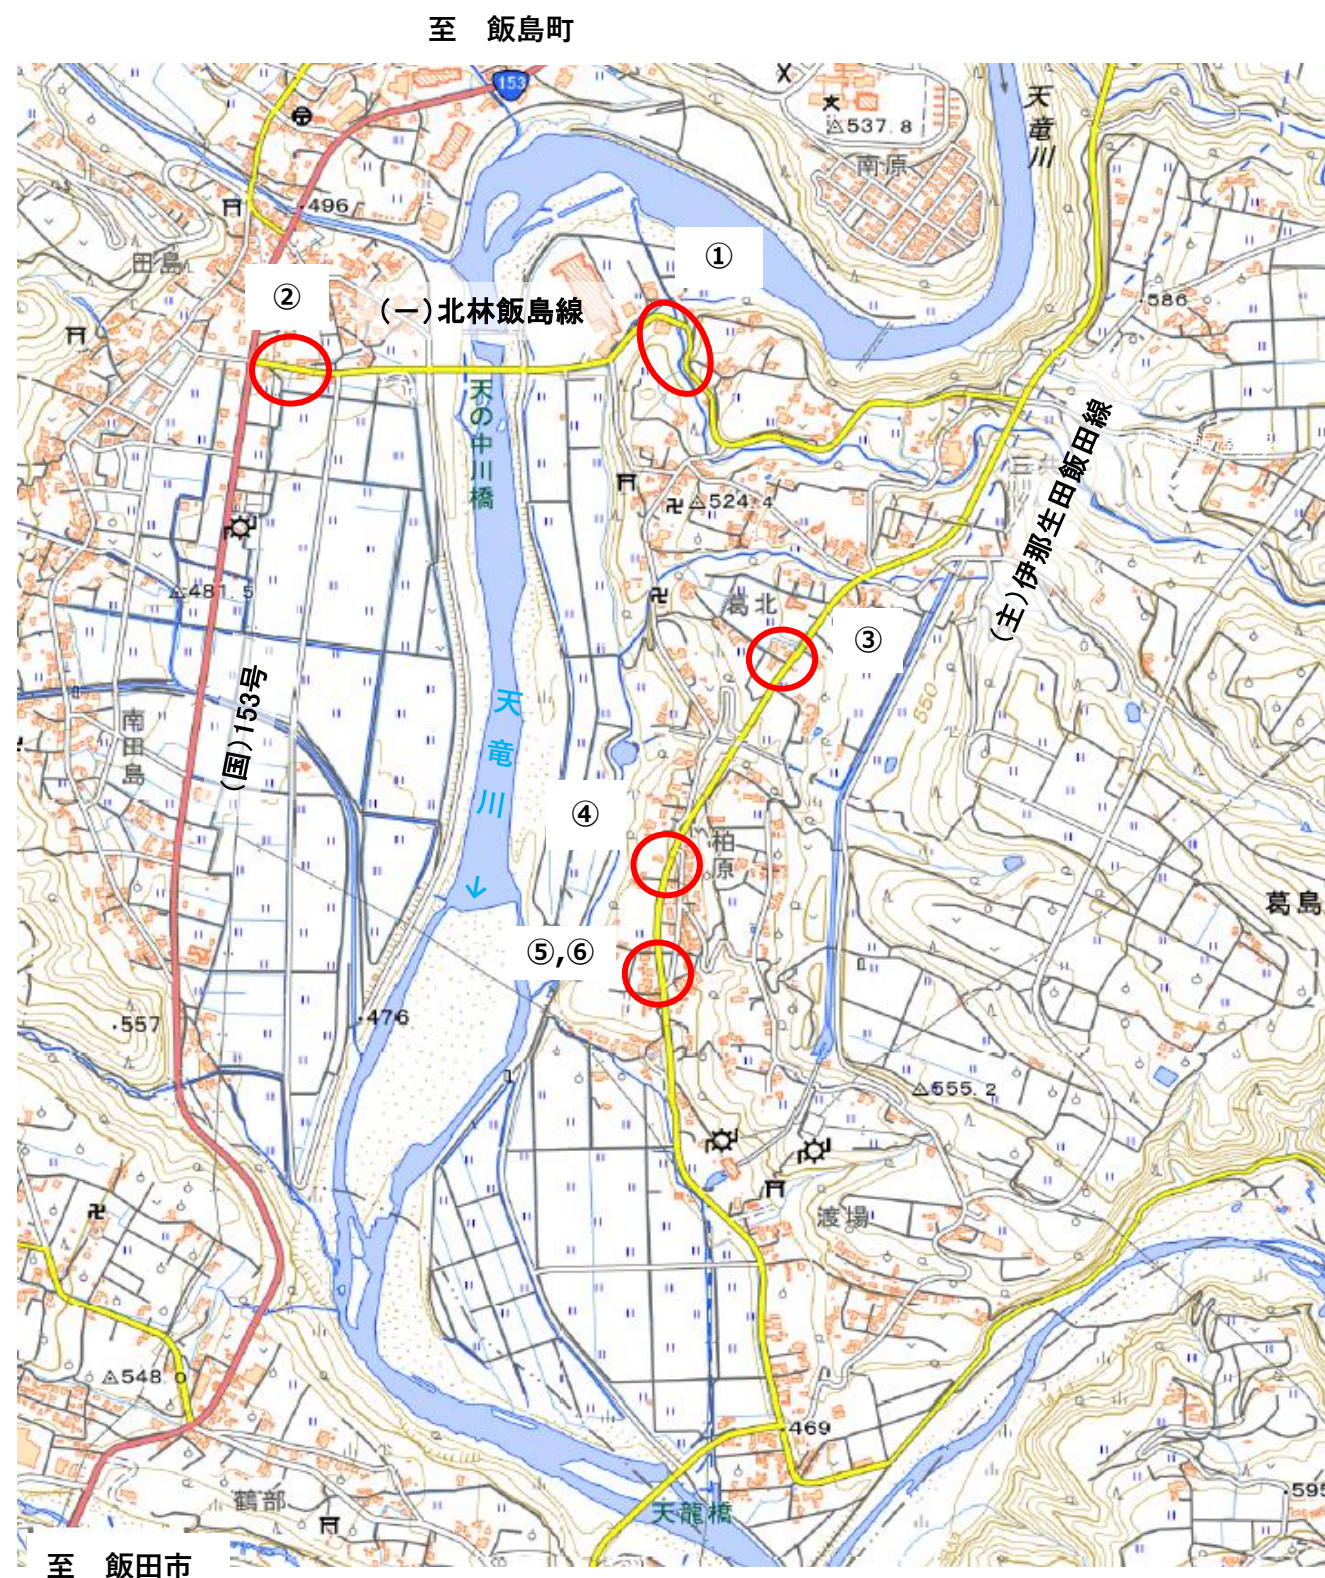

①北林飯島線 道路拡幅 (北林工区)



②北林飯島線 歩道整備 (田島工区)



③伊那生田飯田線 横断歩道の引き直し
R7.5月に駒ヶ根警察署にて実施済



④伊那生田飯田線 舗装修繕
R7.6月に中川村にて修繕済 (④～⑥)



⑤伊那生田飯田線 舗装修繕
R7.6月に中川村にて修繕済 (④～⑥)



⑥伊那生田飯田線 舗装修繕
R7.6月に中川村にて修繕済 (④～⑥)

