

第45回中川村リニア中央新幹線対策協議会 次第

令和8年6月16日(火) 午後7時00分

中川村役場基幹集落センター 集会室

1 開 会

2 あいさつ

3 協議事項

(1) JR東海工事関係・・・資料1

- ・大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ・工事用車両台数について
- ・渡場交差点付近における環境測定について
- ・その他

(2) 県道工事関係

- ・(主)松川インター大鹿線改良事業等について・・・資料2-1、2-2、2-3

- ・(一)県道北林飯島線・(主)伊那生田飯田線等について・・・資料3

4 その他

- ・視察検討について

5 閉 会

第45回 中川村リニア対策協議会 資料

令和8年(2026年)6月16日


東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)
中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体
中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体

- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

南アルプストンネル長野工区の工事状況

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

- 除山非常口から先進坑及び本坑を掘削しています。
- 小渋川非常口から本坑を掘削しています。

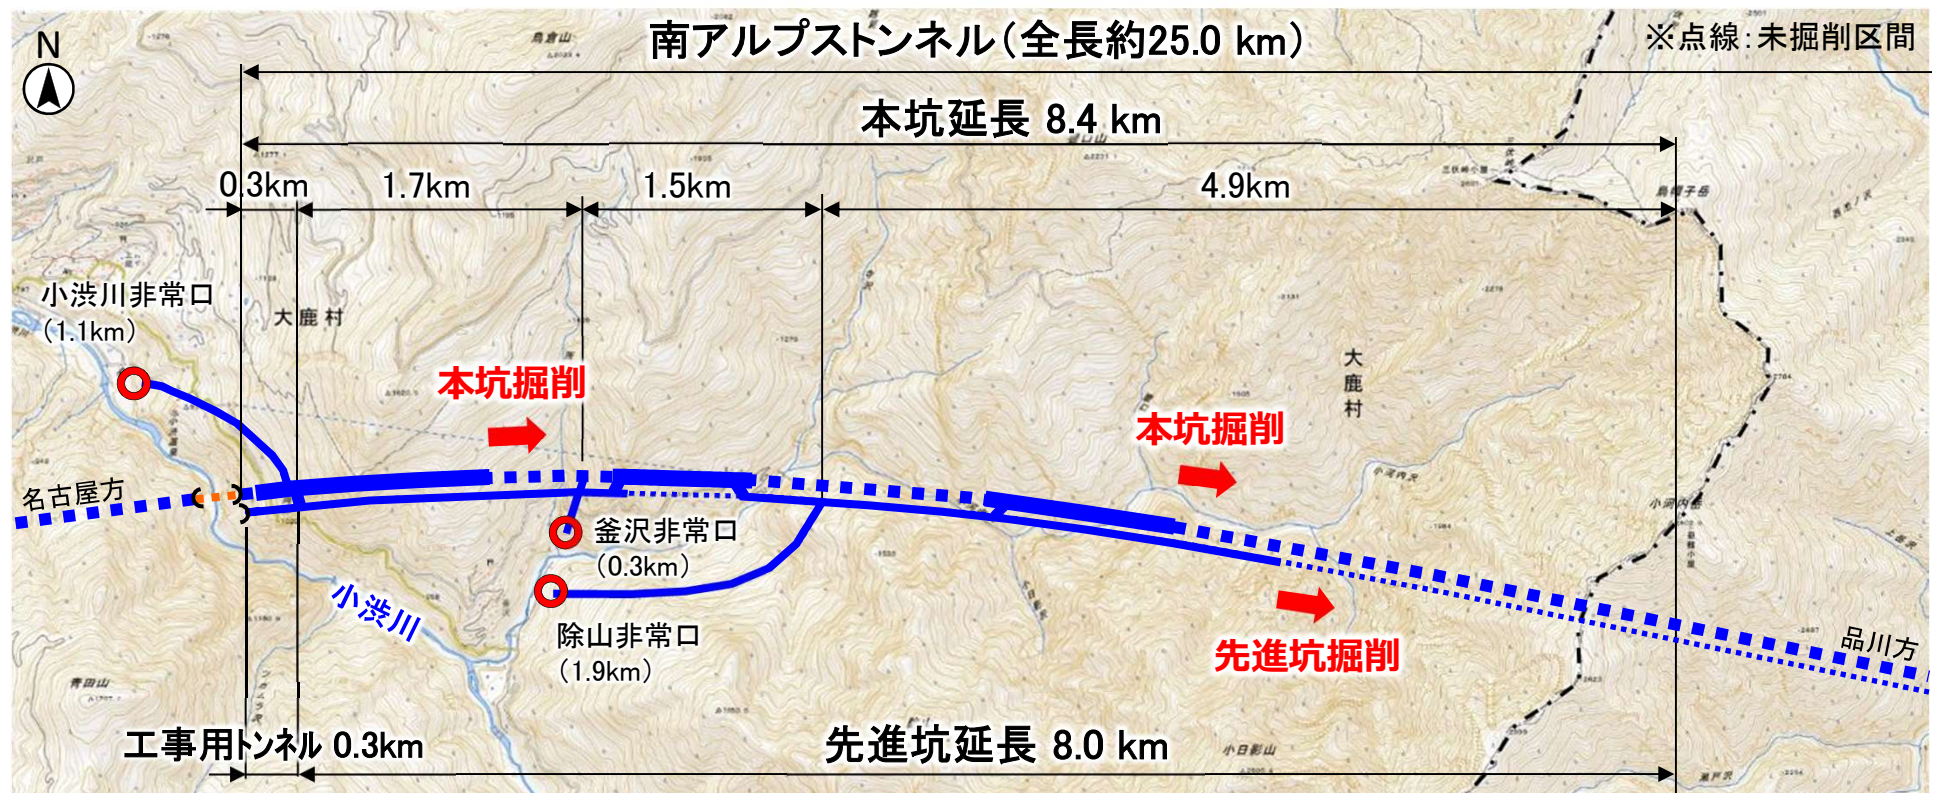

【凡例】

- 計画路線(トンネル区間)
- 計画路線(地上区間)
- 非常口トンネル・先進坑・工事用トンネル
- 非常口


工事進捗(掘削済延長)

非常口 : 約3.3km 完了
先進坑等 : 約5.2km / 8.3km
本坑 : 約3.2km / 8.4km

伊那山地トンネル青木川工区の工事状況

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

- 青木川非常口から本坑を掘削しています。

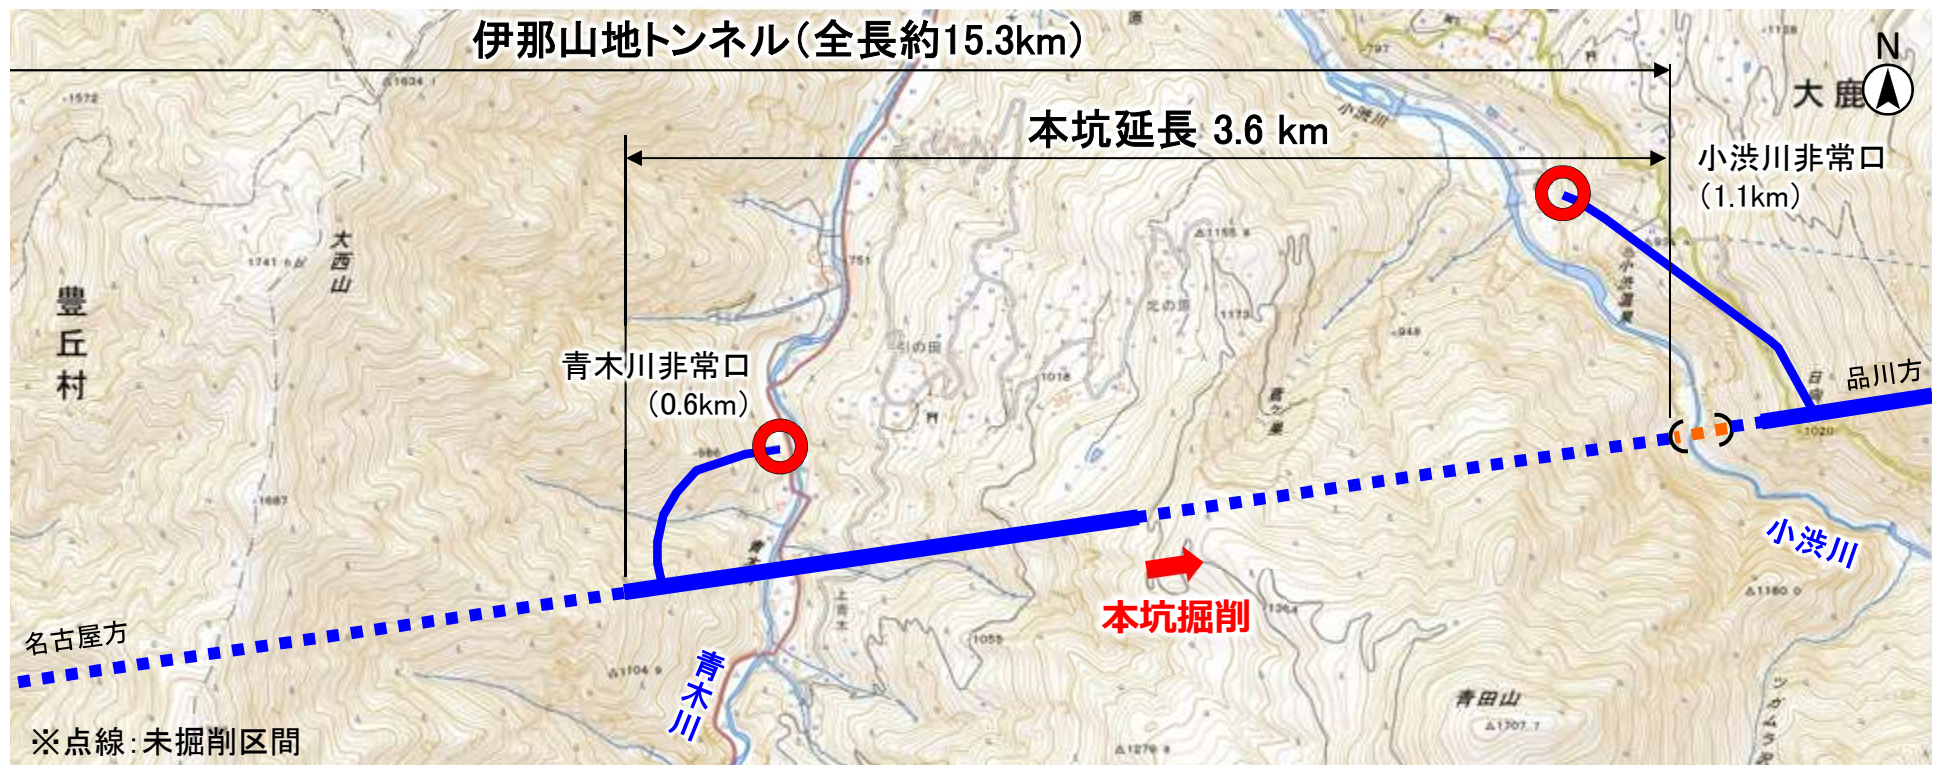

トンネル工事の状況

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

先進坑掘削状況(除山)



本坑掘削状況(除山)



本坑掘削状況(小渋川)



本坑掘削状況(青木川)



発生土仮置き場の状況

20260616 中川村
第45回対策協議会資料


- 発生土仮置き場B(三正坊)は、発生土の搬出がほぼ完了しています。
また、仮置き場の復旧について、大鹿村をはじめ関係者と協議を進めています。
- 発生土仮置き場E(小渋川変電所予定地)は、発生土の搬出入を行っています。
- 6月上旬に飯田市内(土曽川橋りょう)への要対策土運搬(2回目)が完了しました。



- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

通行台数実績(資機材運搬車両)


20260616 中川村
第45回対策協議会資料

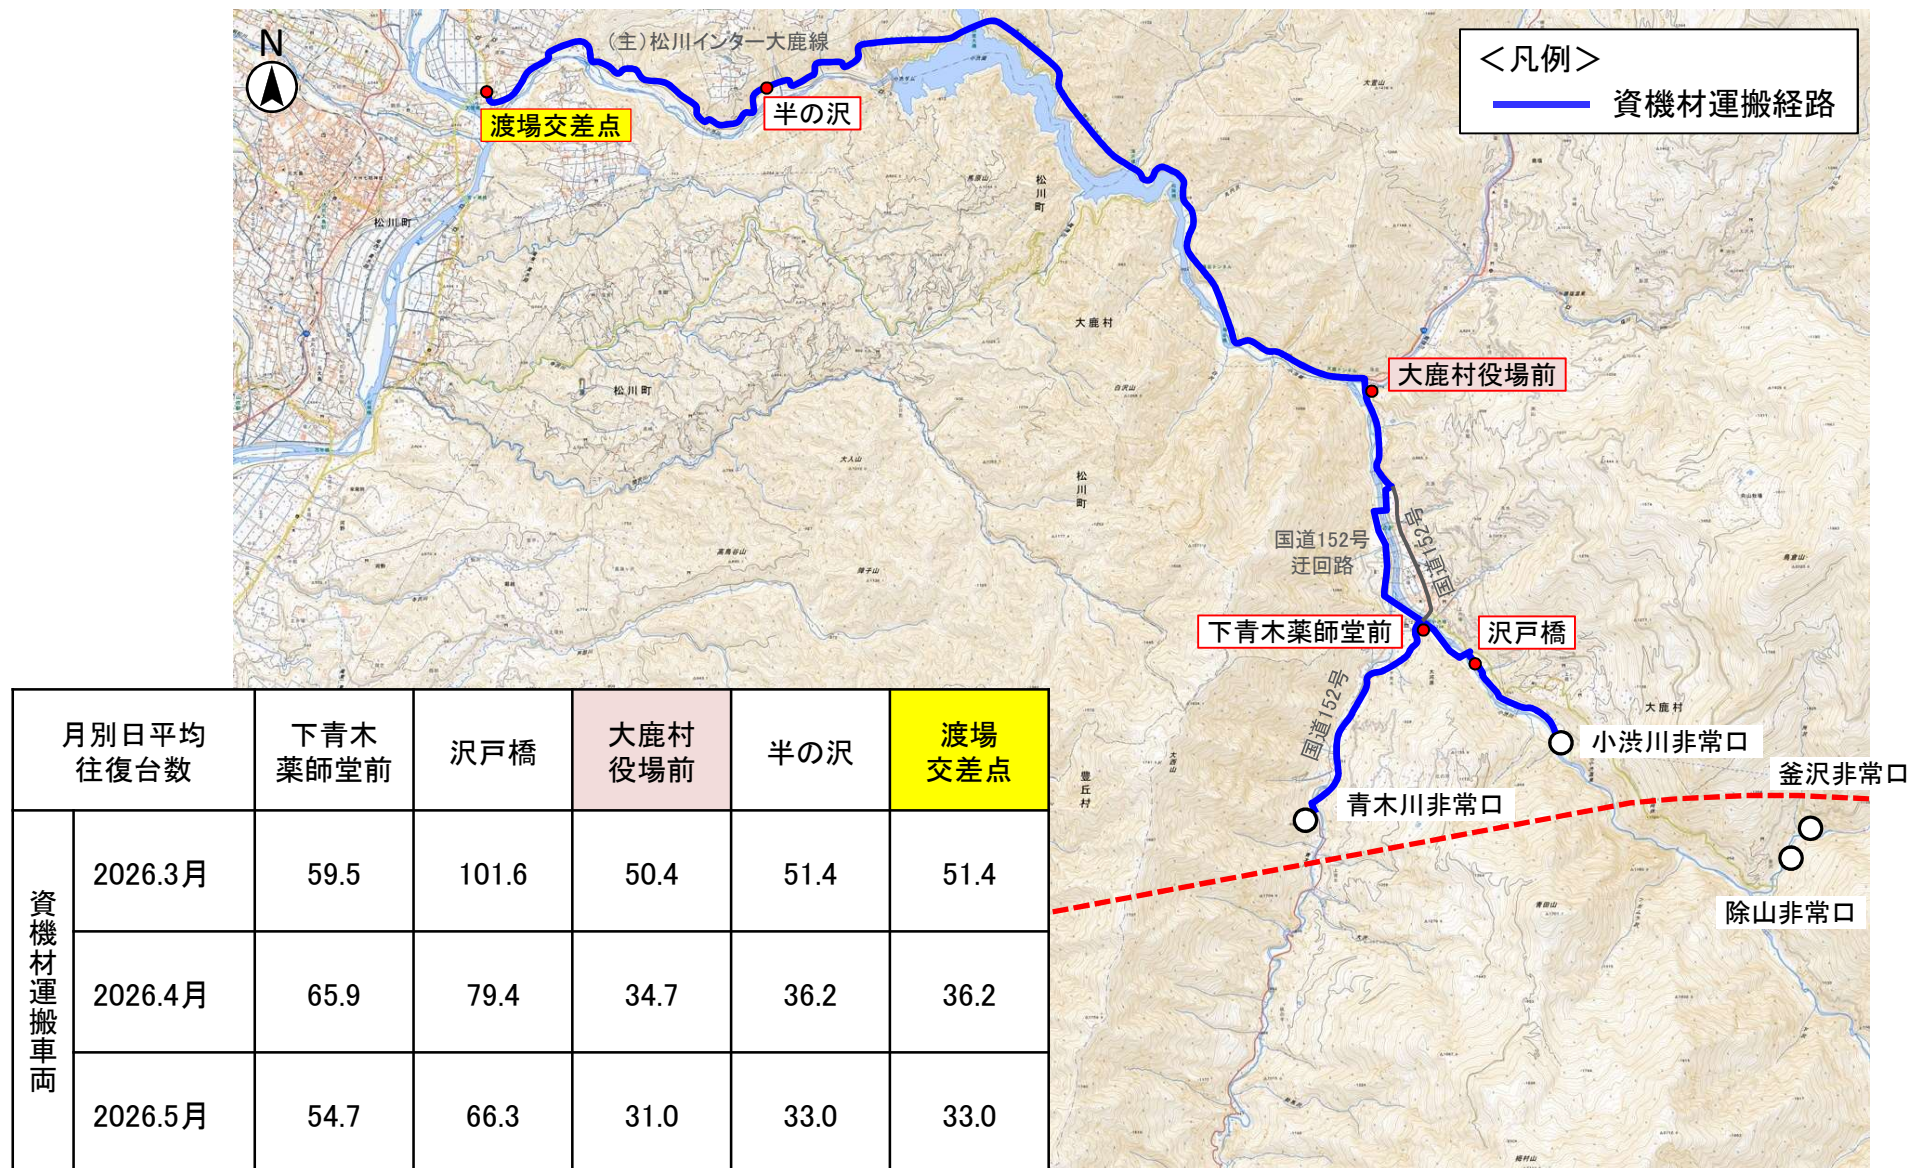

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

通行台数実績(発生土運搬車両)

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

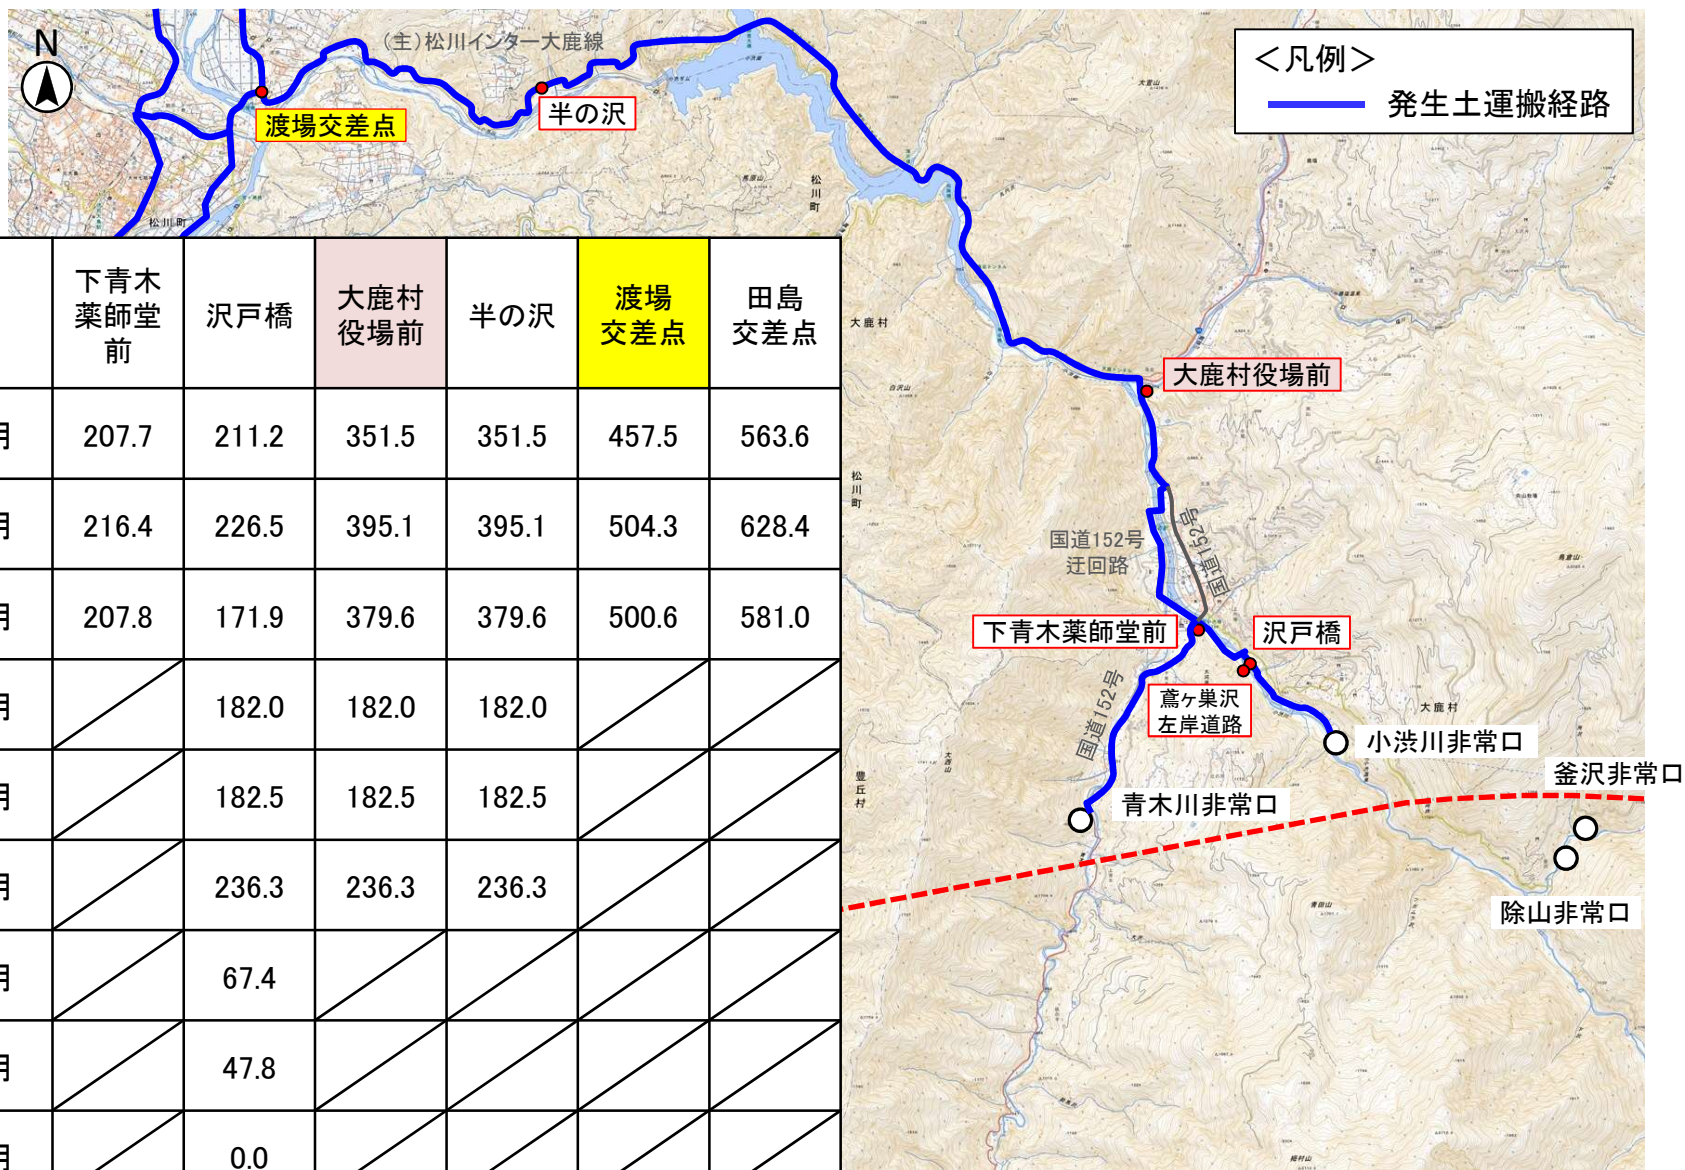

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

2026年度にかけての工事用車両運行計画

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

(発生土運搬先)	2026年				2027年
	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
小渋川変電所敷地造成(大鹿村)					
鳶ヶ巣沢環境対策事業(大鹿村)					
新宮川岸地区土地改良事業(駒ヶ根市)					
小和田地区基盤整備事業(中川村)					
前河原道路新設事業(松川町)					
半の沢道路改築事業(中川村)					
中央新幹線長野県駅新設工事(飯田市)					

※上記以外の運搬計画は、発生土活用先の計画が決定次第、随時お知らせしてまいります。

工事用車両通行台数の予定(渡場交差点)

20260616 中川村
第45回対策協議会資料


【往復台数】

		2026年7月		2026年8月		2026年9月	
		月別 日平均	日最大	月別 日平均	日最大	月別 日平均	日最大
資機材運搬		50	60	50	60	50	60
発生土運搬	新宮川岸地区土地改良事業 (駒ヶ根市中沢)	160	180	—	—	—	—
	小和田地区基盤整備事業 (中川村小和田)	370	400	410	460	410	460
	前河原道路新設事業 (松川町古町)	60	80	60	80	60	80
合計		640	720	520	600	520	600

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です。

発生土運搬ルートの舗装修繕について

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

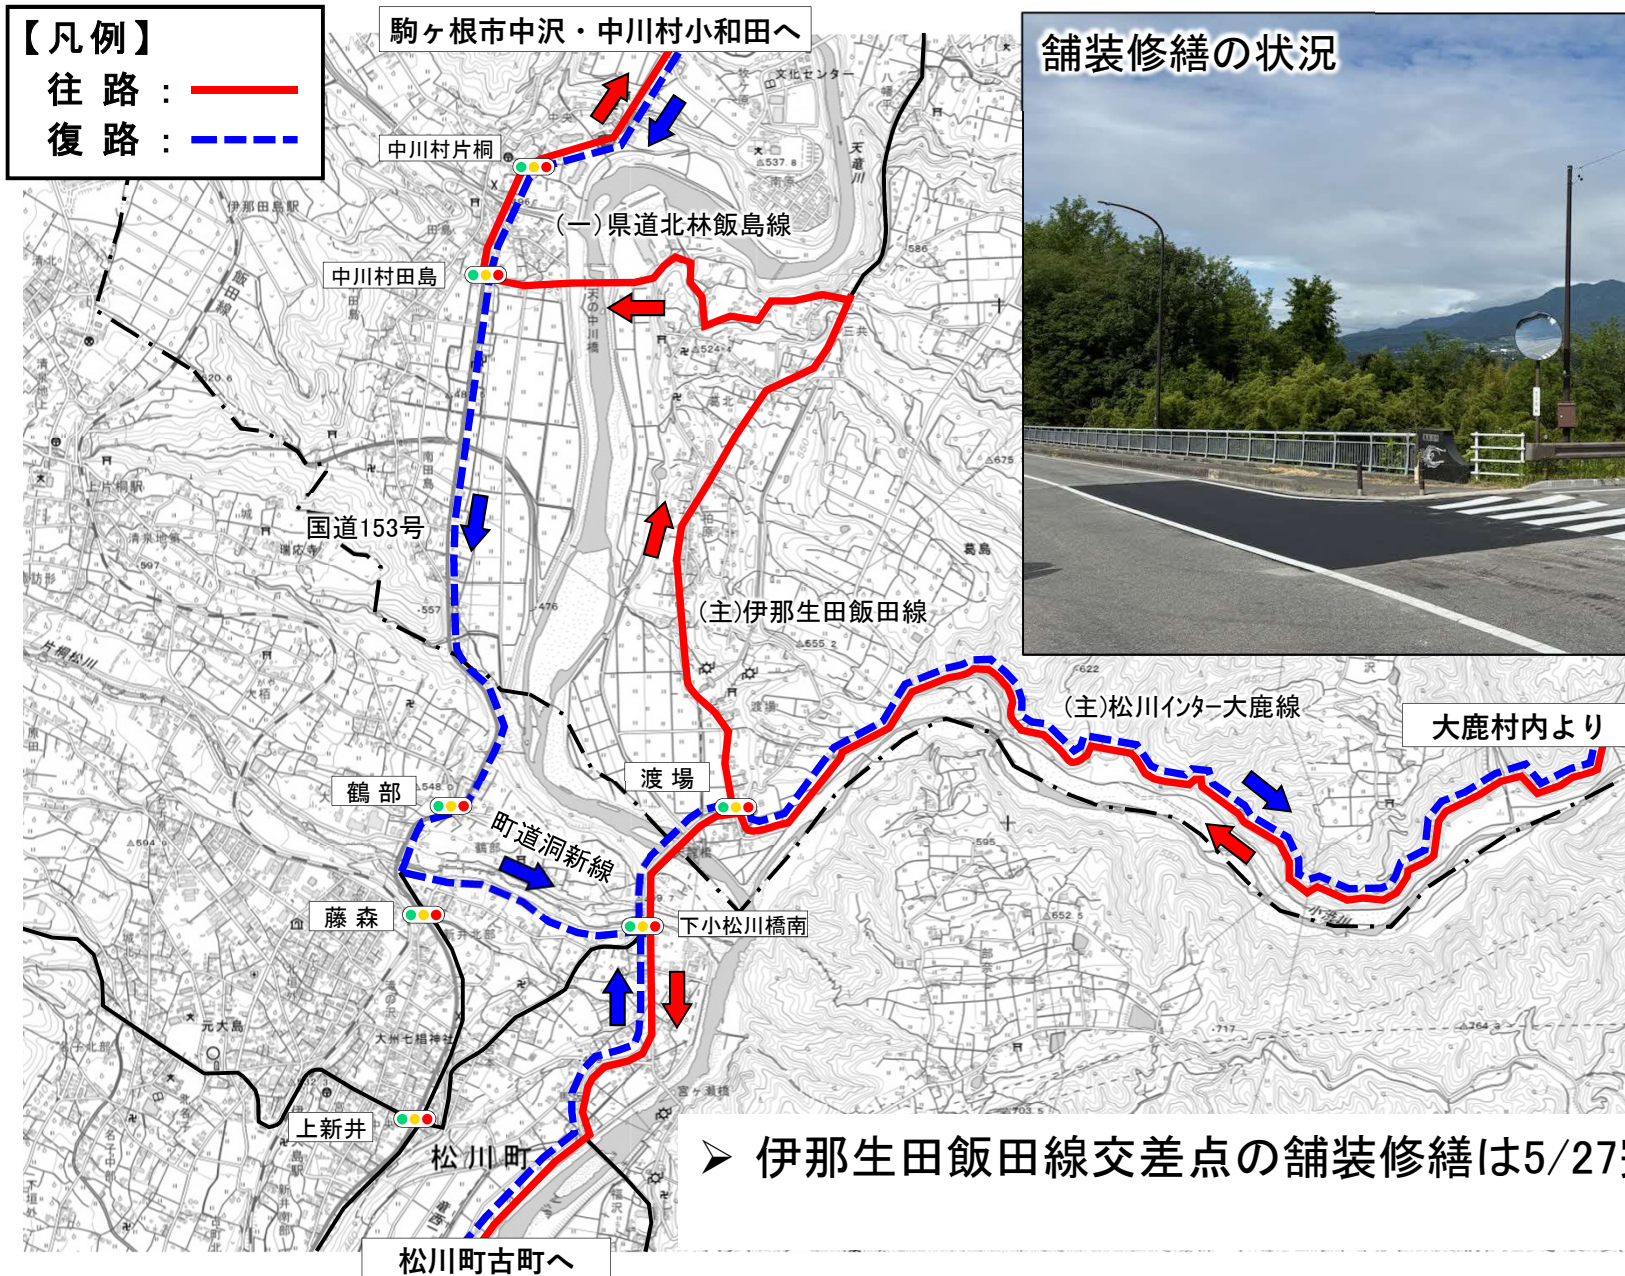

- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

環境測定について

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

○測定箇所


- ①渡場交差点
- ②県道伊那生田飯田線沿線

○測定項目

大気質、騒音、振動

○測定期間


- ①2018年11月から通年測定
- ②2024年6月から半年毎に1回測定

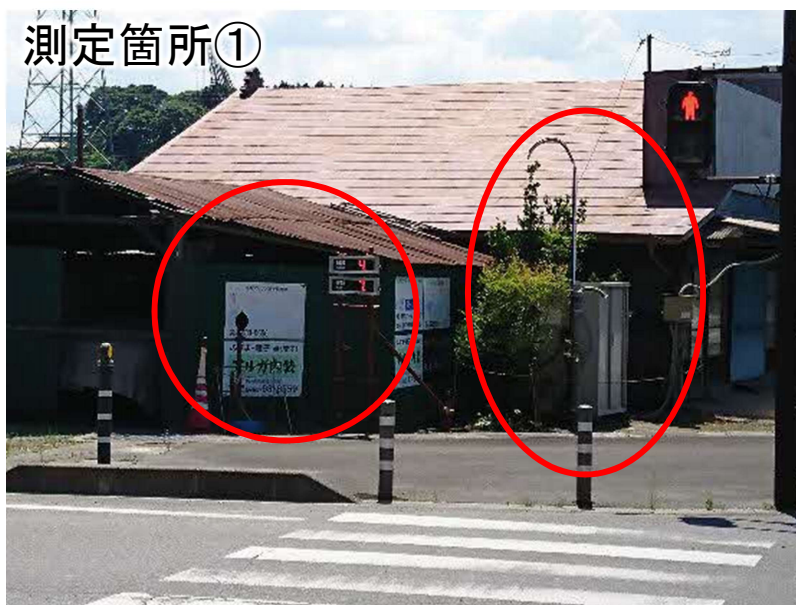


環境測定結果(渡場交差点)

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

二酸化窒素

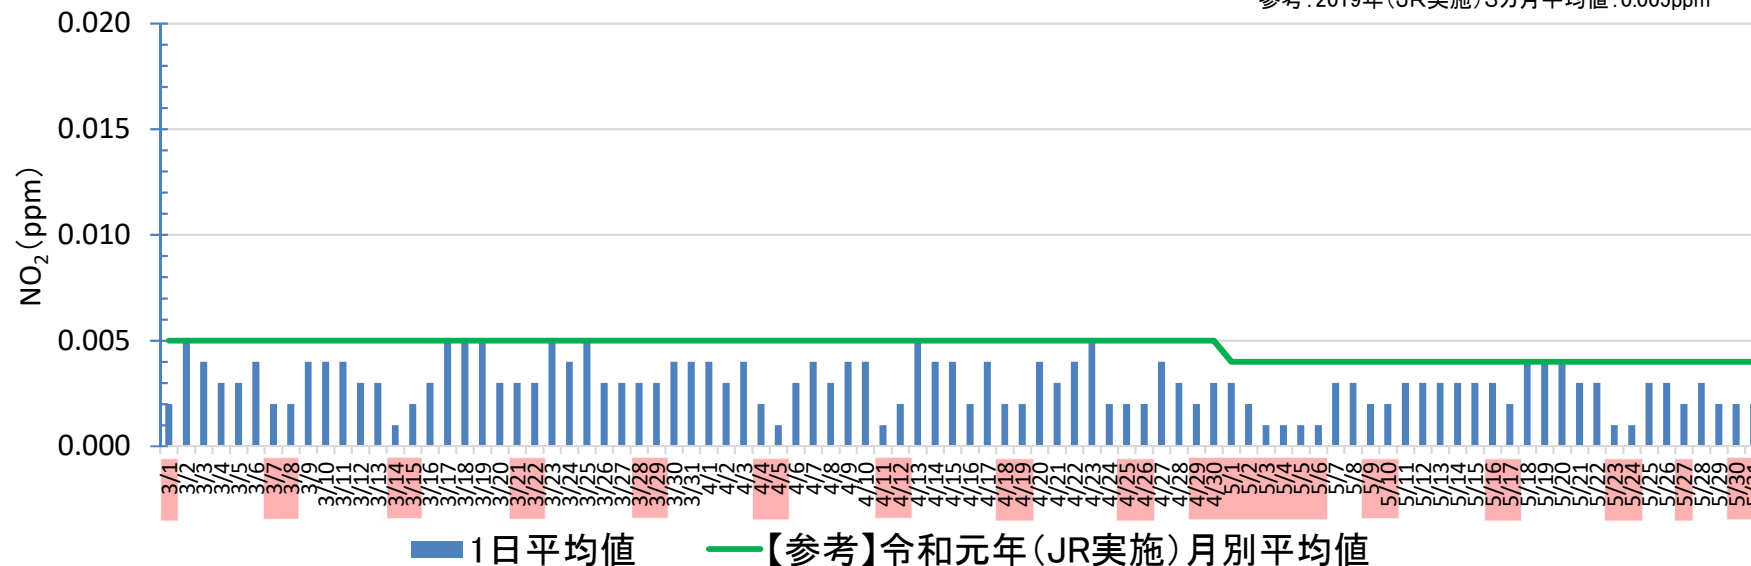


浮遊粒子状物質

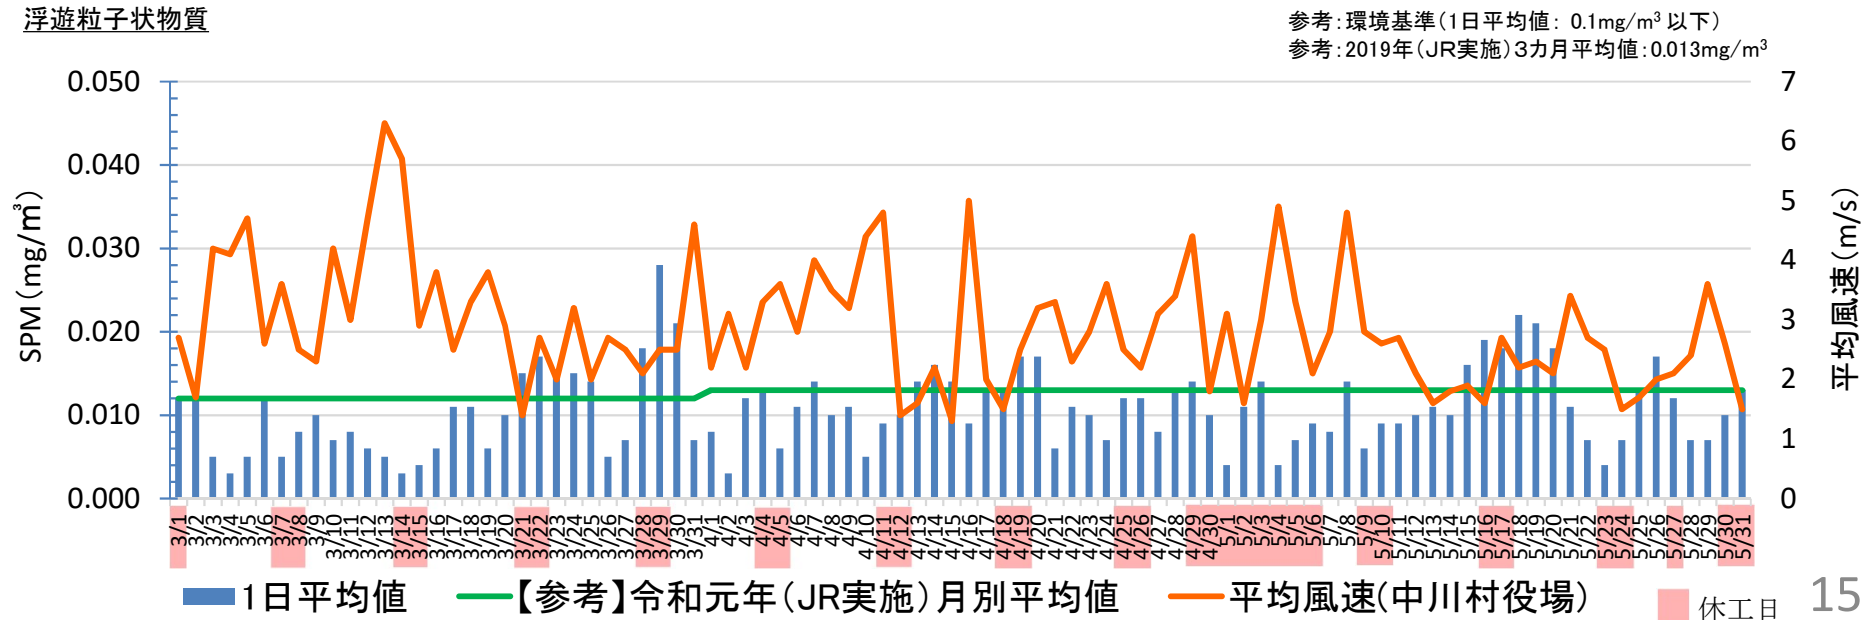


環境測定結果(渡場交差点)

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

騒音

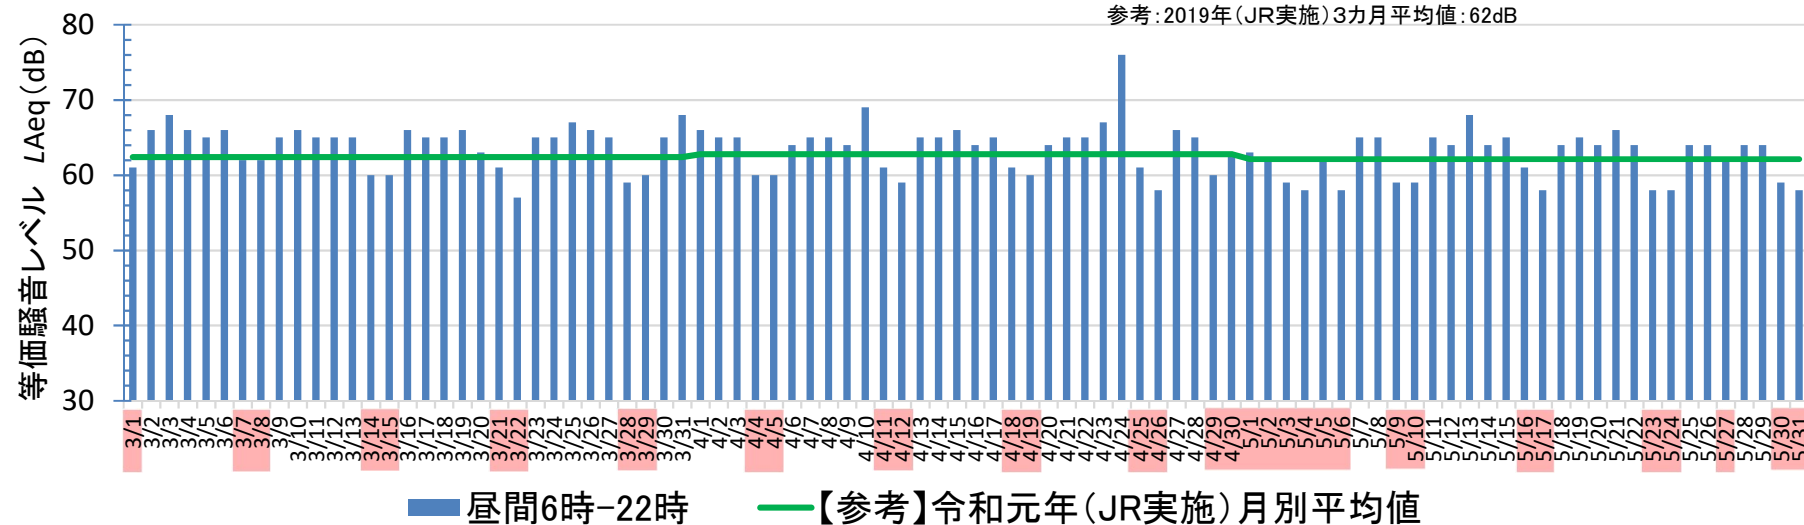

振動

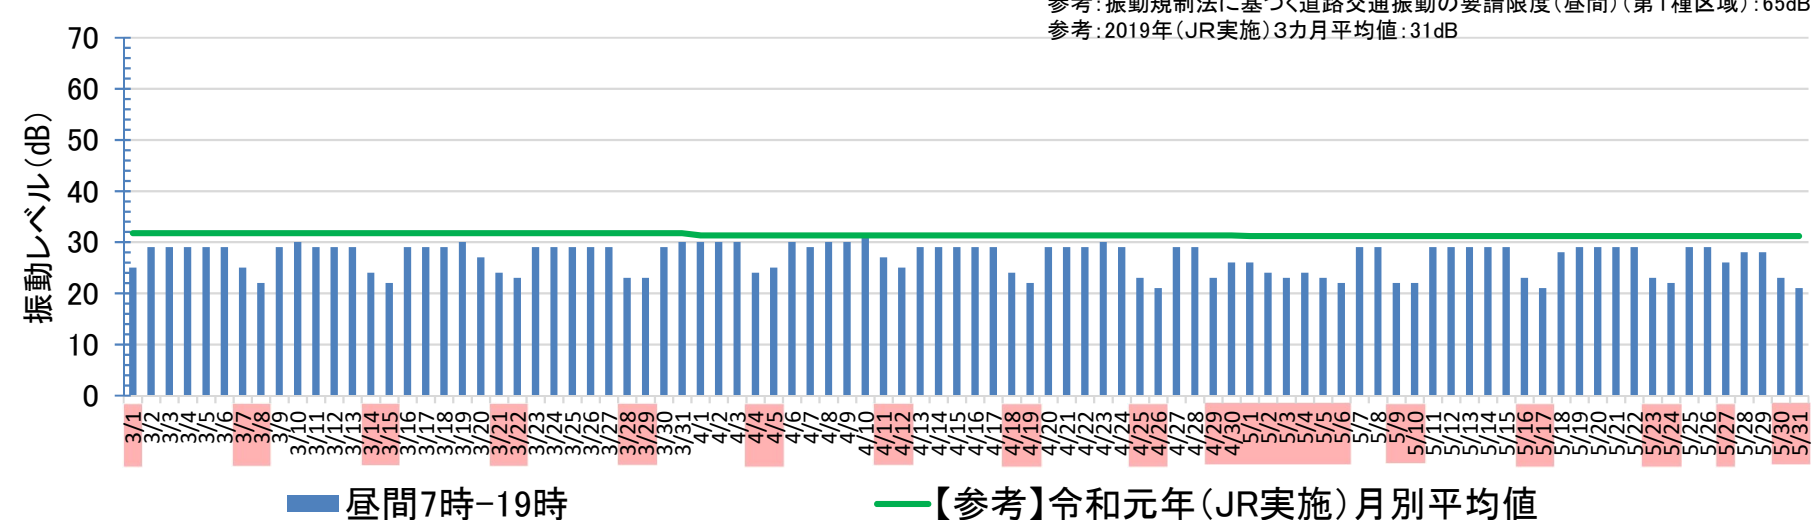


環境測定結果(渡場交差点)

20260616 中川村
第45回対策協議会資料


騒音

参考: 環境基準(夜間)(幹線交通を担う道路に近接する空間): 65dB以下
参考: 令和元年度(JR実施)3カ月平均値: 50dB

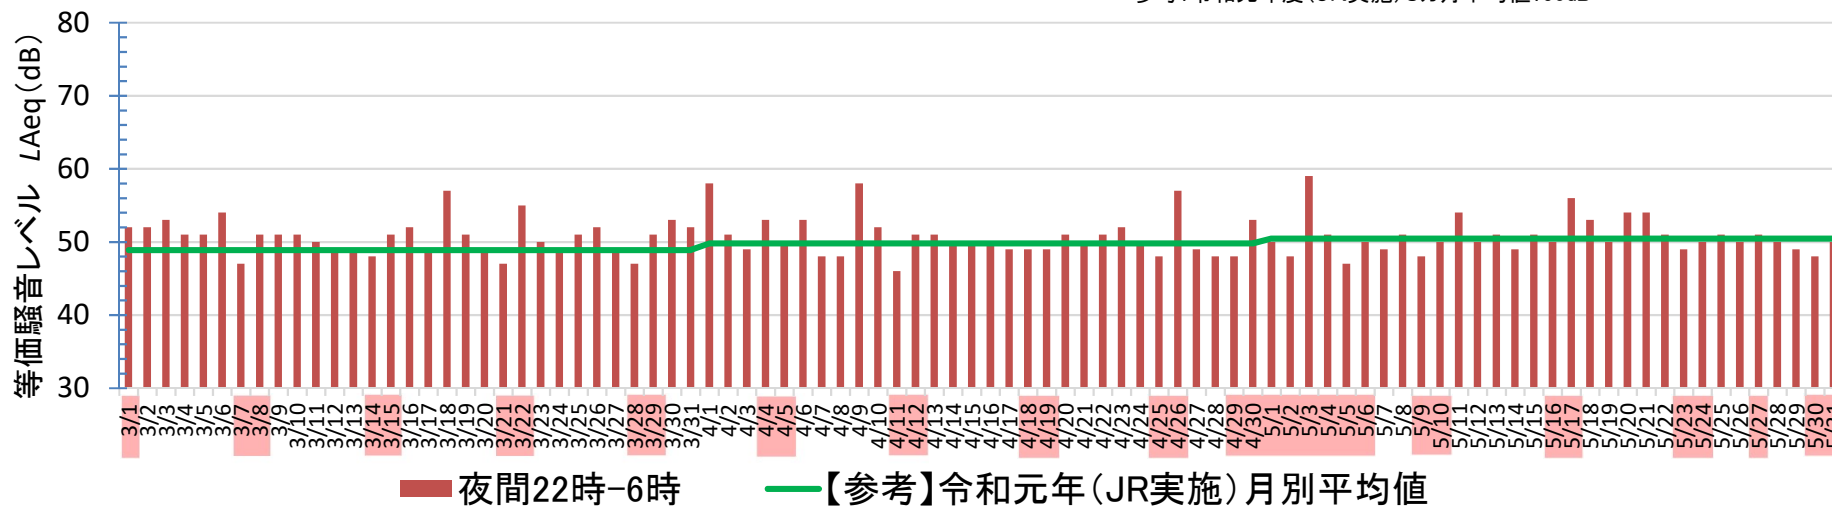

振動

参考: 振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度(夜間)(第1種区域): 60dB
参考: 令和元年度(JR実施)3カ月平均値: 32dB

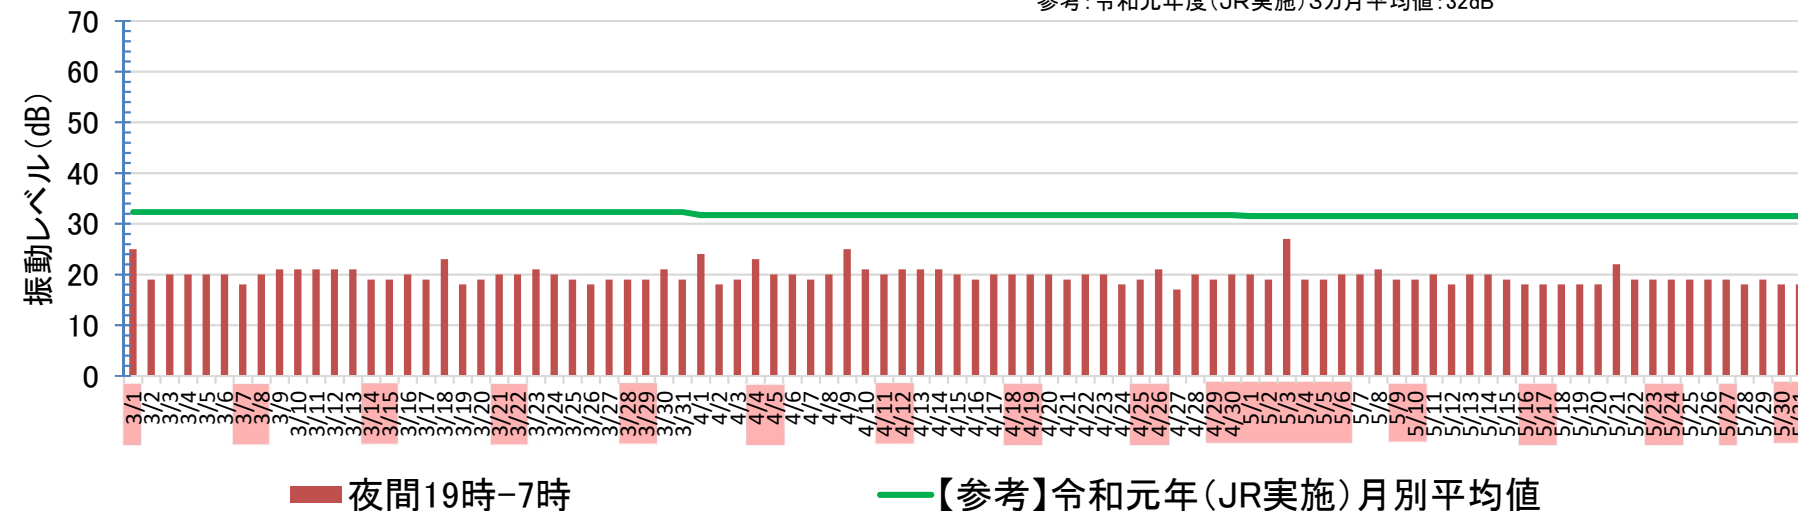


- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

特殊車両の夜間通行について

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

【(仮称)落合トンネル分岐部施工期間】

交通規制に対応するために、平日の20時～翌5時あるいは土曜日・日曜日の21時～翌5時にも通行する可能性がありますので、ご理解とご協力をお願い致します。

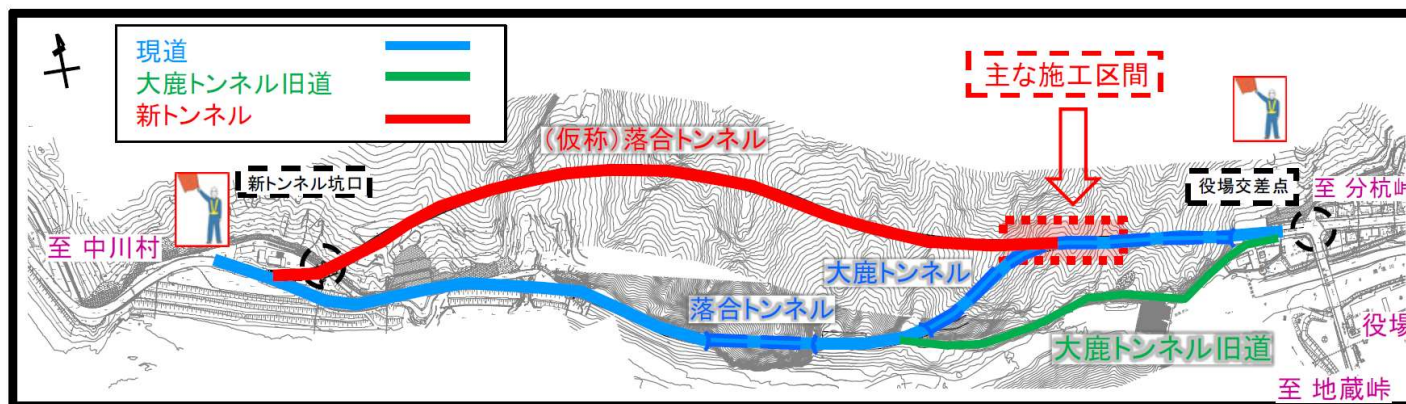

期 間 (予定) 主な作業内容	方 向	昼 間(5時～20時)		夜 間(20時～翌5時)	
		晴 天 時	大 雨 時	晴 天 時	大 雨 時
令和8年 6月5日(金)朝 ～令和9年1月末 トンネル分岐部施工	中川村→大鹿村	新トンネルを通行	新トンネルを通行 ※工事区間は 片側交互通行	大鹿トンネル旧道を 通行 ※片側交互通行	新トンネルを通行 ※工事区間は 片側交互通行
	大鹿村→中川村	大鹿トンネル旧道を 通行			

交通規制の概要(長野県資料より抜粋)

『いいだ リニア展望台』の開設について

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

- この度、長野県駅(仮称)をはじめとして、天竜川周辺のリニア中央新幹線の工事現場を一望できる『いいだ リニア展望台』を開設しました。
- 開園日等の詳細は、当社HP「長野工事事務所のお知らせ」をご確認ください。



展望台のお知らせ
(JR東海ホームページ)



工事カレンダー・お問い合わせ先

20260616 中川村
第45回対策協議会資料

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」を参照ください。
- トンネル坑内やヤードでの作業は、日曜日にも実施することがあります。

【お問い合わせ先】

JR東海	東海旅客鉄道(株) 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室) (住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原381-1 (電話)0265-39-2975
南ア(長野工区) 鹿島建設・飛島建設・フジタJV	中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2656-3 (電話)0265-39-1071
伊那山地(青木川工区) 飛島建設・奥村組土木興業JV	中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡大鹿村大河原1355-5 (電話)0265-39-1851

※ 受付日時：土・日・祝日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く平日の9時～17時

工事カレンダー（伊那山地トンネル(青木川工区)、南アルプストンネル(長野工区)）

2026年																																																											
1月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	2月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	3月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	4月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	5月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	6月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	7月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	8月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	9月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	10月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	11月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	12月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬
1/1 元旦	木				2/1	日				3/1	日				4/1	水				5/1	金				6/1	月				7/1	水				8/1	土				9/1	火				10/1	木				11/1	日				12/1	火			
1/2	金				2/2	月				3/2	月				4/2	木				5/2	土				6/2	火				7/2	木				8/2	日				9/2	水				10/2	金				11/2	月				12/2	水			
1/3	土				2/3	火				3/3	火				4/3	金				5/3 憲法記念日	日				6/3	水				7/3	金				8/3	月				9/3	木				10/3	土				11/3 文化の日	火				12/3	木			
1/4	日				2/4	水				3/4	水				4/4	土				5/4 みどりの日	月				6/4	木				7/4	土				8/4	火				9/4	金				10/4	日				11/4	水				12/4	金			
1/5	月				2/5	木				3/5	木				4/5	日				5/5 こどもの日	火				6/5	金				7/5	日				8/5	水				9/5	土				10/5	月				11/5	木				12/5	土			
1/6	火				2/6	金				3/6	金				4/6	月				5/6 振替休日	水				6/6	土				7/6	月				8/6	木				9/6	日				10/6	火				11/6	金				12/6	日			
1/7	水				2/7	土				3/7	土				4/7	火				5/7	木				6/7	日				7/7	火				8/7	金				9/7	月				10/7	水				11/7	土				12/7	月			
1/8	木				2/8	日				3/8	日				4/8	水				5/8	金				6/8	月				7/8	水				8/8	土				9/8	火				10/8	木				11/8	日				12/8	火			
1/9	金				2/9	月				3/9	月				4/9	木				5/9	土				6/9	火				7/9	木				8/9	日				9/9	水				10/9	金				11/9	月				12/9	水			
1/10	土				2/10	火				3/10	火				4/10	金				5/10	日				6/10	水				7/10	金				8/10	月				9/10	木				10/10	土				11/10	火				12/10	木			
1/11	日				2/11 建国記念の日	水				3/11	水				4/11	土				5/11	月				6/11	木				7/11	土				8/11 山の日	火				9/11	金				10/11	日				11/11	水				12/11	金			
1/12 成人の日	月				2/12	木				3/12	木				4/12	日				5/12	火				6/12	金				7/12	日				8/12	水				9/12	土				10/12 スポーツの日	月				11/12	木				12/12	土			
1/13	火				2/13	金				3/13	金				4/13	月				5/13	水				6/13	土				7/13	月				8/13	木				9/13	日				10/13	火				11/13	金				12/13	日			
1/14	水				2/14	土				3/14	土				4/14	火				5/14	木				6/14	日				7/14	火				8/14	金				9/14	月				10/14	水				11/14	土				12/14	月			
1/15	木				2/15	日				3/15	日				4/15	水				5/15	金				6/15	月				7/15	水				8/15	土				9/15	火				10/15	木				11/15	日				12/15	火			
1/16	金				2/16	月				3/16	月				4/16	木				5/16	土				6/16	火				7/16	木				8/16	日				9/16	水				10/16	金				11/16	月				12/16	水			
1/17	土				2/17	火				3/17	火				4/17	金				5/17	日				6/17	水				7/17	金				8/17	月				9/17	木				10/17	土				11/17	火				12/17	木			
1/18	日				2/18	水				3/18	水				4/18	土				5/18	月				6/18	木				7/18	土				8/18	火				9/18	金				10/18	日				11/18	水				12/18	金			
1/19	月				2/19	木				3/19	木				4/19	日				5/19	火				6/19	金				7/19	日				8/19	水				9/19	土				10/19	月				11/19	木				12/19	土			
1/20	火				2/20	金				3/20 春分の日	金				4/20	月				5/20	水				6/20	土				7/20 海の日	月				8/20	木				9/20	日				10/20	火				11/20	金				12/20	日			
1/21	水				2/21	土				3/21	土				4/21	火				5/21	木				6/21	日				7/21	火				8/21	金				9/21 敬老の日	月				10/21	水				11/21	土				12/21	月			
1/22	木				2/22	日				3/22	日				4/22	水				5/22	金				6/22	月				7/22	水				8/22	土				9/22 国民の休日	火				10/22	木				11/22	日				12/22	火			
1/23	金				2/23 天皇誕生日	月				3/23	月				4/23	木				5/23	土				6/23	火				7/23	木				8/23	日				9/23 秋分の日	水				10/23	金				11/23 勤労感謝の日	月				12/23	水			
1/24	土				2/24	火				3/24	火				4/24	金				5/24	日				6/24	水				7/24	金				8/24	月				9/24	木				10/24	土				11/24	火				12/24	木			
1/25	日				2/25	水				3/25	水				4/25	土				5/25	月				6/25	木				7/25	土				8/25	火				9/25	金				10/25	日				11/25	水				12/25	金			
1/26	月				2/26	木				3/26	木				4/26	日				5/26	火				6/26	金				7/26	日				8/26	水				9/26	土				10/26	月				11/26	木				12/26	土			
1/27	火				2/27	金				3/27	金				4/27	月				5/27	水				6/27	土				7/27	月				8/27	木				9/27	日				10/27	火				11/27	金				12/27	日			
1/28	水				2/28	土				3/28	土				4/28	火				5/28	木				6/28	日				7/28	火				8/28	金				9/28	月				10/28	水				11/28	土				12/28	月			
1/29	木									3/29	日				4/29 昭和の日	水				5/29	金				6/29	月				7/29	水				8/29	土				9/29	火				10/29	木				11/29	日				12/29	火			
1/30	金									3/30	月				4/30	木				5/30																																							

<凡例>



… トンネル掘削および関連工事、明かり工事



… 場内作業のみ(大型工事用車両の通行:10台/日・往復以下程度) ※場内作業とは、トンネル坑内やヤード内での調査、機械設備の設置・撤去・保守点検作業等



… 休工日(発生土運搬については、県道59号線の通行が無いことを表しています)
※1月～3月、12月の土曜日については、平日の天候次第で運搬する可能性があります



… 前回協議会資料からの変更箇所

※通勤通学等の時間帯は、通行台数を調整するよう努めます。

※上記工事予定以外の日時(休工日含む)に作業を行う場合には、関係する住民の方々へお知らせします。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～5時の時間帯に運搬することを考えています。

主要地方道松川インター大鹿線道路改良工事 位置図

令和8年6月16日資料
長野県飯田建設事務所

資料2-1

事業概要

●実施中の事業

- ①道路改良事業: 葛島 測量設計、関係機関協議
- ②道路改良事業: 二軒屋 関係機関協議、松川町側道路拡幅工事完了
- ③道路改良事業: 半の沢 盛土造成工事
- ④防災対策事業: 四徳大橋西 本工事(R8年度後半着手予定)
- ⑤トンネル事業: 落合トンネル トンネル工事

○その他工事

- ・修繕工事(橋梁補修): こいけどう橋(R8.7月頃予定・交通規制なし)
- ・松除3号橋(R8.秋頃・舗装打換えあり)

○主要地方道松川インター大鹿線道路拡幅工事に関する基本協定書(H28.6.2)に基づく工事

- ・区間1: 道路拡幅工 L=295.3m 令和3年9月27日供用開始
- ・区間2: 道路拡幅工 L=118.8m 令和3年6月21日供用開始
- ・区間3: 道路拡幅工 L=183.0m 令和3年8月31日供用開始
- ・区間4: 道路拡幅工 L=230.7m 令和3年9月27日供用開始
- ・区間5: 道路拡幅工 L=244.0m 平成31年3月28日供用開始

○主要地方道松川インター大鹿線道路トンネル工事の施行に関する協定書(H28.3.14)に基づく工事

- ・西下トンネル: トンネルL=878m 平成30年12月15日供用開始
- ・東山トンネル: トンネルL=1,201m 平成31年3月28日供用開始



(主)松川インター大鹿線改良について 中川村 葛島

事業範囲（予定）

ブロック積擁壁工 盛土工



(主) 松川インター大鹿線

至 松川IC



至 松川IC



至 大鹿村

(一) 小渋川

至 大鹿村


- 1 河川側に盛土して、道路を拡幅する工事です。
- 2 今後、保安林解除申請の手続きを行う予定です。

※資料は、現時点での計画になります。
今後、協議等により、変更する可能性があります。

(主) 松川インター大鹿線半の沢道路改築工事に伴う迂回路について

- 半の沢橋の撤去に伴う、迂回路の使用を開始します。

迂回路の使用期間: 令和8年9月上旬～令和9年度冬頃(予定)

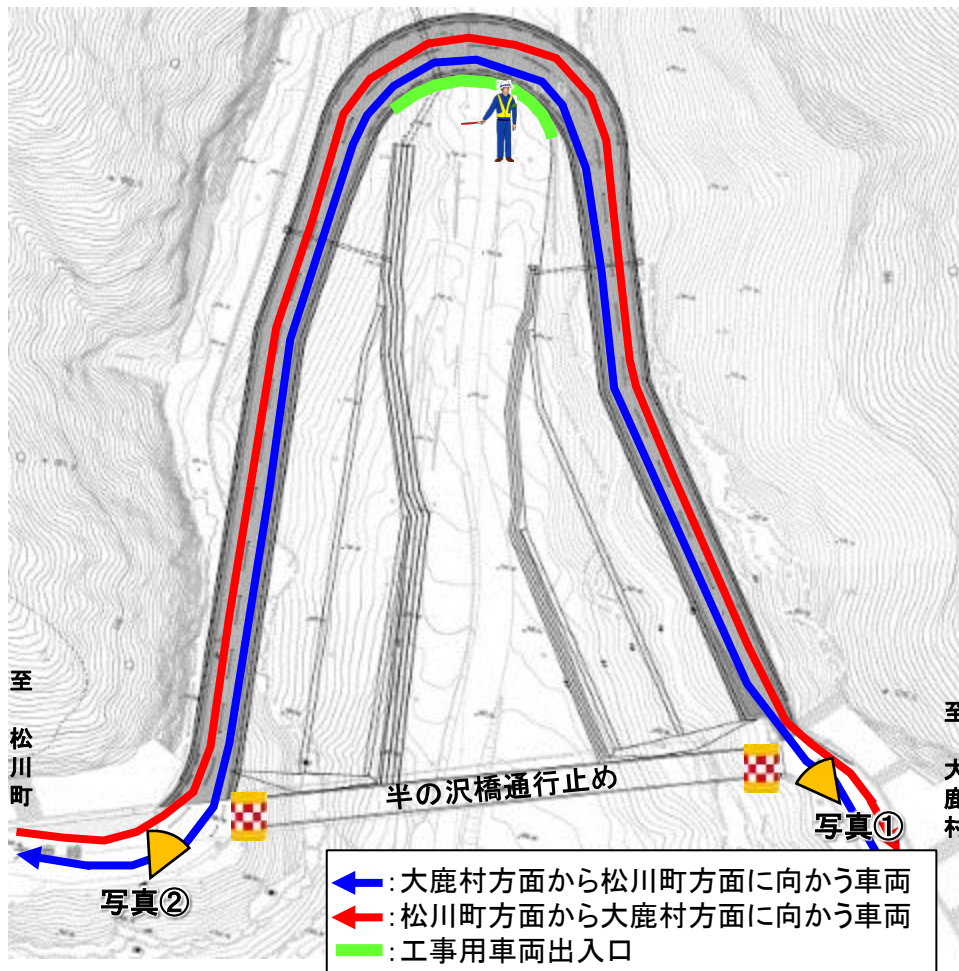


➤ 迂回路工事に伴う工事用車両出入口の変更と、一時的な交通規制を実施します。

交通誘導員や工事看板の案内による通行にご協力をお願いします。


①迂回路(大鹿村側)工事に伴う工事用車両出入口の変更

出入口変更期間: 令和8年6月中旬～令和8年7月上旬

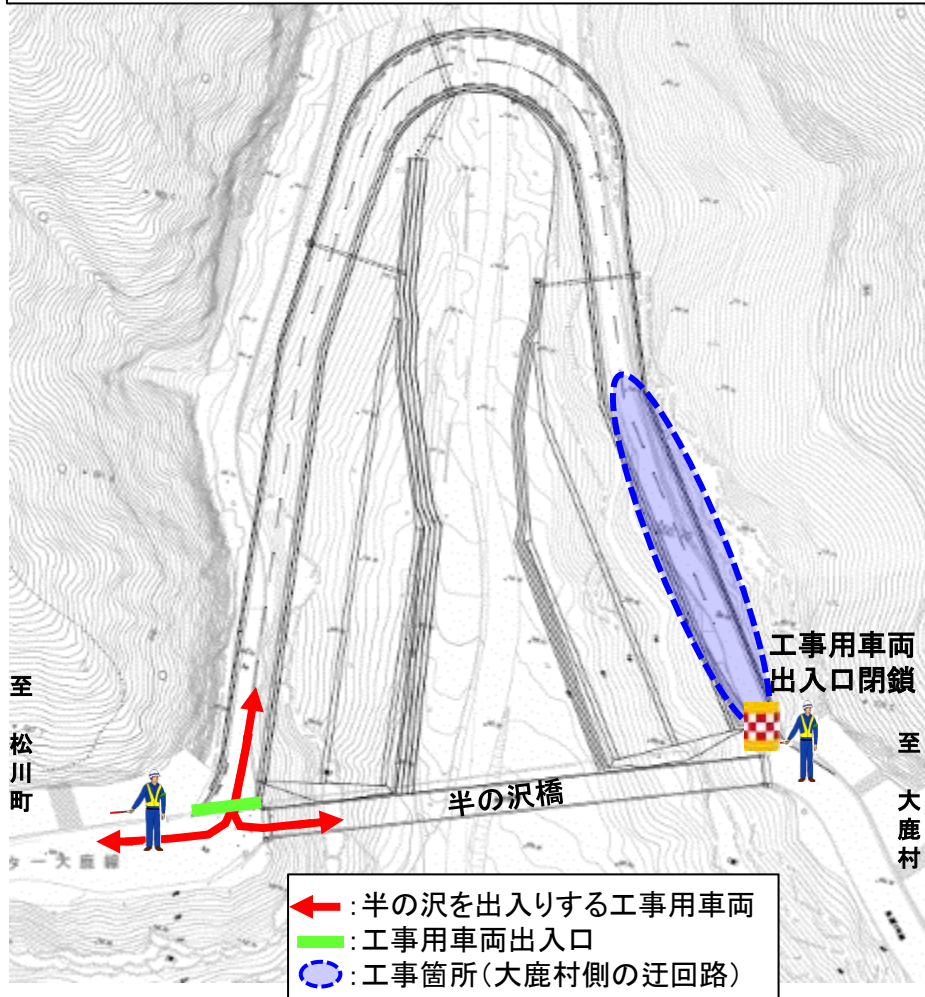

②半の沢橋前後の白線設置に伴う一時的な交通規制

交通規制期間: 令和8年お盆明けの1日程度

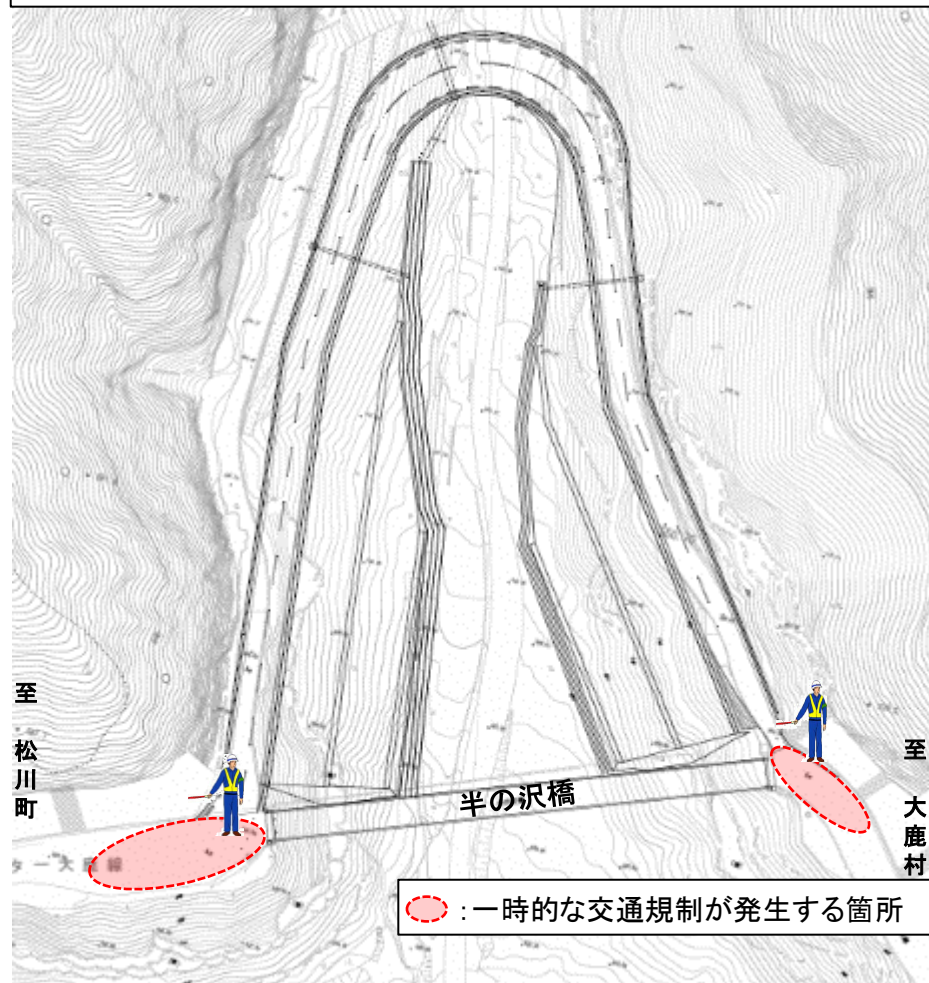

※上記以外にも、工事用車両出入口を変更する期間や一時的な交通規制が生じる場合があります。

(一) 北林飯島線・(主) 伊那生田飯田線等について

(第45回中川村リニア中央新幹線対策協議会)


資料 3

伊那建設事務所

至 伊那



① 伊那生田飯田線 鳳来橋北交差点わだち (左: 対応前 右: JR対応済)

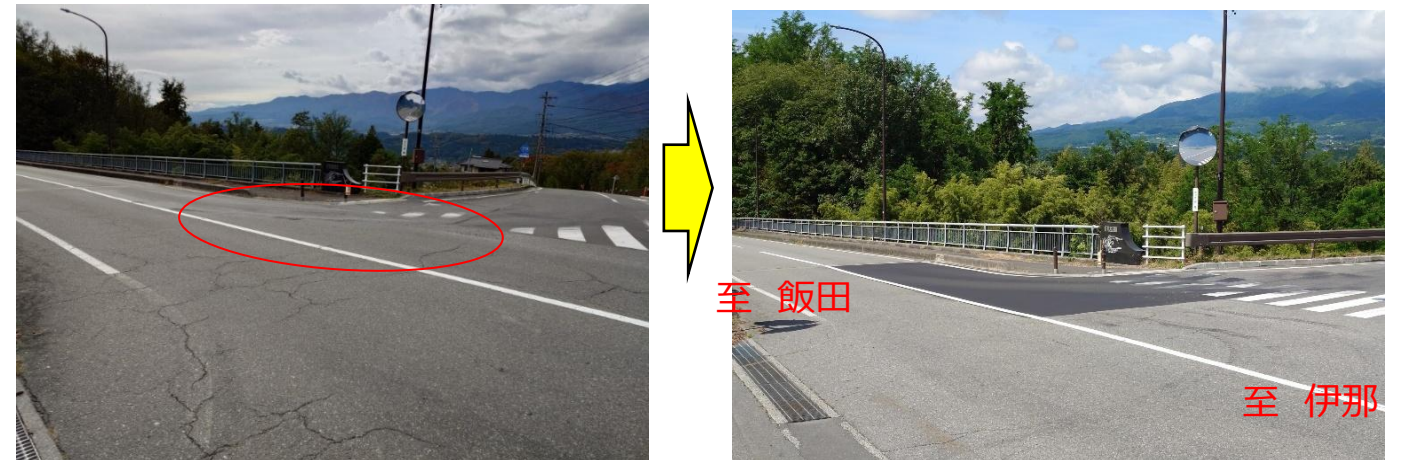

② 北林飯島線の新設横断側溝周辺の段差 (対応予定)



③ 伊那生田飯田線 天竜橋東のわだち (対応予定)

