

第44回中川村リニア中央新幹線対策協議会 次第

令和8年4月8日(水) 午後7時00分

中川村役場基幹集落センター 集会室

1 開 会

2 あいさつ

3 委員委嘱

4 協議事項

(1) JR東海工事関係・・・資料1

- ・大鹿村内リニア工事進捗状況について
- ・工事用車両台数について
- ・渡場交差点付近における環境測定について
- ・その他

(2) 県道工事関係

- ・(主)松川インター大鹿線改良事業等について・・・資料2-1、2-2

- ・(一)県道北林飯島線・(主)伊那生田飯田線等について・・・資料3

5 その他

6 閉 会

第44回 中川村リニア対策協議会 資料

令和8年(2026年) 4月 8日

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室)
中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体
中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体

1

目次

① 工事の進捗状況

② 工事用車両通行台数


③ 環境測定結果

④ その他

2

大鹿村内の工事概要

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

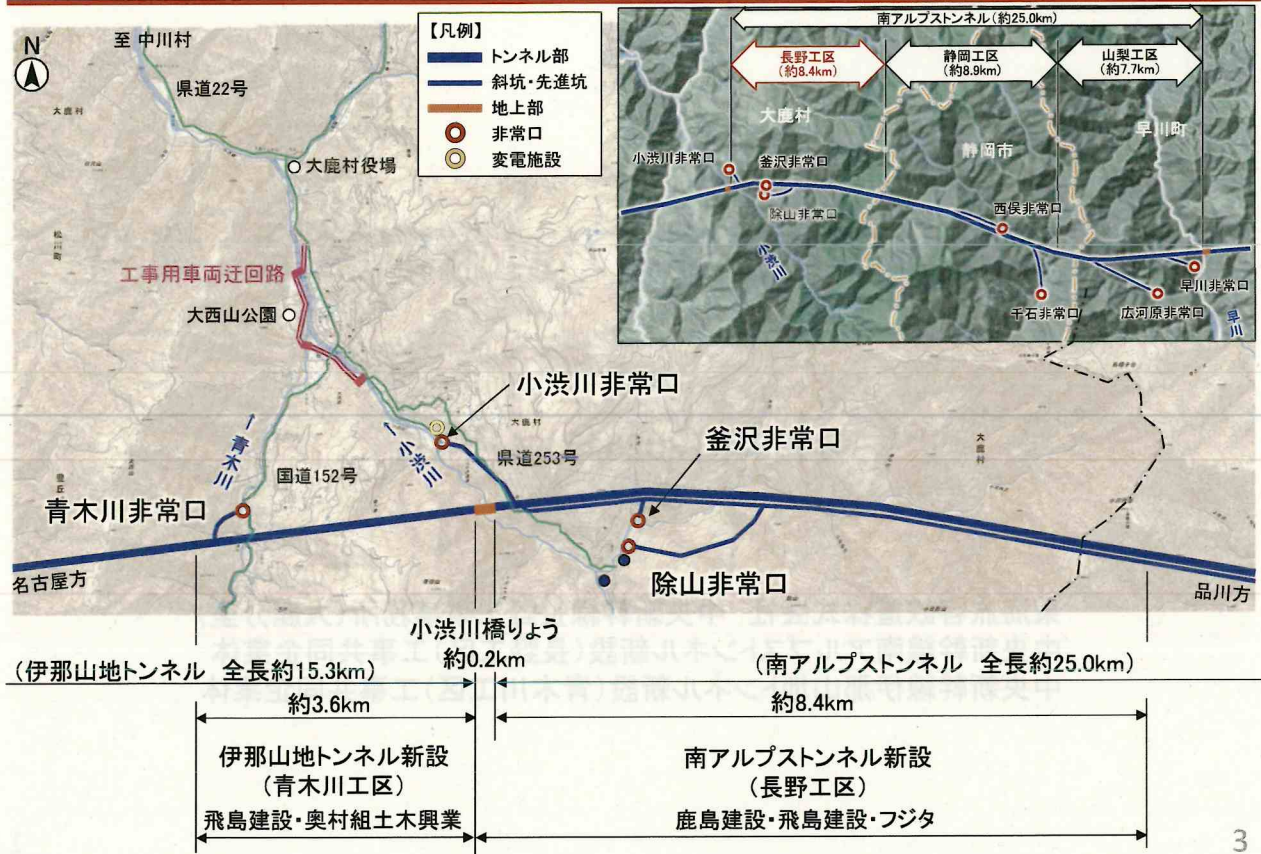

3

南アルプストンネル長野工区の工事状況

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

- 除山非常口から先進坑及び本坑を掘削しています。
- 小渋川非常口から本坑を掘削しています。



【凡例】

- 計画路線(トンネル区間)
- 計画路線(地上区間)
- 非常口トンネル・先進坑・工事用トンネル
- 非常口

工事進捗(掘削済延長)

非常口 : 約3.3km 完了
先進坑等 : 約5.1km / 8.3km
本坑 : 約3.1km / 8.4km

4

伊那山地トンネル青木川工区の工事状況

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

➤ 青木川非常口から本坑を掘削しています。



【凡例】

- 計画路線(トンネル区間)
- 計画路線(地上区間)
- 非常口トンネル・先進坑・工事用トンネル
- 非常口

工事進捗(掘削済延長)

非常口: 約0.6km 完了
本 坑: 約1.7km / 3.6km

5

トンネル工事の状況

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

先進坑掘削状況(除山)



本坑掘削状況(除山)



本坑掘削状況(小渋川)



本坑掘削状況(青木川)




6

小渋川橋りょう工事の状況

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

- 工事用仮栈橋(坑口部周辺)範囲の伐採工を行っています。
- 4月以降、工事用仮栈橋(坑口部周辺)の設置工事を実施してまいります。

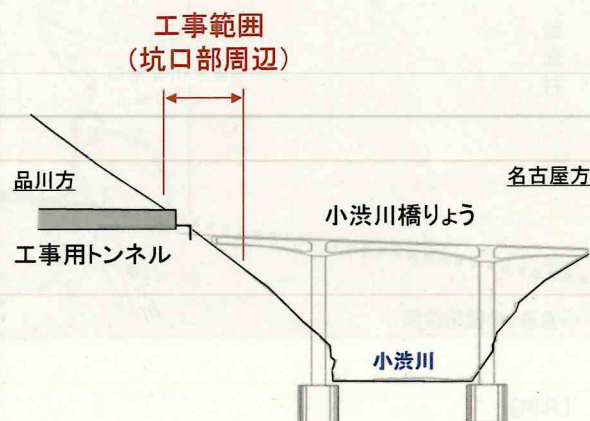

7

発生土仮置き場の状況

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

- 発生土仮置き場B(三正坊)は、土砂の搬出を適宜行っています。
- 発生土仮置き場E(小渋川変電所予定地)は、土砂の搬入・搬出を行っています。




8

- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他


項目	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
工事用車両通行台数	1,234	1,567	1,890	2,123	2,456	2,789
環境測定結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好
その他						

発生土運搬ルートについて

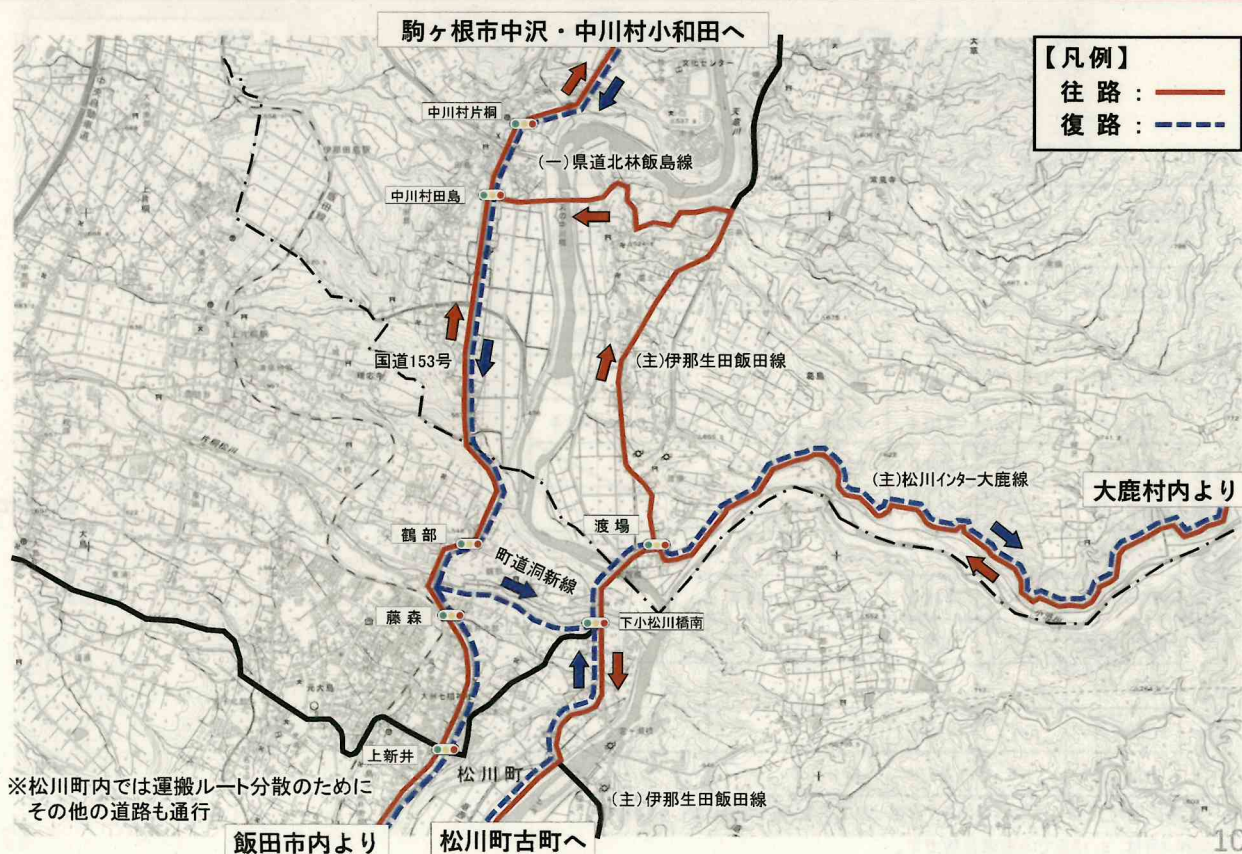

通行台数実績(資機材運搬車両)

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

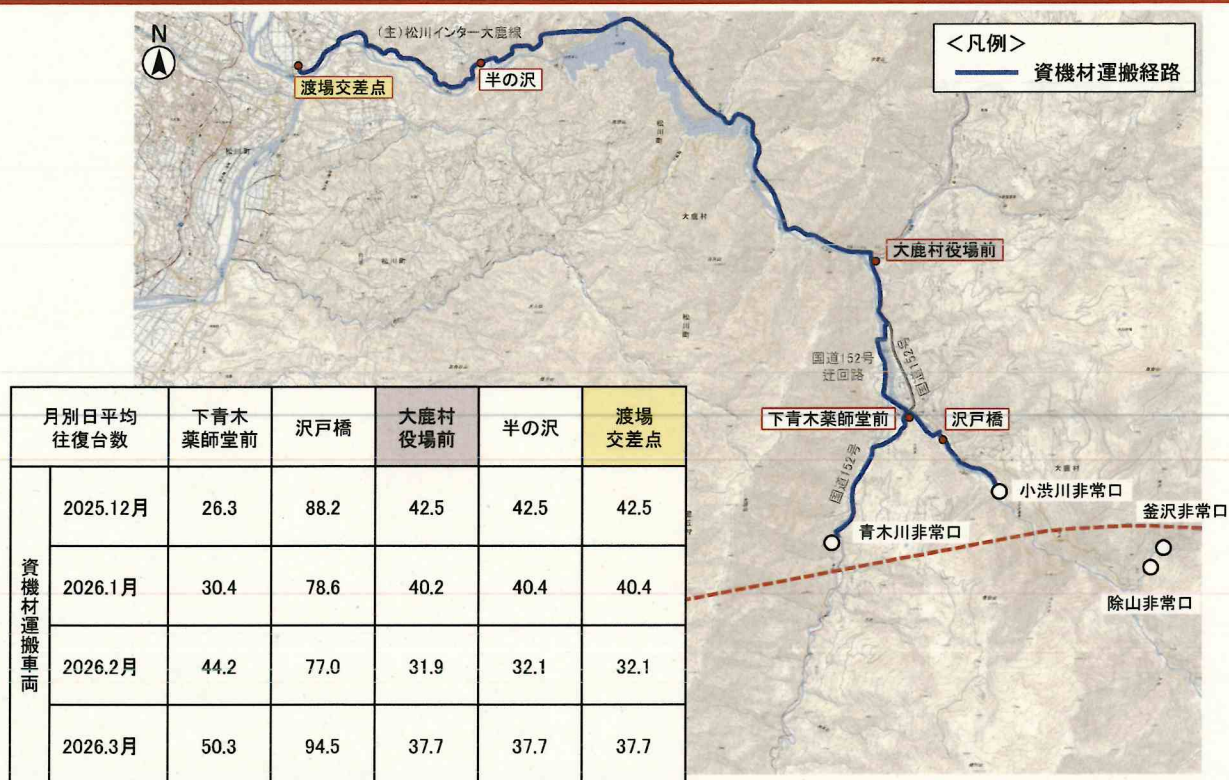


※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

※ 2026.3月は、3/15までの実績台数です。

11

通行台数実績(発生土運搬車両)

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

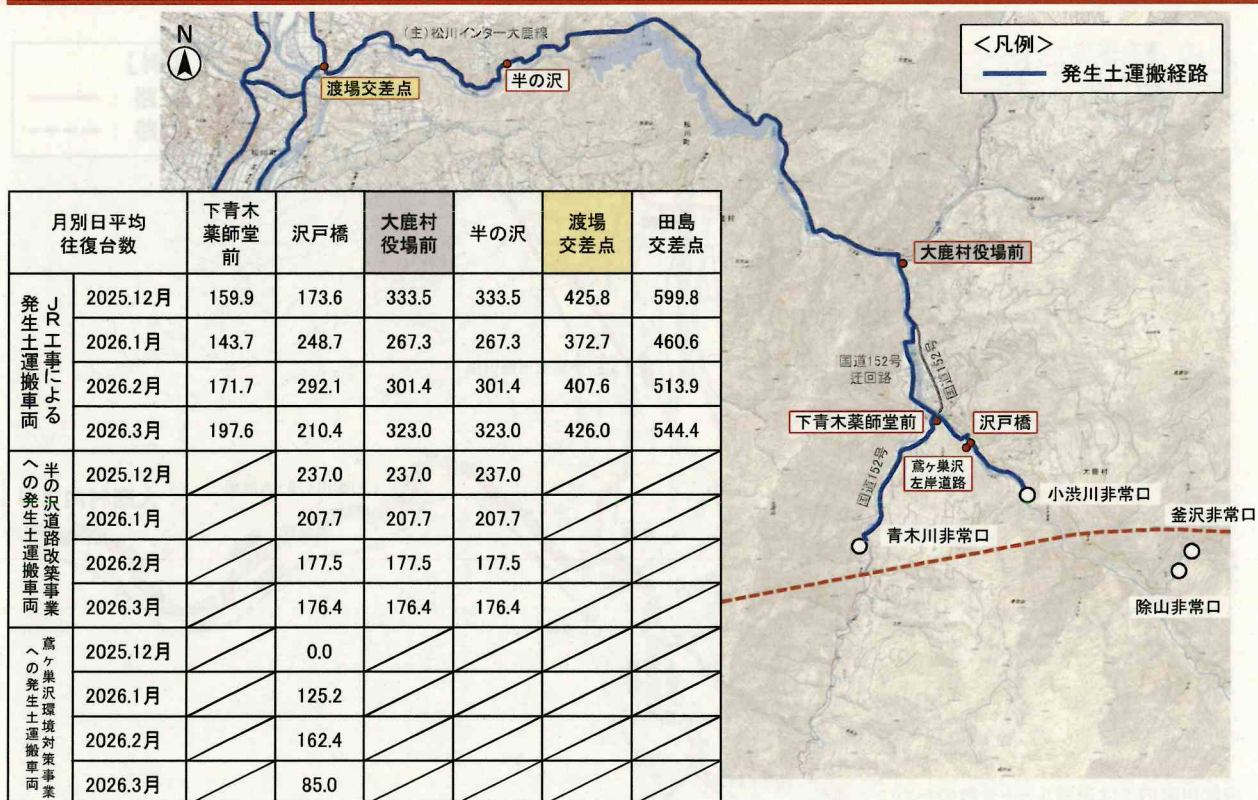

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

※ 2026.3月は、3/15までの実績台数です。

12

2026年度にかけての工事用車両運行計画

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

○渡場交差点における運行台数(予定)

【往復台数】

月別日平均	2026年				2027年
	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
資機材運搬	50	50	50	50	50
発生土運搬	430	600	670	670	600
合計	480	650	720	720	650

○発生土運搬先(予定)

	2026年				2027年
	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
小渋川変電所敷地造成(大鹿村)					
鷹ヶ巣沢環境対策事業(大鹿村)					
新宮川岸地区土地改良事業(駒ヶ根市)					
小和田地区基盤整備事業(中川村)					
前河原道路新設事業(松川町)					
半の沢道路改築事業(中川村)					
中央新幹線長野県駅新設工事(飯田市)					

※上記以外の運搬計画は、発生土活用先の計画が決定次第、随時お知らせしてまいります。

13

新宮川岸地区土地改良事業(駒ヶ根市)

20260408 中川村
第44回対策協議会資料



造成工事進捗状況: 約25万m3のうち約21万m3完了
発生土運搬期間: 2023年10月～2026年7月

14

工事用車両通行台数の予定(渡場交差点)

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

【往復台数】

		2026年4月		2026年5月		2026年6月	
		月別 日平均	日最大	月別 日平均	日最大	月別 日平均	日最大
資機材運搬		50	60	50	60	50	60
発生土運搬	新宮川岸地区土地改良事業 (駒ヶ根市中沢)	280	300	230	270	230	270
	小和田地区基盤整備事業 (中川村小和田)	100	120	170	190	170	190
	前河原道路新設事業 (松川町古町)	90	120	130	150	130	150
	中央新幹線長野県駅新設工事 (飯田市上郷飯沼・座光寺)	—	—	40	50	40	50
合計		520	600	620	720	620	720

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です。

15

目次

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

- ① 工事の進捗状況
- ② 工事用車両通行台数
- ③ 環境測定結果
- ④ その他

16

○測定箇所

- ①渡場交差点
- ②県道伊那生田飯田線沿線

○測定項目

大気質、騒音、振動

○測定期間

- ①2018年11月から通年測定
- ②2024年6月から半年毎に1回測定




17

渡場交差点における環境測定結果(12～2月)

20260408 中川村
第44回対策協議会資料


二酸化窒素

参考: 環境基準(1日平均値: 0.06ppm以下)
参考: 2019年(JR実施)3カ月平均値: 0.005ppm

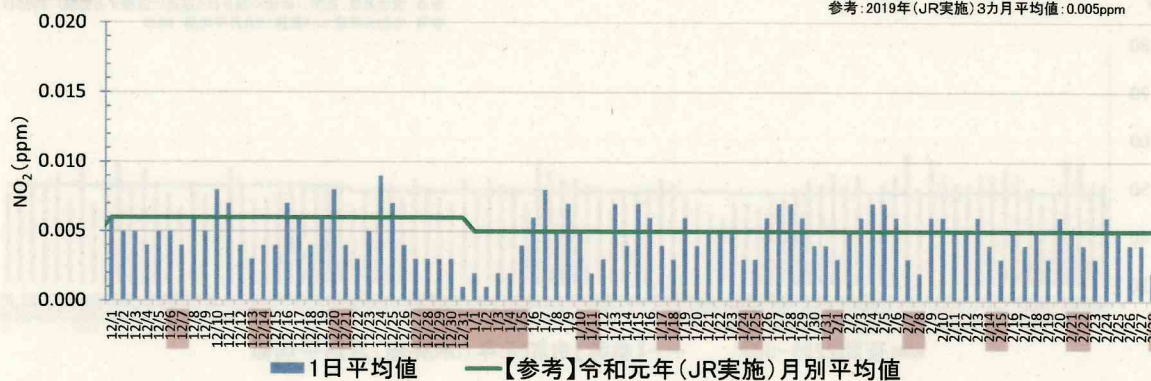

浮遊粒子状物質

参考: 環境基準(1日平均値: 0.1mg/m³以下)
参考: 2019年(JR実施)3カ月平均値: 0.009mg/m³


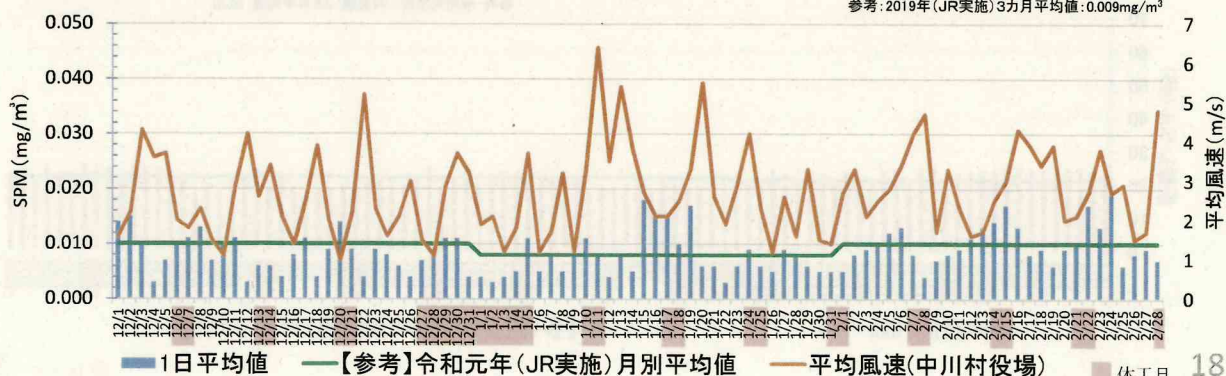


休工日

18

渡場交差点における環境測定結果(12~2月)



20260408 中川村
第44回対策協議会資料

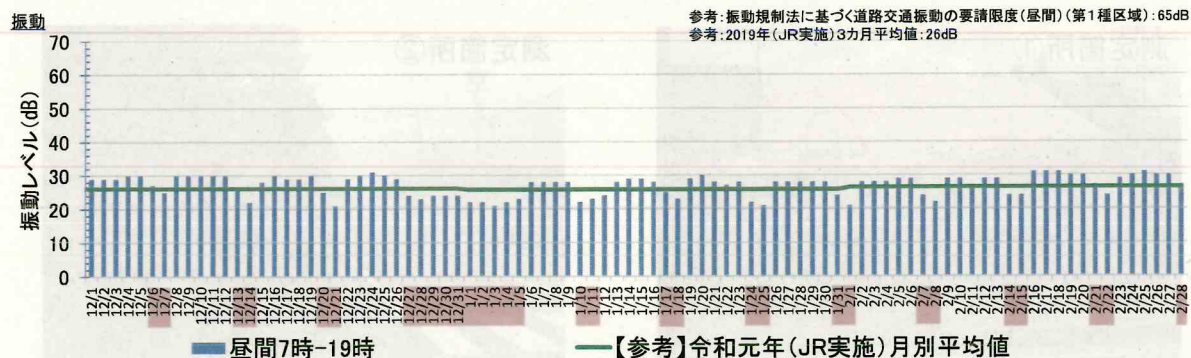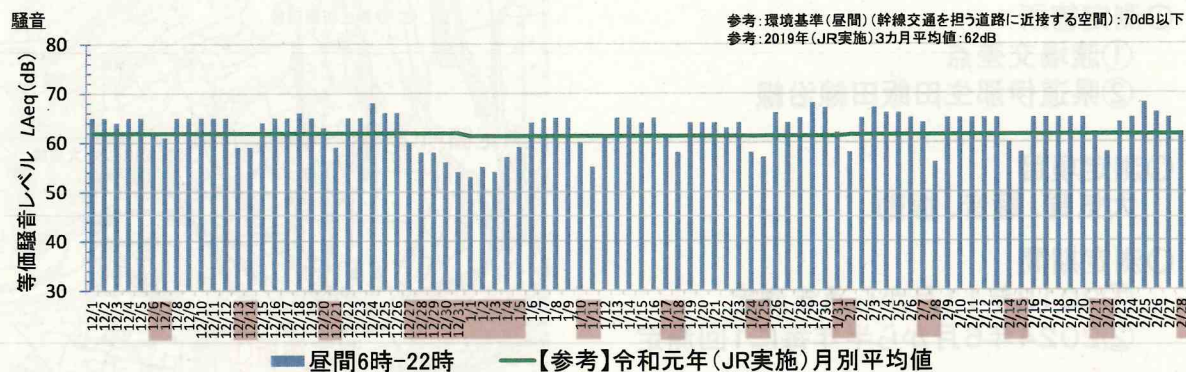

休工日 19

渡場交差点における環境測定結果(12~2月)

20260408 中川村
第44回対策協議会資料

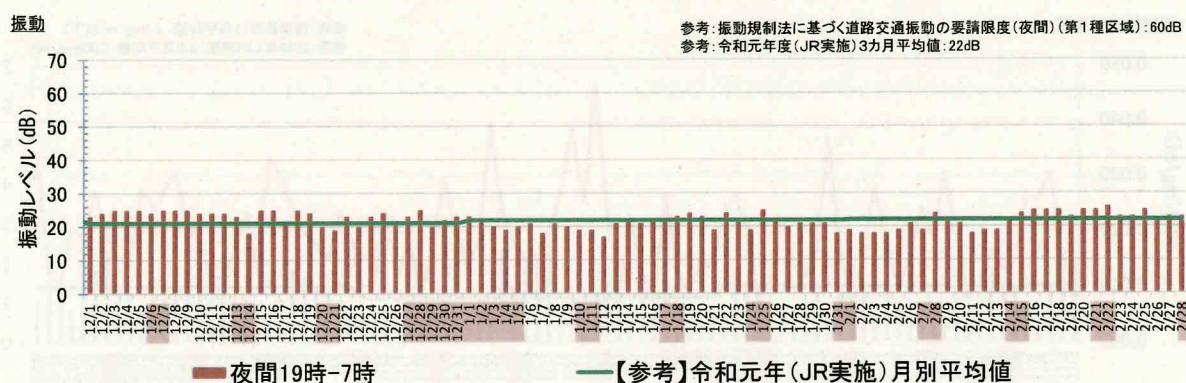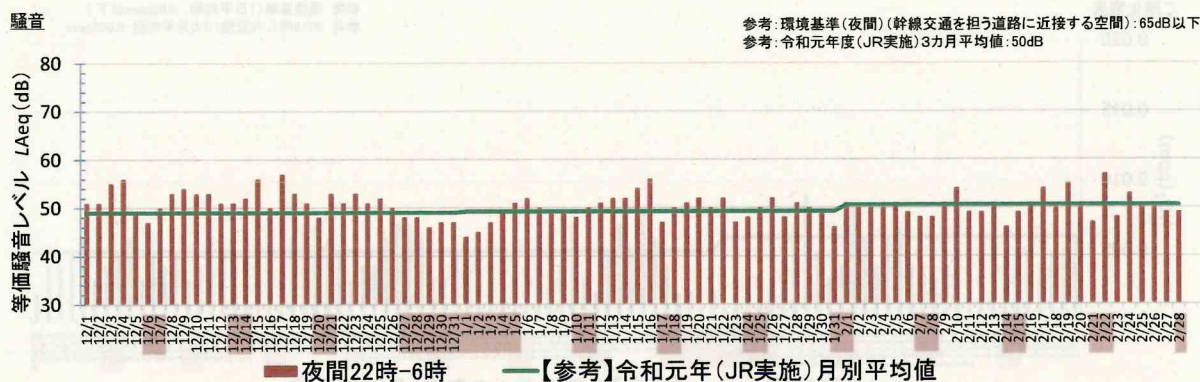

休工日 20

○騒音・振動

測定期間	騒音（等価騒音レベル【昼間】）		振動（振動レベルの80%レンジの上端値【昼間】）	
	測定結果 (db)	参考:渡場交差点 2019年測定	測定結果 (db)	参考:渡場交差点 2019年測定
2024年 6月20日～21日	67	63	36	29
2024年12月12日～13日	66	62	38	26
2024年 4月 7日～ 8日	65	63	37	29
2025年 6月12日～13日	66	63	36	29
2025年12月 9日～10日	66	62	37	26

参考:
環境基準(昼間・幹線交通を担う道路に近接する空間):70dB以下
動規制法に基づく道路交通振動の要請限度(昼間・第1種区域):65dB

○大気質

測定期間	二酸化窒素（期間平均値）		浮遊粒子状物質（期間平均値）	
	測定結果 (ppm)	参考:渡場交差点 2019年測定	測定結果 (mg/m³)	参考:渡場交差点 2019年測定
2024年 6月 6日～12日	0.002	0.003	0.014	0.014
2024年12月10日～16日	0.005	0.006	0.007	0.010
2025年 6月11日～17日	0.002	0.003	0.012	0.014
2025年12月 5日～11日	0.005	0.006	0.011	0.010

参考:
環境基準(日平均値) 二酸化窒素 0.06ppm以下
環境基準(日平均値) 浮遊粒子状物質 0.1mg/m3以下

21

目次

① 工事の進捗状況

② 工事用車両通行台数

③ 環境測定結果

④ その他



(清掃車による清掃)

- 工事車両が集中している渡場交差点では、昨年度から渡場地区を通行するダンプ事業者及び関係者で、清掃作業を月1回実施することになり、当社では清掃車による路面清掃、社員による清掃・除草・ごみ拾いを実施しています。
- 清掃車による路面清掃は、渡場交差点の他、村内の発生土運搬ルートでも適宜実施しています。



(社員による清掃、除草、ごみ拾い)

渡場交差点清掃作業の実績(昨年度)

- 2025/04/07: 清掃車・社員清掃
- 2025/07/05: 清掃車
- 2025/10/03: 清掃車・社員清掃
- 2026/02/06: 清掃車・社員清掃
- 2026/03/10: 社員清掃

工事カレンダー・お問い合わせ先

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」を参照ください。
- トンネル坑内やヤードでの作業は、日曜日にも実施することがあります。

【お問い合わせ先】

JR東海	東海旅客鉄道(株) 中央新幹線長野工事事務所(大鹿分室) (住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原381-1 (電話)0265-39-2975
南ア(長野工区) 鹿島建設・飛島建設・フジタJV	中央新幹線南アルプストンネル新設(長野工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2656-3 (電話)0265-39-1071
伊那山地(青木川工区) 飛島建設・奥村組土木興業JV	中央新幹線伊那山地トンネル新設(青木川工区)工事共同企業体事務所 (住所)長野県下伊那郡大鹿村大河原1355-5 (電話)0265-39-1851

※ 受付日時：土・日・祝日・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始を除く平日の9時～17時

主要地方道松川インター大鹿線道路改良工事 位置図

事業概要

●実施中の事業

- ①道路改良事業：葛島 測量設計、関係機関協議
- ②道路改良事業：二軒屋 関係機関協議、道路拡幅工事完了（松川町側）
- ③道路改良事業：半の沢 盛土造成工事
- ④防災対策事業：四徳大橋西 設計、関係機関協議
- ⑤トンネル事業：落合トンネル トンネル工事

○その他工事


- ・修繕工事（橋梁補修）：こいけどう橋（R8.4～予定）

○主要地方道松川インター大鹿線 基本協定書（H27.12）

- ・区間1：道路拡幅
- ・区間2：道路拡幅
- ・区間3：道路拡幅
- ・区間4：道路拡幅
- ・区間5：道路拡幅

○主要地方道松川インター大鹿線 に関する協定書（H28.3）

- ・西下トンネル：設計、関係機関協議
- ・東山トンネル：設計、関係機関協議

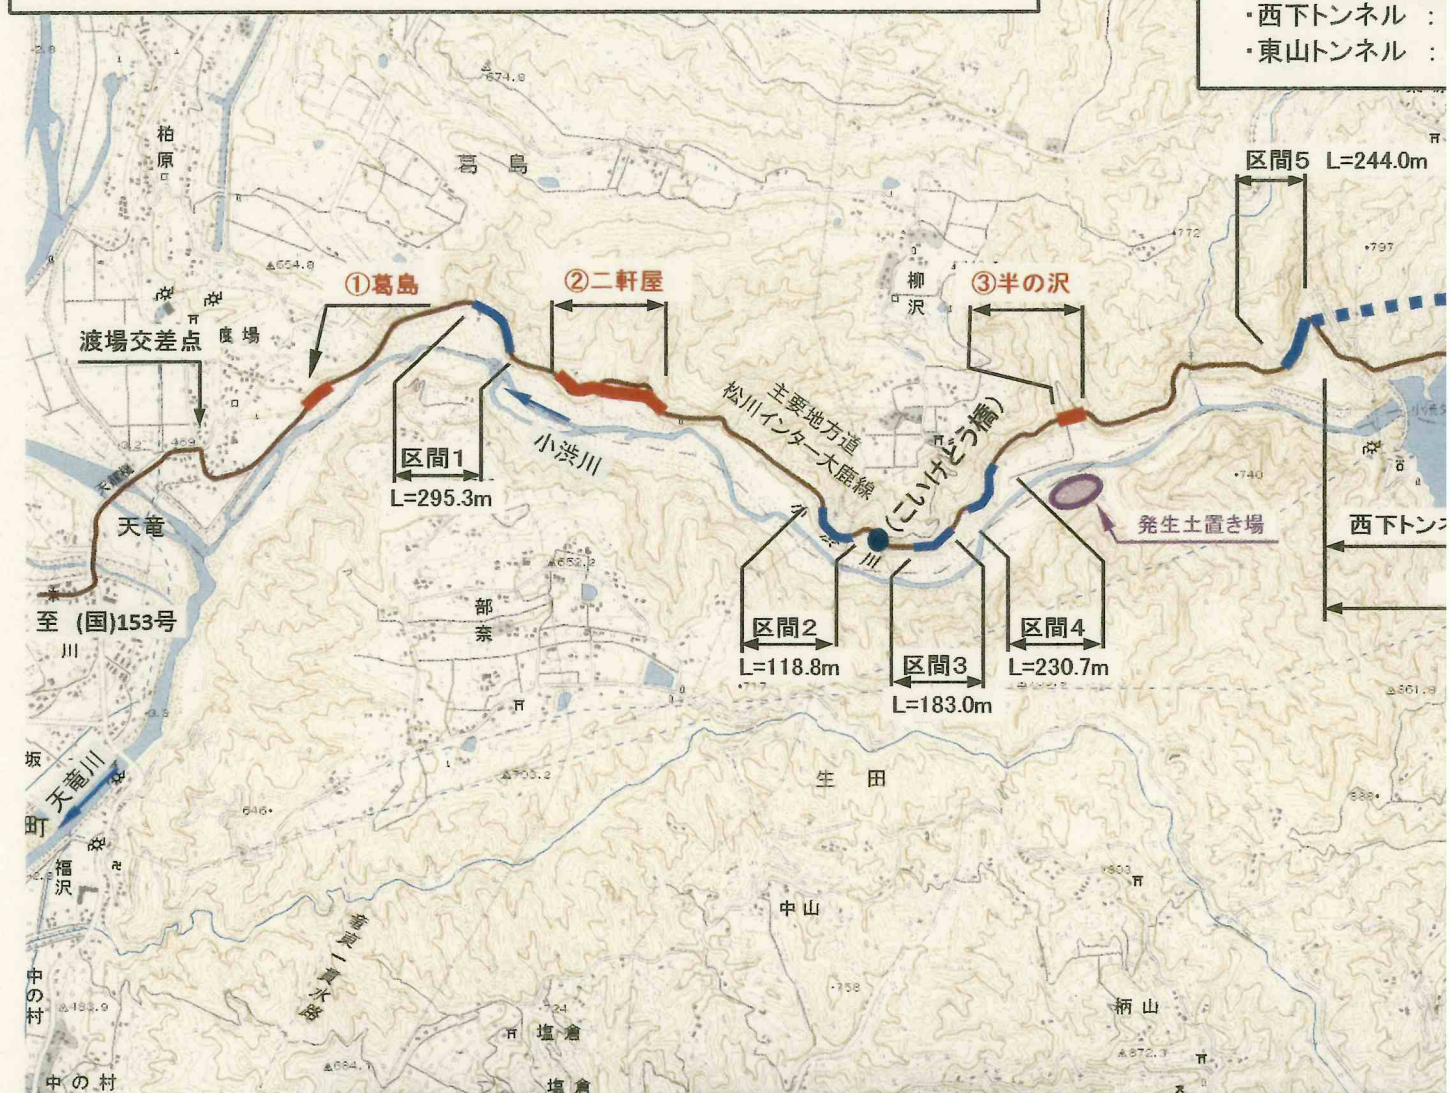

(主) 松川インター大鹿線 道路改良工事

令和8年4月8日資料
長野県飯田建設事務所

資料 2-2


◆工事概要

- 工事場所 : 長野県上伊那郡中川村葛島地先
工事内容 : 道路改良工 L=20.0m W=6.0(7.5)m
地山補強土壁工 L=16.8m A=54m²
排水工 一式
工事期間 : 令和7年1月～令和8年3月完了

◆位置図



◆工事範囲

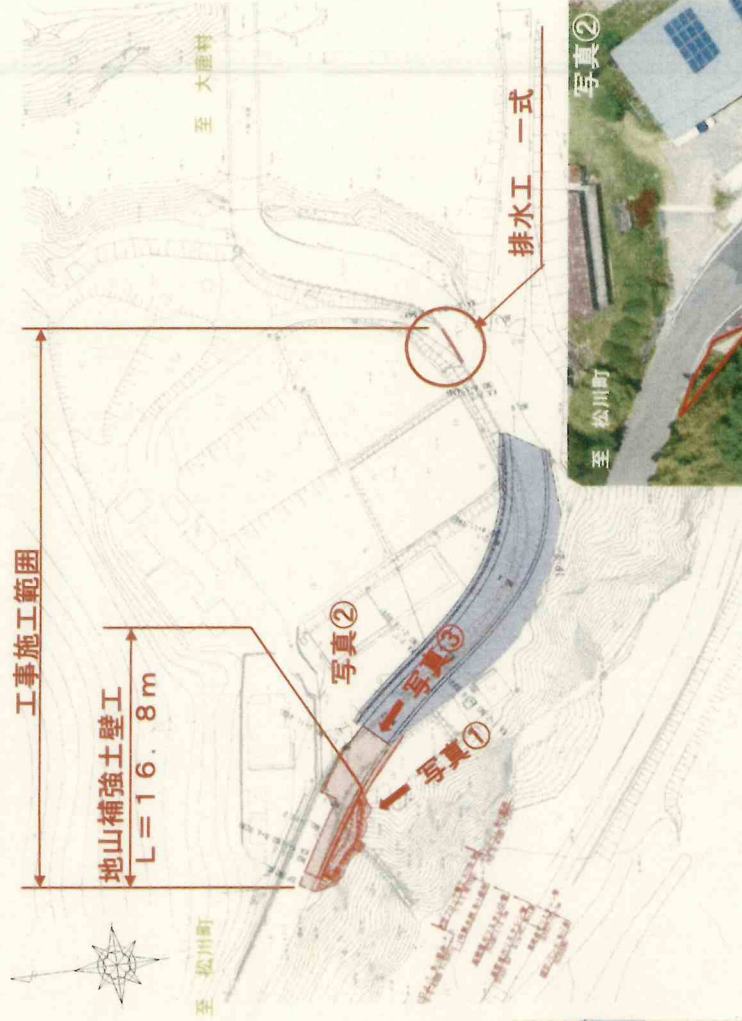

現地写真



◆松川町側道路拡幅工事の完了

今年度計画していた二軒屋（松川町側）での道路拡幅工事が3月に完了しました。
施工に際し交通規制を行いましたたが、みなさまのご理解・ご協力により、無事完了しました。

(一) 北林飯島線・(主) 伊那生田飯田線等について

(第44回中川村リニア中央新幹線対策協議会)

資料 3

伊那建設事務所

至 伊那



① 竜東線 鳳来橋北交差点のわだちについて



② (一)北林飯島線の新設横断側溝周辺の段差



③南向発電所～柏原集会所の雑木伐採、及び、路肩の堆積土砂の撤去 (左：着手前、右：着手後)



工事カレンダー（伊那山地トンネル(青木川工区)、南アルプストンネル(長野工区)）

2026年																																																											
1月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	2月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	3月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	4月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	5月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	6月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	7月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	8月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	9月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	10月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	11月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬	12月	曜日	青木川	南ア	発生土運搬
1/1 元旦	木				2/1	日				3/1	日				4/1	水				5/1	金				6/1	月				7/1	水				8/1	土				9/1	火				10/1	木				11/1	日				12/1	火			
1/2	金				2/2	月				3/2	月				4/2	木				5/2	土				6/2	火				7/2	木				8/2	日				9/2	水				10/2	金				11/2	月				12/2	水			
1/3	土				2/3	火				3/3	火				4/3	金				5/3 憲法記念日	日				6/3	水				7/3	金				8/3	月				9/3	木				10/3	土				11/3 文化の日	火				12/3	木			
1/4	日				2/4	水				3/4	水				4/4	土				5/4 みどりの日	月				6/4	木				7/4	土				8/4	火				9/4	金				10/4	日				11/4	水				12/4	金			
1/5	月				2/5	木				3/5	木				4/5	日				5/5 こどもの日	火				6/5	金				7/5	日				8/5	水				9/5	土				10/5	月				11/5	木				12/5	土			
1/6	火				2/6	金				3/6	金				4/6	月				5/6 振替休日	水				6/6	土				7/6	月				8/6	木				9/6	日				10/6	火				11/6	金				12/6	日			
1/7	水				2/7	土				3/7	土				4/7	火				5/7	木				6/7	日				7/7	火				8/7	金				9/7	月				10/7	水				11/7	土				12/7	月			
1/8	木				2/8	日				3/8	日				4/8	水				5/8	金				6/8	月				7/8	水				8/8	土				9/8	火				10/8	木				11/8	日				12/8	火			
1/9	金				2/9	月				3/9	月				4/9	木				5/9	土				6/9	火				7/9	木				8/9	日				9/9	水				10/9	金				11/9	月				12/9	水			
1/10	土				2/10	火				3/10	火				4/10	金				5/10	日				6/10	水				7/10	金				8/10	月				9/10	木				10/10	土				11/10	火				12/10	木			
1/11	日				2/11 建国記念の日	水				3/11	水				4/11	土				5/11	月				6/11	木				7/11	土				8/11 山の日	火				9/11	金				10/11	日				11/11	水				12/11	金			
1/12 成人の日	月				2/12	木				3/12	木				4/12	日				5/12	火				6/12	金				7/12	日				8/12	水				9/12	土				10/12 スノーウの日	月				11/12	木				12/12	土			
1/13	火				2/13	金				3/13	金				4/13	月				5/13	水				6/13	土				7/13	月				8/13	木				9/13	日				10/13	火				11/13	金				12/13	日			
1/14	水				2/14	土				3/14	土				4/14	火				5/14	木				6/14	日				7/14	火				8/14	金				9/14	月				10/14	水				11/14	土				12/14	月			
1/15	木				2/15	日				3/15	日				4/15	水				5/15	金				6/15	月				7/15	水				8/15	土				9/15	火				10/15	木				11/15	日				12/15	火			
1/16	金				2/16	月				3/16	月				4/16	木				5/16	土				6/16	火				7/16	木				8/16	日				9/16	水				10/16	金				11/16	月				12/16	水			
1/17	土				2/17	火				3/17	火				4/17	金				5/17	日				6/17	水				7/17	金				8/17	月				9/17	木				10/17	土				11/17	火				12/17	木			
1/18	日				2/18	水				3/18	水				4/18	土				5/18	月				6/18	木				7/18	土				8/18	火				9/18	金				10/18	日				11/18	水				12/18	金			
1/19	月				2/19	木				3/19	木				4/19	日				5/19	火				6/19	金				7/19	日				8/19	水				9/19	土				10/19	月				11/19	木				12/19	土			
1/20	火				2/20	金				3/20 春分の日	金				4/20	月				5/20	水				6/20	土				7/20 海の日	月				8/20	木				9/20	日				10/20	火				11/20	金				12/20	日			
1/21	水				2/21	土				3/21	土				4/21	火				5/21	木				6/21	日				7/21	火				8/21	金				9/21 敬老の日	月				10/21	水				11/21	土				12/21	月			
1/22	木				2/22	日				3/22	日				4/22	水				5/22	金				6/22	月				7/22	水				8/22	土				9/22 国民の休日	火				10/22	木				11/22	日				12/22	火			
1/23	金				2/23 天皇誕生日	月				3/23	月				4/23	木				5/23	土				6/23	火				7/23	木				8/23	日				9/23 秋分の日	水				10/23	金				11/23 勤労感謝の日	月				12/23	水			
1/24	土				2/24	火				3/24	火				4/24	金				5/24	日				6/24	水				7/24	金				8/24	月				9/24	木				10/24	土				11/24	火				12/24	木			
1/25	日				2/25	水				3/25	水				4/25	土				5/25	月				6/25	木				7/25	土				8/25	火				9/25	金				10/25	日				11/25	水				12/25	金			
1/26	月				2/26	木				3/26	木				4/26	日				5/26	火				6/26	金				7/26	日				8/26	水				9/26	土				10/26	月				11/26	木				12/26	土			
1/27	火				2/27	金				3/27	金				4/27	月				5/27	水				6/27	土				7/27	月				8/27	木				9/27	日				10/27	火				11/27	金				12/27	日			
1/28	水				2/28	土				3/28	土				4/28	火				5/28	木				6/28	日				7/28	火				8/28	金				9/28	月				10/28	水				11/28	土				12/28	月			
1/29	木									3/29	日				4/29 昭和の日	水				5/29	金				6/29	月				7/29	水				8/29	土				9/29	火				10/29	木				11/29	日				12/29	火			
1/30	金									3/30	月				4/30	木				5/30	土				6/30	火				7/30	木				8/30	日				9/30																			

＜凡例＞

- … トンネル掘削および関連工事、明かり工事
- … 場内作業のみ(大型工事用車両の通行:10台/日・往復以下程度) ※場内作業とは、トンネル坑内やヤード内での調査、機械設備の設置・撤去・保守点検作業等
- … 休日(発生土運搬については、県道59号線の通行が無いことを表しています)
※1月～3月、12月の土曜日については、平日の天候次第で運搬する可能性があります
- … 前回協議会資料からの変更箇所


※通勤通学等の時間帯は、通行台数を調整するよう努めます。
※上記工事予定以外の日時(休工日含む)に作業を行う場合には、関係する住民の方々へお知らせします。
※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～5時の時間帯に運搬することを考えています。

渡場交差点における環境測定結果(12~2月)

20260408 中川村
第44回対策協議会資料


二酸化窒素

参考:環境基準(1日平均値: 0.06ppm以下)
参考:2019年(JR実施)3ヵ月平均値:0.005ppm


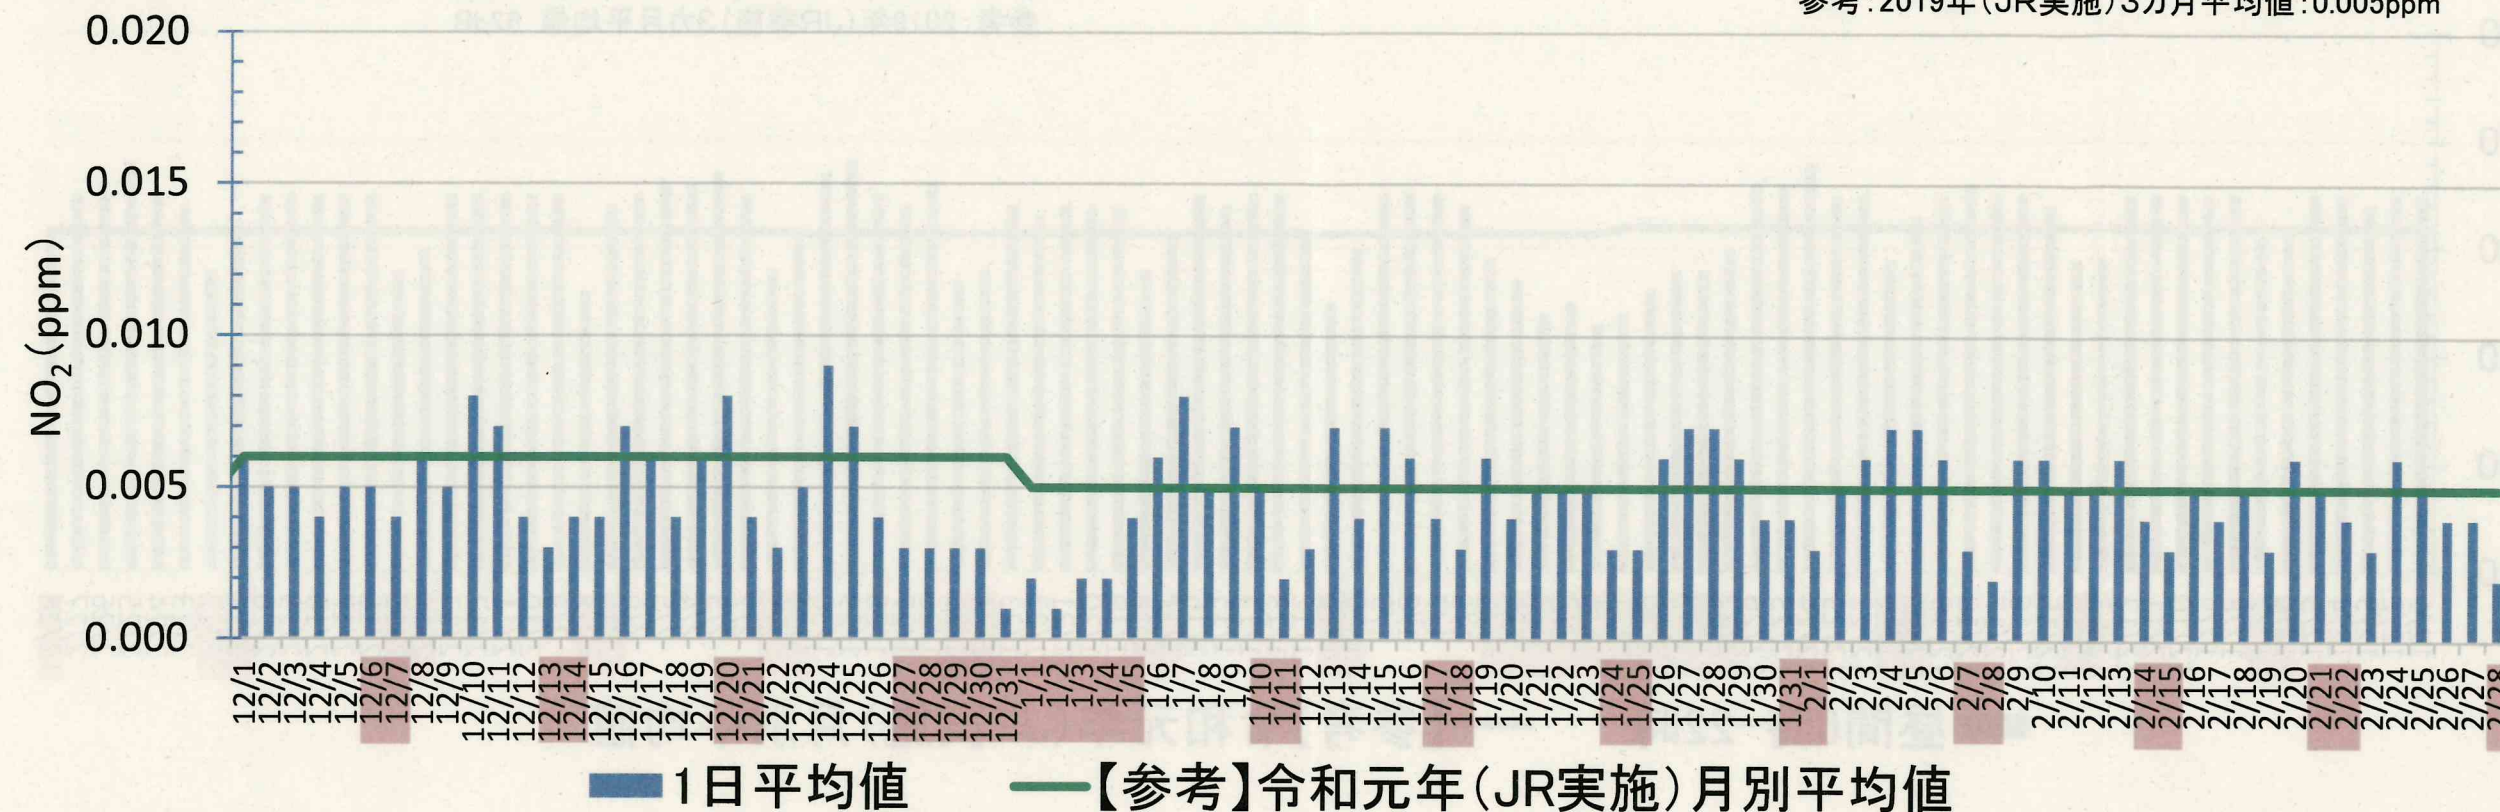


浮遊粒子状物質

参考:環境基準(1日平均値: 0.1mg/m³以下)
参考:2019年(JR実施)3ヵ月平均値:0.009mg/m³

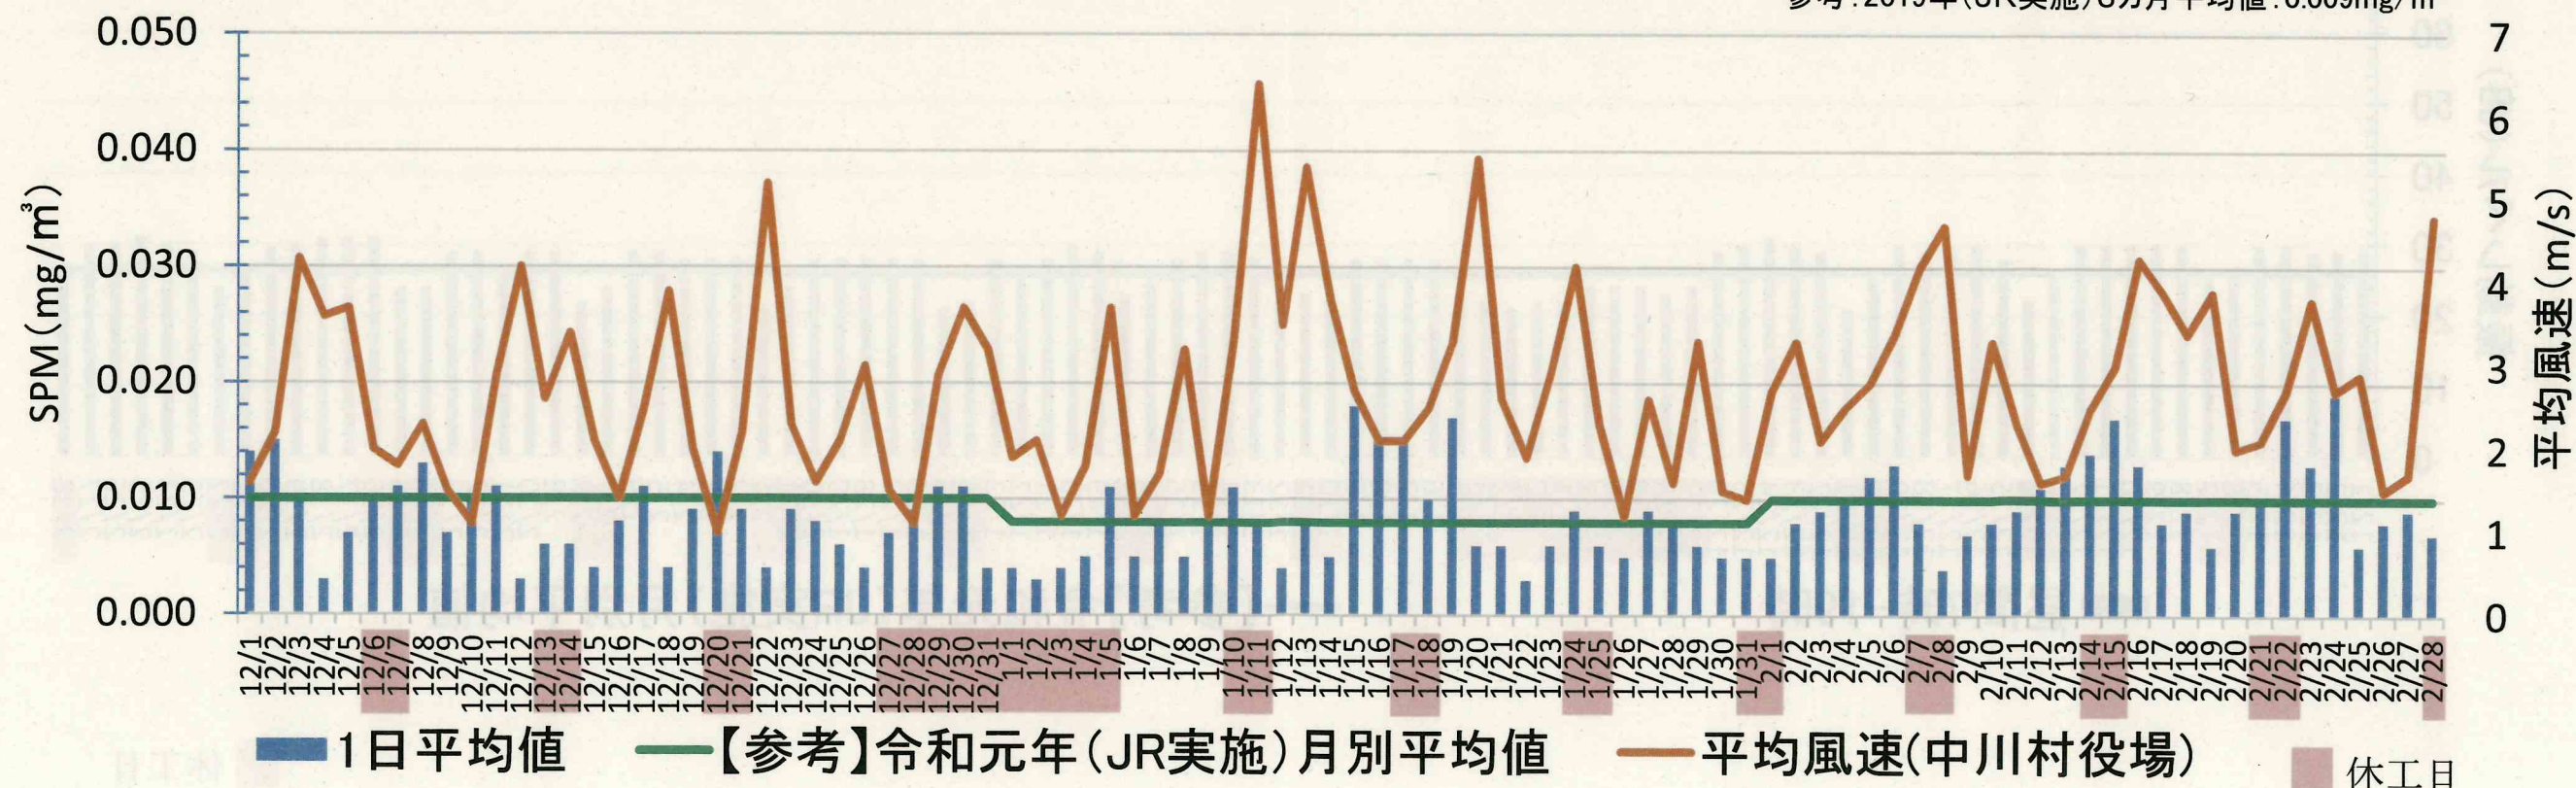


渡場交差点における環境測定結果(12~2月)

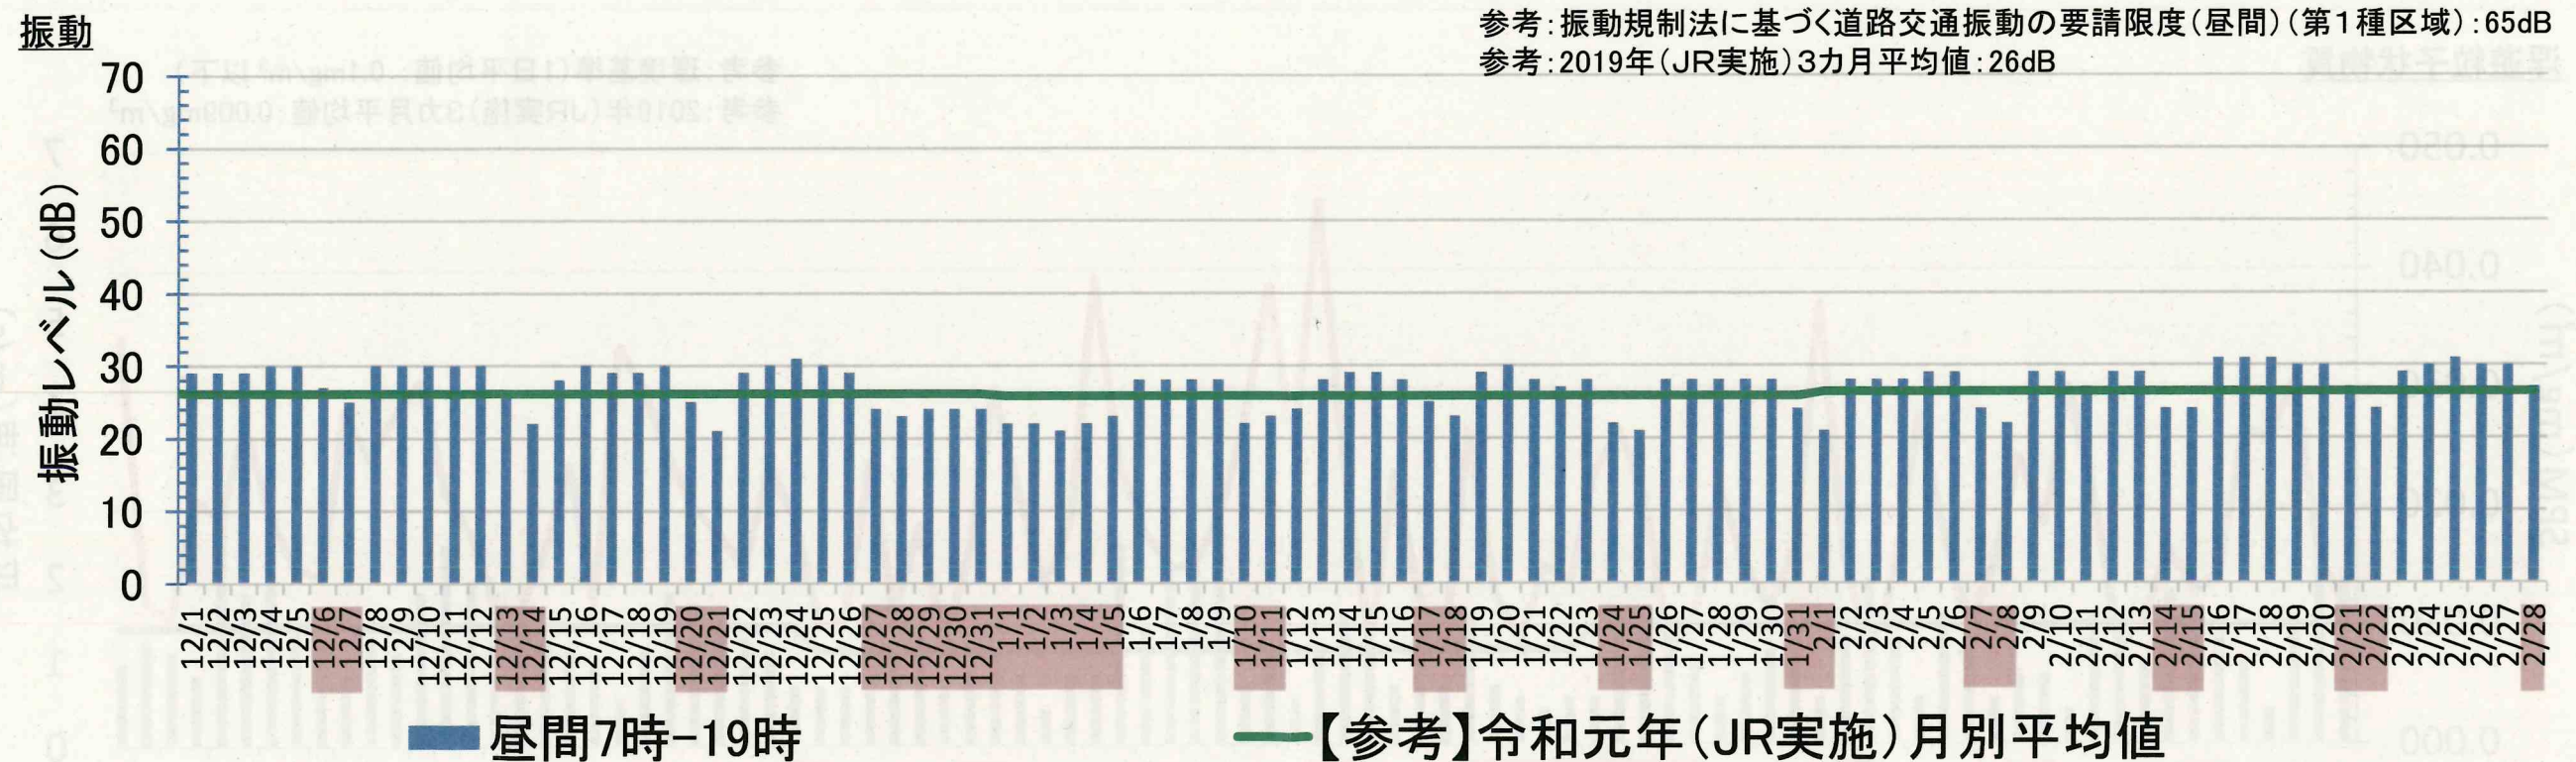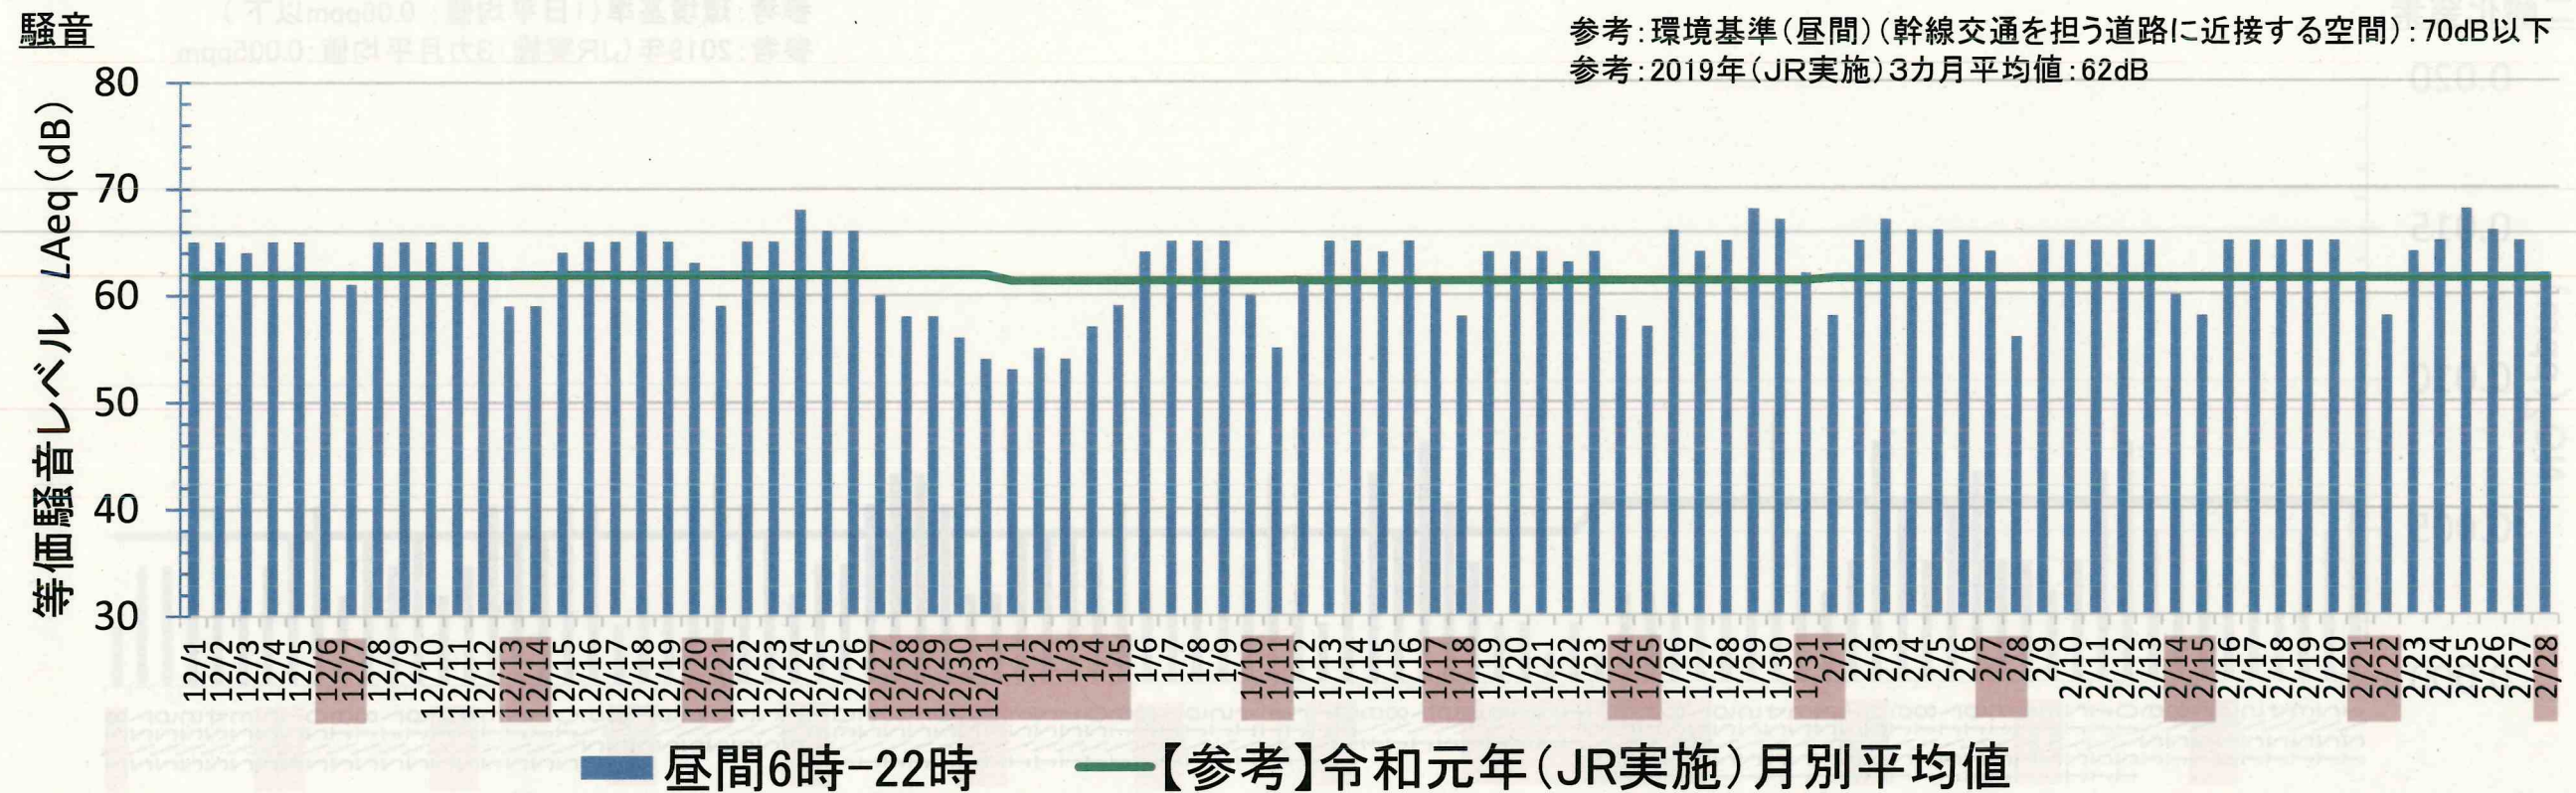

渡場交差点における環境測定結果(12~2月)

騒音

参考: 環境基準(夜間)(幹線交通を担う道路に近接する空間): 65dB以下
参考: 令和元年度(JR実施)3カ月平均値: 50dB

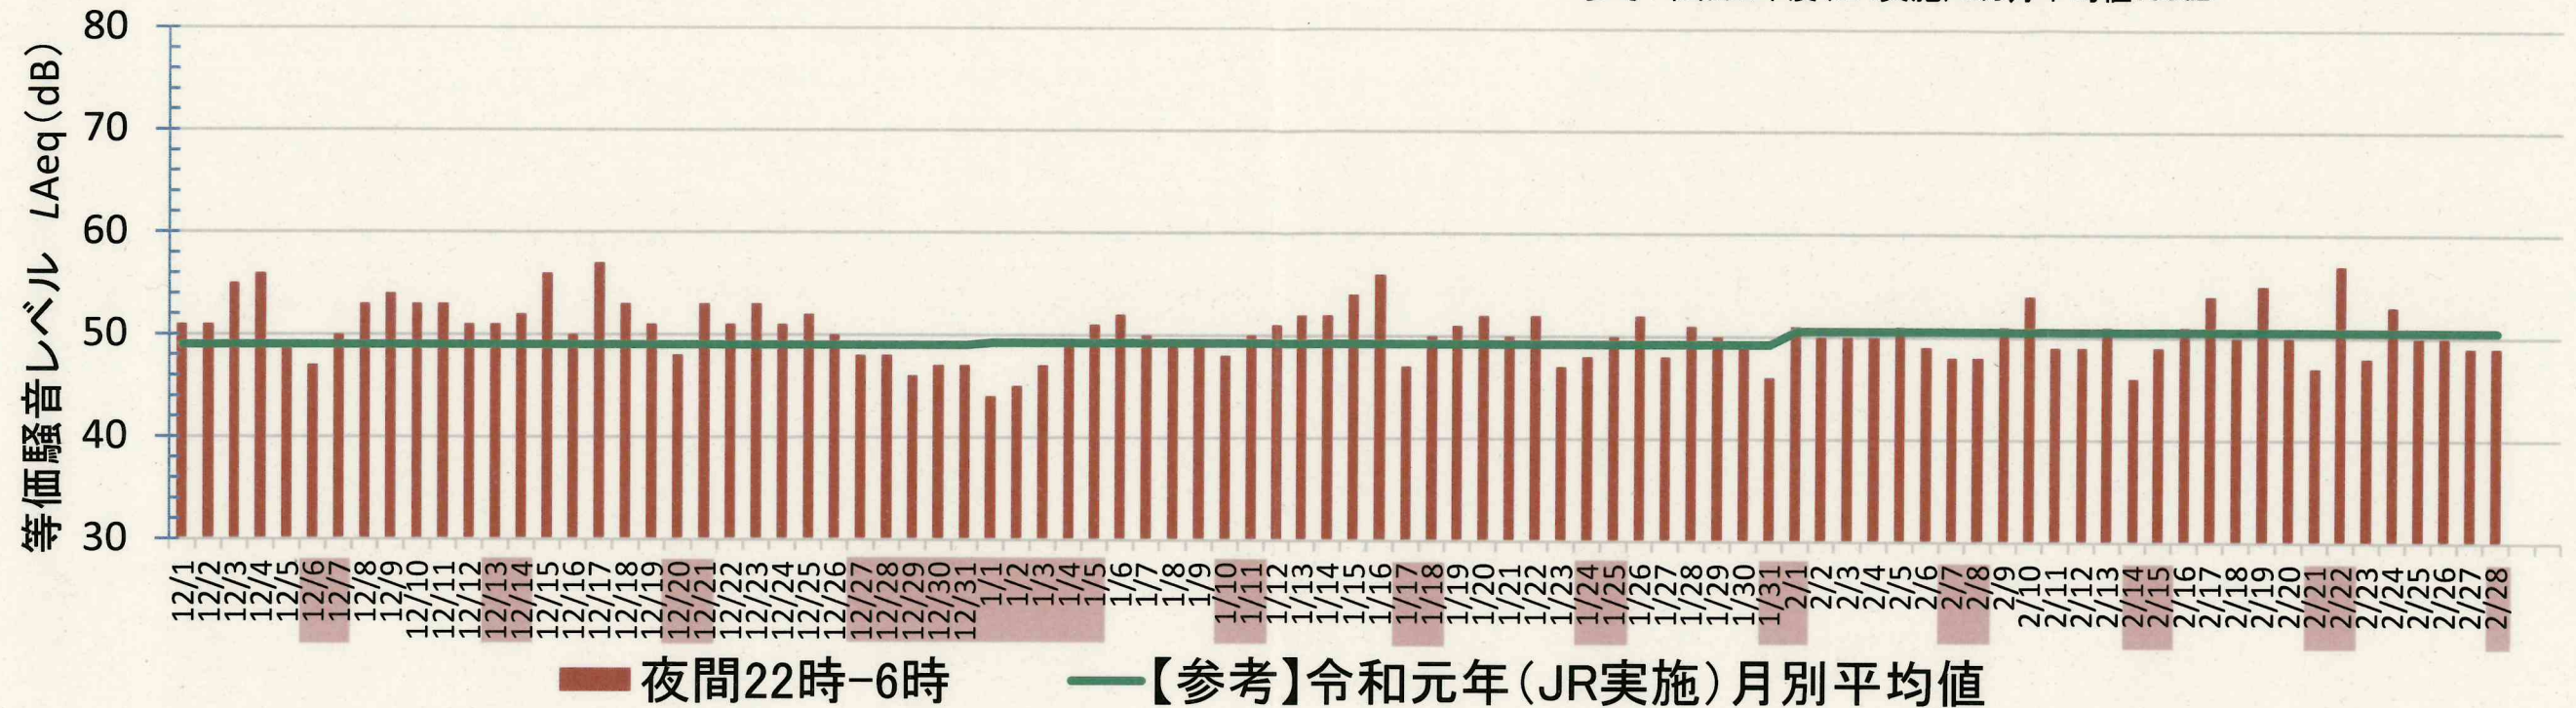

振動

参考: 振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度(夜間)(第1種区域): 60dB
参考: 令和元年度(JR実施)3カ月平均値: 22dB

